



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DO GERMANO

RELATÓRIO DESEMPENHO TRIMESTRAL - Nº 14

ABR / MAIO / JUNHO DE 2025

REVISÕES

01	Aprovado	L	19/08/25	WPM	AHS	EMR	RLNK
00	Emissão Inicial	A	13/08/25	WPM	CES/JB	AHS	
Nº	DESCRIÇÃO	T.E.	DATA	PREP.	VERIF.	APROV.	LIBER.

T.E. – TIPOS DE EMISSÃO

A – Preliminar B - P / Aprovação						C - P / Conhecimento D - P / Cotação		E - P / Construção F - Conforme comprado		G - Conforme construído H – Cancelado		L - Aprovado	
Preparado Wanderley		Verificado Cristiano/J.B.		Verificado Anderson		Aprovado Eduardo		Liberado Reuber		Data 19/08/2025			

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 1: Controle das Emissões

Número do Relatório	Data de Emissão	Versão do Modelo Usado	Comentários
SMIN-G-OPC-RT-0013	13/08/2025	00	Emissão Inicial
SMIN-G-OPC-RT-0013	19/08/2025	01	Aprovado

Tabela 2: Assinaturas dos Responsáveis

RELATÓRIO TRIMESTRAL - PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO PERÍODO 21/03/2025 A 22/06/2025		
Nome	Empresa	Assinatura
Reuber Luiz Neves Koury Diretor Técnico de Projetos	Samarco	DocuSigned by: <i>Reuber Luiz Neves Koury</i> 8395D3C8FEB04FA...
Eduardo Moreira Rodrigues Gerente Geral de Projetos RT de Execução da Descaracterização	Samarco	Assinado por: <i>Eduardo Moreira Rodrigues</i> 3CCE2A38D1064D3...
Pedro Henrique Moreira de Paoli Gerente de Projetos Estruturantes	Samarco	Assinado por: <i>Pedro Henrique Moreira de Paoli</i> 4087DC9E172A4CE...
Anderson Henrique do Santos Gerente de Planej. Gestão de Projetos	Samarco	DocuSigned by: <i>Anderson Henrique Dos Santos</i> 487A3049B25E4C8...
Ernesto Tadeu Bossi Gerente Geral de Geotecnia RT das Estruturas da Cava e Barragem do Germano	Samarco	Assinado por: <i>Ernesto Tadeu Bossi</i> 0A37C99AA0084A3...
Wanderley Pimentel Marciano Engenheiro de Projetos Sênior Responsável pelo Relatório Trimestral	Samarco	Assinado por: <i>Wanderley Pimentel Marciano</i> 90097108864F4F0...
Maurício Pinheiro de Souza RT de Projetos da Cava e Barragem do Germano	Stantec	Signed by: <i>Maurício</i> D8D982DBE843473...
Paulo Roberto Costa Cella RT de Pareceres Geológico-Geotécnicos da Cava e Projetos da Barragem Eixo 1, Dique Sela Tulipa e Dique Selinha	BVP Engenharia	Assinado por: <i>Paulo Roberto Costa Cella</i> B066FE73633F40C...

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 3: Finalidade do Relatório

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O presente relatório tem o objetivo de informar sobre o andamento das obras de descaracterização remanescentes (reconformação final, serviços complementares de drenagem superficial e proteção vegetal) da Barragem do Germano, cujo reservatório é formado pelo Barramento Principal e pelas estruturas geotécnicas associadas (diques Sela Tulipa e Selinha), a fim de garantir a estabilidade de longo prazo, bem como a recuperação ambiental das áreas e a implantação da Pilha de Disposição de Estéril e Rejeitos Arenosos (PDER Eixo 1).

Além disso, considera o acompanhamento da etapa de monitoramento ativo da Cava do Germano e dos diques Sela Tulipa e Selinha.

Por fim, considera também o acompanhamento da etapa de monitoramento ativo da Barragem Eixo 1, estrutura geotécnica situada a jusante do Vale do Fundão e ponto de partida para a descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha.

Referência: TAP 5442/5443

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	23
1.1 Sobre o Relatório.....	23
1.2 Propósito do Relatório	24
1.3 Sobre as Recomendações e Solicitações referentes à Auditoria Técnica Independente Acerca das Descaracterizações de Barragens no Complexo de Germano	25
1.4 Público-alvo do Relatório.....	26
2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DO GERMANO	27
2.1 Descaracterização da Cava do Germano Conforme TC: 21/10/23 (ver cronograma detalhado da Cava na pasta "Anexo II").....	28
2.1.1 Etapa de Obras de Descaracterização (concluída).....	28
2.1.2 Etapa de Monitoramento Ativo (em andamento).....	29
2.2 Descaracterização da Barragem do Germano, incluindo as estruturas associadas Dique Sela Tulipa e Dique Selinha, bem como a Barragem Eixo 1, Conforme TC: 08/05/29 (ver cronograma detalhado da Barragem na pasta "Anexo II")	30
2.2.1 Etapa de Obras de Descaracterização (em andamento)	30
2.2.2 Etapa de Monitoramento Ativo (em andamento).....	31
2.3 Caracterização do Programa Descaracterização do Germano	33
3. IDENTIFICAÇÃO.....	34
3.1 Objetivo do Capítulo	34
3.2 Nome da Barragem e da Mina, Conforme Bancos de Dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e da Agência Nacional de Mineração – ANM, Quando Couber (Item 1.1 – Subitem I do TR da FEAM).....	34
3.3 Coordenadas Geográficas do Ponto Central da Barragem Antes do Início das Obras de Descaracterização, Referenciadas no Datum SIRGAS-2000 (Item 1.1 – Subitem II do TR da FEAM)	34
3.3.1 Cava do Germano	34
3.3.2 Barragem do Germano.....	35
3.4 Matriz de Classificação, com Base nos Critérios Estabelecidos nos Anexos I a IV do Decreto 48.140, de 25 de Fevereiro de 2021 (Item 1.1 – Subitem III do TR da FEAM)	37
3.4.1 Cava do Germano (Histórico).....	37
3.4.2 Barragem do Germano.....	38
3.5 Identificação do Empreendimento com Respectiva Razão Social, CNPJ, Endereço, Nome e Telefone do Representante Legal para Contato (Item 1.1 – Subitem IV do TR da FEAM)	39
3.6 Identificação do Empreendedor com Respectiva Razão Social, CNPJ, Endereço, Nome e Telefone do Representante Legal para Contato (Item 1.1 – Subitem V do TR da FEAM)	40
3.7 Identificação do Responsável Técnico pela Barragem, com Formação Profissional, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido, Endereço do Correio Eletrônico, e Telefone para Contato (Item 1.1 – Subitem VI do TR da FEAM)	41
3.8 Identificação da Equipe Técnica Responsável pelos Projetos de Descaracterização (Nome Completo, Formação Acadêmica, Áreas sob Sua Responsabilidade no Estudo, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido). A Anotação de Responsabilidade Técnica Deverá Ser Apresentada no Anexo I (Item 1.1 – Subitem VII do TR da FEAM).....	41
3.9 Identificação da Equipe Técnica Responsável pela Execução e/ou Acompanhamento da Obra de Descaracterização (Nome Completo, Formação Acadêmica, Áreas sob Sua Responsabilidade no Estudo, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido). A Anotação de Responsabilidade Técnica Deverá Ser Apresentada no Anexo I (Item 1.1 – Subitem VIII do TR da FEAM)	43
4. PROJETO DE DESCARACTERIZAÇÃO	53
4.1 Objetivo do Capítulo	53
4.2 Descrever Sucintamente a Concepção do Projeto Adotada para Descaracterização da Barragem (Item 1.2 – Subitem I do TR)	53

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



4.3	Informar Todas as Alterações de Projetos Ocorridas no Período de Avaliação do Relatório de Acompanhamento, com Respectivas Justificativas (Item 1.2 – Subitem II do TR).....	54
4.3.1	<i>Este item é mantido como histórico no relatório, destinado a atender à Recomendação 1 da Nota Técnica de 15/12/2023 (reiterando a Recomendação 1 da Nota Técnica de 10/10/2023), incluindo registros de todas as informações relevantes.</i>	55
4.4	Caso as Obras de Descaracterização Ainda Não Tenham Sido Iniciadas, Informar as Ações e Obras Preparatórias Realizadas no Período, Tais Como: Realização de Estudos, Aquisição de Equipamentos, Construção de Estruturas de Contenção a Jusante, por Exemplo (Item 1.2 – Subitem III)	56
4.5	Descrever e Informar os Riscos Geológicos Geotécnicos Associados, Especificamente, a Implantação do Projeto de Descaracterização.....	56
5.	OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO	66
5.1	Objetivo do Capítulo	66
5.2	Memorial Descritivo das Obras de Descaracterização da Barragem, Contendo os Seguintes Dados e Informações e Representações Gráficas em Escala Adequada (Item 1.3 – Subitem I do TR):....	66
5.2.1	<i>Memorial Descritivo e Desenhos das Estruturas Implantadas, Removidas ou Modificadas, ou Informações Equivalentes, Bem Como Dispositivos de Proteção Ambiental (Item 1.3 – Subitem I-a do TR)</i>	66
5.2.2	<i>Memorial Descritivo e Layout das Soluções Geotécnicas Empregadas Durante as Obras, Incluindo a Necessidade de Esgotamento da Água Acumulada no Interior da Barragem e, caso haja, da Infraestrutura de Apoio das Frentes de Obras (Item 1.3 – Subitem I-b do TR)</i>	78
5.2.3	<i>Descrição das Estruturas e Layout dos Sistemas de Controle Ambiental dos Efluentes Líquidos, Emissões Atmosféricas e Resíduos Sólidos Gerados no Canteiro de Obras e Infraestrutura de Apoio das Frentes de Obras (Item 1.3 – Subitem I-c do TR)</i>	87
5.2.4	<i>Descrição das Ações de Movimentação de Terra, Incluindo Localização e Caracterização das Áreas de Empréstimo e Bota-Fora Utilizadas (Item 1.3 – Subitem I-d do TR)</i>	98
5.2.5	<i>Apresentar Levantamentos Topográficos e Batimétricos, Quando Couber, da Barragem no Estado Atual das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem II do TR)</i>	100
5.2.6	<i>No Caso de Remoção do Maciço e do Reservatório, Apresentar as Medidas Adotadas Para a Execução Deste Procedimento e Um Quantitativo dos Materiais Retirados (Item 1.3 – Subitem III do TR)</i>	100
5.2.7	<i>Apresentar as Medidas Adotadas Para a Redução do Nível do Lençol Freático no Reservatório, Quando Couber, Bem Como Informar o Seu Nível no Estágio Atual das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem IV do TR)</i>	101
5.2.8	<i>Apresentar Análises de Estabilidade nas Condições Drenada e Não-Drenada, e Levando em Consideração as Solicitações Sísmicas Que Possam Atuar Sobre a Estrutura, Avaliando as Resistências de Pico e Residual Para a Geometria da Barragem na Atual Etapa da Obra (Item 1.3 – Subitem V do TR)</i>	106
5.2.9	<i>Apresentar o Andamento das Medidas de Estabilização e/ou Reforço Para Atingir no Mínimo os Fatores de Segurança Estabelecidos no item V, Bem Como das Medidas de Contingências Adotadas Caso a Estabilidade da Estrutura Durante as Obras Não Possa Ser Garantida (Item 1.3 – Subitem VI do TR)</i>	107
5.2.10	<i>Apresentar o Andamento das Obras (Item 1.3 – Subitem VII)</i>	107
5.2.11	<i>Apresentar a Análise dos Resultados das Inspeções Visuais Realizadas na Estrutura no Período Avaliado em Relação às Obras de Descaracterização, Informando a Periodicidade das Inspeções (Item 1.3 – Subitem VIII do TR)</i>	113
5.2.12	<i>Apresentar as Leituras da Instrumentação Instalada na Barragem, Informando a Periodicidade Adotada Para as Leituras e a Relação dos Níveis Registrados Pelos Instrumentos Com os Níveis de Controle de Segurança Estabelecidos Para a Estrutura (Item 1.3 – Subitem IX do TR)..</i>	115
5.2.13	<i>Apresentar as Leituras e a Avaliação de Desempenho da Instrumentação Empregada Especificamente, Caso Houver, para o Período das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem X)</i>	116

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5.2.14	Informar os Períodos de Interrupção dos Trabalhos, Devidamente Justificados (Ex.: Período Chuvoso), se Pertinente (Item 1.3 – Subitem XI).....	117
5.2.15	Apresentar os Protocolos Adotados Para Garantir a Segurança dos Trabalhadores Durante as Obras (Item 1.3 – Subitem XII do TR da FEAM).....	121
5.2.16	Descrição e Registros Fotográficos de Cada Atividade já Concluída ou Em Andamento Para a Descaracterização da Barragem (Item 1.3 – Subitem XIII do TR da FEAM).....	121
5.2.17	Apresentar Cronograma Atualizado, Detalhando a Data de Início e Conclusão (ou Previsão) de Cada Atividade Realizada ou a Realizar Para a Descaracterização da Estrutura. Detalhar as Atividades Realizadas no Período, Percentual de Avanço da Descaracterização, Cumprimento das Ações Previstas na Respectiva Etapa do Cronograma (Item 1.3 – Subitem XIV do TR).....	121
6.	ESCOPO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA	123
6.1	Objetivo do Capítulo	123
6.2	Escopo do Programa	123
6.3	Escopo da Descaracterização da Cava do Germano	124
6.3.1	Engenharia (status: 100% concluída)	124
6.3.2	Suprimentos (status: 100% concluído).....	124
6.3.3	Construção (status: 100% concluída)	125
6.4	Escopo da Descaracterização da Barragem do Germano.....	127
6.4.1	Engenharia (status: 98,11% concluída).....	127
6.4.2	Suprimentos (status: 88,34% concluído).....	127
6.4.3	Construção Geral (status: 89,18% concluída).....	128
7.	DESEMPENHO DA DESCARACTERIZAÇÃO.....	133
7.1	Objetivo do Capítulo	133
7.2	Avanço Físico Acumulado da Descaracterização – Previsto x Realizado	133
7.3	Tabela Resumo de Desempenho no Trimestre e Acumulado	134
7.4	Desempenho do Programa Descaracterização Geral	134
7.4.1	Curva S Geral do Programa (Cava + Barragem)	134
7.4.2	Curva S Geral da Construção do Programa (Cava + Barragem).....	135
7.4.3	Curva S Geral de Suprimentos do Programa (Cava + Barragem).....	135
7.4.4	Curva S Geral da Engenharia do Programa (Cava + Barragem)	136
7.5	Descaracterização da Cava do Germano (Histórico).....	136
7.5.1	Curva S Geral da Cava	136
7.5.2	Curva S da Construção da Cava.....	137
7.5.3	Curva S de Suprimentos da Cava	137
7.5.4	Curva S da Engenharia da Cava.....	138
7.6	Descaracterização da Barragem do Germano	138
7.6.1	Curva S Geral da Barragem	138
7.6.2	Curva S da Construção da Barragem	139
7.6.3	Curva S de Suprimentos da Barragem.....	139
7.6.4	Curva S da Engenharia da Barragem	140
7.7	Cronograma Detalhado do Programa Descaracterização	140
7.8	Caminhos Críticos	140
7.8.1	Descaracterização da Cava do Germano	140
7.8.2	Descaracterização da Barragem do Germano.....	141
8.	DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO	142
8.1	Objetivo do Capítulo	142
8.2	Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes da Construção	142
8.2.1	Barragem do Germano.....	142
8.3	Atividades Principais – Obras Executadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25).....	142
8.4	Atividades Principais – Obras Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25).....	143
8.5	Atividades Principais Previstas para o período no Relatório Anterior x Atividades Realizadas.....	144

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



8.5.1	Cava do Germano	144
8.5.2	Barragem do Germano	144
8.6	Principais Quantidades das Obras de Descaracterização	145
8.6.1	Cava do Germano (Histórico)	145
8.6.2	Barragem do Germano	146
8.7	Histogramas de Força de Trabalho e Equipamentos por Contrato	147
8.7.1	Cava do Germano – Descaracterização da Cava	147
8.7.2	Cava do Germano – REC/TAC do 11CV026/027	148
8.7.3	Cava do Germano – Bacia do Chico	150
8.7.4	Cava do Germano – TCLD 11CV027	151
8.7.5	Barragem e Cava do Germano – Sistema de Manuseio de Estéril e Rejeitos Arenosos	152
8.7.6	Cava do Germano – Contenções dos Transportadores	153
8.7.7	Barragem do Germano – Descaracterização Etapa 1	155
8.7.1	Barragem e Cava do Germano – Regrade Etapa 2/3	156
8.7.1	Barragem do Germano – Descaracterização da Barragem	158
8.7.2	Barragem do Germano – Descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha	159
8.7.3	Barragem do Germano – Descaracterização da Barragem	161
8.7.1	Barragem do Germano – Descaracterização da Barragem	163
9.	DESEMPENHO DO SUPRIMENTO	165
9.1	Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes de Suprimentos	165
9.1.1	Barragem do Germano	165
9.2	Atividades Principais de Suprimentos Executadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)	165
9.3	Atividades Principais de Suprimentos Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)	165
9.4	Principais Materiais – Fornecimento	166
10.	ENGENHARIA.....	168
10.1	Integração entre as Engenharias	168
10.2	Tramitação de Documentação Técnica	168
10.3	Registro de Adequações	168
10.4	Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes de Engenharia	169
10.4.1	Barragem do Germano	169
10.5	Atividades Principais de Engenharia Realizadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)	169
10.6	Atividades Principais de Engenharia Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)	170
11.	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	171
11.1	Objetivo do Capítulo	171
11.2	Introdução	171
11.3	Política de SST – Samarco	171
11.4	Os Pilares da Samarco	171
11.4.1	Nossos Valores	171
11.4.2	Regras de Respeito à Vida	172
11.4.3	Filosofia de Atuação	172
11.5	Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho	174
11.5.1	Objetivos do Plano de SST	175
11.6	Sistema de Gerenciamento de Riscos	176
11.6.1	Identificação e Avaliação dos Riscos	176
11.6.2	Classificação dos Riscos	180
11.6.3	Responsabilidades e Estrutura	180
11.6.4	Objetivos e Metas	183
11.6.5	Treinamentos, Competência e Comunicação	184
11.7	Plano de Ações Emergenciais de Barragem de Mineração – PAEBM	186
11.8	Ferramentas do Sistema de Gestão de Segurança	188
11.8.1	Checklist Fácil	188

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11.8.2	<i>Análise Preliminar de Perigos – APP</i>	188
11.8.3	<i>Análise Preliminar de Riscos – APR</i>	189
11.8.4	<i>Permissão Para Trabalho Perigoso – PTP</i>	191
11.8.5	<i>Bow Tie</i>	193
11.8.6	<i>Programa de Observação do Trabalho Seguro – POTS</i>	193
11.8.7	<i>Fóruns de Discussões de Saúde e Segurança</i>	195
11.8.8	<i>Inspeções e Blitz de Segurança</i>	197
11.8.9	<i>Gestão de Contratadas – Reconhecimento</i>	199
11.8.10	<i>Lições Aprendidas</i>	200
11.8.11	<i>Gerenciamento de Mudanças</i>	202
11.9	<i>Equipamentos de Proteção Individual – EPIs</i>	204
11.10	<i>Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs</i>	204
11.11	<i>Plano Diretor de Canteiros e Caminhos Seguros</i>	205
11.12	<i>Sistema de Permissões: Crachá, Vestuários e Uniformes</i>	205
11.13	<i>Ergonomia</i>	205
11.14	<i>Incidência de Fenômenos Naturais</i>	206
11.15	<i>Manuseio e Armazenamento de Produtos Químicos</i>	206
11.16	<i>Segurança no Transporte de Cargas</i>	206
11.17	<i>Gestão de Riscos de Saúde: Exames</i>	206
11.18	<i>Manual de Procedimentos de Segurança</i>	207
11.19	<i>Manual de Saúde e Segurança do Trabalho (Edital de SST)</i>	207
11.20	<i>Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO</i>	207
11.21	<i>Seleção de Prestadores de Serviços</i>	208
11.22	<i>Emergência</i>	209
12.	ASPECTOS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO	210
12.1	<i>Objetivo do Capítulo</i>	210
12.2	<i>Introdução</i>	210
12.3	<i>Ref. Item 1.3 Aspectos Ambientais das Obras de Descaracterização</i>	210
12.3.1	<i>Ref. Item 1.3 – I – Apresentar o Estado das Estruturas de Drenagem, Canais de Desvio da Bacia de Drenagem ou Restabelecimento da Calha do Rio Formado por Elementos Naturais, Durante o Atual Estágio das Obras de Descaracterização, Quando Couber</i>	210
12.3.2	<i>Ref. Item 1.3 – II – Informar as Ações e Programas Adotados para Controlar, Mitigar, Recuperar e, Quando Couber, Compensar Impactos Ambientais Causados pelas Obras de Descaracterização</i>	227
12.3.3	<i>Ref. Item 1.3 – III – Apresentar Os Resultados de Avaliação da Qualidade da Água no Atual Estágio das Obras de Descaracterização</i>	253
12.3.4	<i>Ref. Item 1.3 – IV – Para Obras em Estágio de Finalização, Apresentar As Medidas Adotadas para O Manejo e A Proteção do Solo, dos Recursos Hídricos, para Garantir A Estabilidade Geotécnica da Área Descaracterizada e A Metodologia Aplicada para Recomposição da Cobertura Vegetal</i>	254
12.3.5	<i>Ref. Item 1.3 – V – Apresentar As Medidas Mitigadoras e Emergenciais Adotadas Visando A Continuidade do Abastecimento Público A Jusante da Barragem até A Zona de Autossalvamento – ZAS e Zona de Segurança Secundárias – ZSS, Caso Exista Captação de Água À Jusante da Estrutura</i>	257
13.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ANDAMENTO DAS OBRAS	258
13.1	<i>Descaracterização da Barragem do Germano</i>	258
13.1.1	<i>Canal Drenagem Principal da Barragem do Germano</i>	258
13.1.2	<i>Berma de Reforço do Barramento Principal</i>	259
13.1.3	<i>Barragem Eixo 1 e Vale do Fundão a montante do Eixo 1</i>	260
13.1.4	<i>Vale do Fundão em Selinha</i>	260
13.1.5	<i>Descaracterização do Dique Sela Tulipa e Dique Selinha</i>	261
13.1.6	<i>Regrade – Regiões do Pinheirinho e Ferrovia</i>	261
13.1.7	<i>Regrade – Regiões a Montante do Barramento Principal e dos Diques Sela Tulipa/Selinha</i>	262

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



13.1.8	Regrade – Região do Dique Auxiliar	262
13.1.9	Regrade – Região da Baía 3	263
13.2	Descaracterização da Cava do Germano	263
13.2.1	Obras do Marco de Descaracterização da Cava – Vista Geral.....	263
14.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	264
15.	APÊNDICES.....	265
15.1	APÊNDICE I – Descaracterização do Dique Sela Tulipa (Histórico)	265
15.1.1	Objetivo do Apêndice I.....	265
15.1.2	Contextualização	265
15.1.3	Identificação.....	267
15.1.4	Projeto de Descaracterização – Dique Sela Tulipa	273
15.1.5	Obras de Descaracterização – Dique Sela Tulipa.....	274
15.1.6	Escopo das Obras de Descaracterização – Dique Sela Tulipa.....	287
15.1.7	Desempenho da Execução – Dique Sela Tulipa	288
15.1.8	Desempenho da Construção – Dique Sela Tulipa	291
15.1.9	Desempenho de Suprimentos – Dique Sela Tulipa.....	293
15.1.10	Desempenho da Engenharia – Dique Sela Tulipa	293
15.1.11	Saúde e Segurança do Trabalho.....	294
15.1.12	Aspectos Ambientais das Obras de Descaracterização	294
15.1.13	Relatório Fotográfico do Andamento das Obras – Dique de Sela Tulipa.....	294
15.2	APÊNDICE II – Descaracterização do Dique Selinha.....	296
15.2.1	Objetivo do Apêndice II.....	296
15.2.2	Contextualização	296
15.2.3	Identificação.....	298
15.2.4	Projeto de Descaracterização – Dique Selinha.....	305
15.2.5	Obras de Descaracterização – Dique Selinha	306
15.2.6	Escopo das Obras de Descaracterização – Dique Selinha	319
15.2.7	Desempenho da Execução – Dique Selinha.....	320
15.2.8	Desempenho da Construção – Dique Selinha	323
15.2.9	Desempenho de Suprimentos – Dique Selinha	324
15.2.10	Desempenho da Engenharia – Dique Selinha	325
15.2.11	Saúde e Segurança do Trabalho.....	325
15.2.12	Aspectos Ambientais das Obras de Descaracterização	325
15.2.13	Relatório Fotográfico do Andamento das Obras – Dique Selinha.....	326
15.3	APÊNDICE III – Descaracterização da Barragem Eixo 1	328
15.3.1	Objetivo do Apêndice III.....	328
15.3.2	Contextualização da Barragem Eixo 1	328
15.3.3	Identificação.....	330
15.3.4	Projeto de Descaracterização – Barragem Eixo 1	338
15.3.5	Obras de Descaracterização – Barragem Eixo 1	339
15.3.6	Escopo das Obras de Descaracterização – Barragem Eixo 1	351
15.3.7	Desempenho da Execução – Barragem Eixo 1	353
15.3.8	Desempenho da Construção – Barragem Eixo 1.....	356
15.3.9	Desempenho de Suprimentos – Barragem Eixo 1	357
15.3.10	Desempenho da Engenharia – Barragem Eixo 1.....	358
15.3.11	Saúde e Segurança do Trabalho.....	358
15.3.12	Aspectos Ambientais das Obras de Descaracterização	358
15.3.13	Relatório Fotográfico do Andamento das Obras – Barragem Eixo 1	359
16.	ANEXOS	361

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



LISTA DE FIGURAS

ITEM	PÁGINA
Figura 1: Mapa de Localização do Complexo do Germano	36
Figura 2: Localização das Estruturas no Complexo do Germano	36
Figura 3: NAPs de Projetos no Período	55
Figura 4: Recomendação 1 – Notas Técnicas de 10/10/2023 e 15/12/2023 da AECOM	55
Figura 5: Lista de Projetos Revisados e Aprovados em Atendimento à Recomendação 1	56
Figura 6: Lista de Projetos Revisados e Aprovados no Período	56
Figura 7: Recomendação 1 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	57
Figura 8: Vista da área situada a montante dos diques Sela Tulipa, região onde foi priorizada a execução do regrade.....	58
Figura 9: Vista do talude de jusante do Dique Sela Tulipa, região onde foi priorizado o término do aterro da berma de reforço, a implantação dos dispositivos de drenagem superficial e as proteções superficiais.	59
Figura 10: Vista do talude de jusante do dique Selinha, região em que foi priorizado o término do aterro da berma de reforço, assim como a instalação dos dispositivos de drenagem superficial e das proteções superficiais.	59
Figura 11: Vista geral das obras do regrade da Barragem do Germano	61
Figura 12: Vista das obras do regrade na região da Ferrovia	62
Figura 13: Detalhe da continuidade do preenchimento da área do Lago 4 e da implantação do canal principal na Região da Baía 3. Redução dos riscos associados ao avanço sobre as superfícies dos rejeitos pretéritos.	63
Figura 14: Vista de um grande trecho de canal executado bem como do aspecto geral do das regiões do Lago 2, da faixa da ferrovia e a montante do Dique Auxiliar.....	64
Figura 15: Recomendação 8 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	65
Figura 16: Vista geral da Cava do Germano (Obras de Descaracterização Concluídas)	66
Figura 17: Obras de Descaracterização da Barragem do Germano	67
Figura 18: Berma de Reforço e Retaludamento do Barramento Principal – Obras Concluídas.....	68
Figura 19: Drenagem Passiva sob a Berma de Reforço – Obras Concluídas.....	68
Figura 20: Arranjo Geral de Implantação do Canal de Drenagem Principal (CDP) da Barragem ...	69
Figura 21: Visão Geral do Canal de Drenagem Principal Em Operação e Região – Obras Concluídas	70
Figura 22: Emboque do Canal de Drenagem Principal (CDP) e Canal de Aproximação – Obras Concluídas	70
Figura 23: Região do Pinheirinho: Obras de reconformação final e canais de drenagem superficial em andamento	71
Figura 24: Região a Montante dos Diques Sela Tulipa e Selinha (Obras Concluídas).....	71
Figura 25: Região da Baía 3 e Lagos Preenchidos (Obras da Etapa 3 em Andamento)	72
Figura 26: Gestão a Vista das da Execução do Regrade da Barragem	72
Figura 27: Anexo 7.1 - Plano de Chuvas 2024–2025.....	73
Figura 28: Anexo 4.3 – Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024–2025.....	74
Figura 29: Apontamento 1 – Nota Técnica AECOM 11/04/2025	74
Figura 30: Acesso Construtivo das Obras dos Taludes de Proteção da Cava de Germano reconstruído e em operação.....	74
Figura 31: Canal CP-03 Definitivo Implantado.....	75
Figura 32: Apontamento 2 – Nota Técnica AECOM 11/04/2025	75
Figura 33: Canal Principal da Bacia do Chico.....	76

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 34: Aterros e Bueiro BVP.....	76
Figura 35: Apontamento 3 – Nota Técnica AECOM 11/04/2025	76
Figura 36: Região a Montante dos Diques de Sela Tulipa e Selinha.....	77
Figura 37: Vista das Obras Concluídas da Região a Montante dos Diques de Sela Tulipa e Selinha	77
Figura 38: Apontamento 4 – Nota Técnica AECOM 11/04/2025	77
Figura 39: Ortofoto do Vale do Fundão com Arranjo de Drenagem Superficial Conforme Projeto BVP Concluído	78
Figura 40: Vista do Vale do Fundão com as Obras Concluídas Conforme Projeto BVP	78
Figura 41: Recomendação 3 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	79
Figura 42: Mapa Reservatório da Barragem do Germano - Dezembro de 2024	80
Figura 43: Região da Baía 3 – Dezembro de 2025.....	80
Figura 44: Mapa do Reservatório da Barragem do Germano - Março de 2025.....	81
Figura 45: Região da Baía 3 – Março de 2025	81
Figura 46: Mapa do Reservatório da Barragem do Germano - Junho de 2025.....	82
Figura 47: Região da Baía 3 – Junho de 2025.....	82
Figura 48: Região a Montante do Barramento Principal – Maio de 2025	83
Figura 49: Região do Pinheirinho – Junho de 2025.....	84
Figura 50: Região de Sela Tulipa e Selinha – Junho de 2025.....	84
Figura 51: Região do Dique Auxiliar – Junho de 2025.....	85
Figura 52: Região da Baía 3 – Junho de 2025.....	85
Figura 53: Cronograma das Obras do Regrade 3 – Status: 22/06/2025	86
Figura 54: Canal de Drenagem Principal – Emboque e Setores 1/2 – Obras Concluídas e Canal em Operação	86
Figura 55: Bacia de Dissipação do CDP e Proteção dos Taludes (Obras Concluídas e Canal em Operação)	87
Figura 56: Vista do Sistema de Controle Ambiental da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE 01	88
Figura 57: Limpeza e Sucção dos Banheiros Hidráulicos nas Frentes de Serviços – Barragem do Germano	88
Figura 58: Limpeza e Sucção dos Banheiros Hidráulicos nas Frentes de Serviços – Barragem do Germano	89
Figura 59: Caixa SAO em Destaque – Oficina de Manutenção da Contratada Ápia	90
Figura 60: Kit de Emergência Ambiental na Frente de Serviço	90
Figura 61: Selos de Identificação da Condição de Emissão de Veículos e Equipamentos.....	92
Figura 62: Monitoramento de Fumaça Preta Realizado – Contratada Ápia	92
Figura 63: Balança da Portaria da Central de Materiais Descartáveis – CMD	94
Figura 64: Área de Triagem da Central de Materiais Descartáveis – CMD	95
Figura 65: Evidência de Manifesto de Transporte e Certificado de Destinação Final dos Resíduos	97
Figura 66: Áreas de Empréstimo das Obras – Barragem do Germano.....	98
Figura 67: ADMEs das Obras – Barragem do Germano.....	99
Figura 68: Áreas de Empréstimo das Obras – Cava do Germano	99
Figura 69: ADMEs das Obras – Cava do Germano	100
Figura 70: Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico.....	100
Figura 71: Filtro do Cronograma das Obras do Regrade da Cava do Germano – Obras Concluídas	101

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 72: Filtro do Cronograma das Obras de Regrade da Barragem do Germano – Obras Etapa 1 Concluídas	101
Figura 73: Filtro do Cronograma das Obras de Regrade da Barragem do Germano – Obras Etapa 2 Concluídas	102
Figura 74: Filtro do Cronograma do Estágio Atual das Obras do Regrade da Barragem – Etapa 3 (Obras Em andamento)	102
Figura 75: Filtro do Cronograma do CDP da Cava – Obras Concluídas	103
Figura 76: Filtro do Cronograma do CDP da Barragem (Obras Concluídas)	103
Figura 77: Filtro do Cronograma do Estágio Atual das Obras de Drenagem – Regrade da Barragem e Vale do Fundão.....	104
Figura 78: Mapeamento das Áreas Setorizadas em Função da Capacidade de Suporte da Fundação	105
Figura 79: Recomendação 4 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	106
Figura 80: Cava do Germano – Plugagem da Galeria – Obras Concluídas	108
Figura 81: Cava do Germano – Remoção de Interferências – Obras Concluídas.....	108
Figura 82: Cava do Germano – Supressão Vegetal – Serviços Concluídos	108
Figura 83: Barragem do Germano – Remoção de Interferências – Obras Concluídas	109
Figura 84: Barragem do Germano – Supressão Vegetal – Serviços Concluídos	109
Figura 85: Anexos 4.2 (Manejo das Águas) e 4.3 (Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024-2025).....	110
Figura 86: Filtro Cronograma das Obras Necessárias para Descaracterização da Cava (Serviços e Obras Concluídos)	110
Figura 87: Berma de Reforço e Retaludamento do Barramento Principal – Etapas Concluídas ..	111
Figura 88: Cronograma das Obras da Berma de Reforço do Barramento Principal (Obras Concluídas).....	111
Figura 89: Vista Geral do Reservatório da Barragem do Germano (Obras Etapa 3 Em Andamento)	112
Figura 90: Visão do Regrade nas Regiões do Dique Auxiliar e Baía 3 (Obras Em Andamento)...	112
Figura 91: Cronograma das Obras do Regrade do Reservatório da Barragem do Germano	113
Figura 92: Recomendação 5 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	114
Figura 93: Recomendação 6 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	115
Figura 94: Recomendação 7 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	116
Figura 95: Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho	121
Figura 96: Item 4 – Recomendações da AECOM – 17/01/23	122
Figura 97: Anexo 2 – Cronogramas das Obras de Descaracterização.....	122
Figura 98: Anexo 2 – Filtro do Cronograma para Atividades Realizadas no Período	122
Figura 99: Anexo 2 – Filtros do Cronograma para Atividades Previstas e Realizadas no Período	122
Figura 100: Vista Geral das Barragens da Samarco	123
Figura 101: Estrutura Geral das Barragens da Samarco	133
Figura 102: Cronogramas da Cava (final) e Barragem (incluindo as estruturas associadas, bem como o Eixo 1)	140
Figura 103: Atividades Críticas da Barragem do Germano	141
Figura 104: Anexo III – Engenharia	169
Figura 105: Regras de Respeito à Vida no Crachá Funcional	172
Figura 106: Filosofia de Atuação de SST na Samarco	172
Figura 107: Resumo das Diretrizes de Segurança	174
Figura 108: Sistema de Gestão de SST da Samarco	175

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 109: PCRC 01 – Veículos Rodoviários	178
Figura 110: PCRC 02 – Equipamentos Móveis de Superfície	178
Figura 111: PCRC 04 – Controle de Solo	179
Figura 112: PCRC 09 – Trabalho em Altura	179
Figura 113: PCRC 10 – Içamento	179
Figura 114: Organograma da Equipe de Gestão da Cava (Histórico)	182
Figura 115: Organograma da Equipe de Gestão da Barragem	182
Figura 116: Organograma da Equipe de Emergência	182
Figura 117: Treinamento Introdutório	184
Figura 118: Treinamento de Lideranças de Contratadas	185
Figura 119: Treinamento de Equipe de Gerenciadoras	185
Figura 120: Treinamento de Capacitação de Lideranças Ápia	186
Figura 121: Organograma da Equipe de Emergência	187
Figura 122: Placa de Sinalização de Ponto de Encontro e de Rotas de Fuga	187
Figura 123: Simulado do PAEBM 2025	187
Figura 124: Nova Tecnologia para a Realização de Inspeções	188
Figura 125: Análise Preliminar de Perigos – APP	189
Figura 126: Análise Preliminar de Riscos – APR (formulário válido até 90 dias corridos)	190
Figura 127: Análise Preliminar de Riscos – APR (formulário semanal, frente)	191
Figura 128: Análise Preliminar de Riscos – APR (formulário semanal, verso)	191
Figura 129: Permissão para Trabalho Perigoso – PTP (formulário padrão)	192
Figura 130: Bow Tie da Plugagem da Galeria da Cava do Germano	193
Figura 131: Registros de Realização do POTS	194
Figura 132: Registro de Evento de Reconhecimento	195
Figura 133: Fluxo de Trabalho dos Fóruns de Discussões de Saúde e Segurança	195
Figura 134: Comitê de Segurança	196
Figura 135: Inspeção Gerencial	196
Figura 136: DDSS	196
Figura 137: Campanha Maio Amarelo	197
Figura 138: Veículo com Equipamento de Monitoramento de Velocidade – PCRC 01	198
Figura 139: Veículo Com Rádio de Comunicação – PCRC 01 (SESI)	198
Figura 140: Inspeções e Blitz de Segurança em Veículos na Área da Barragem	199
Figura 141: Registro do Comitê em 2024 – Reconhecimento das Contratadas em Destaque (Quadrimestral)	199
Figura 142: Sinalização Específica – Relação de Marchas e Velocidades Máximas por Trecho	200
Figura 143: Rotograma Elaborado por Empresa Especializada	200
Figura 144: Central de Comunicação com Familiares – Celulares Desligados nas Frentes de Serviços	201
Figura 145: Câmeras de Monitoramento Interno e Externo em Caminhões	201
Figura 146: Reunião de Coordenação com Prestadores de Serviços	201
Figura 147: Evidência de Reunião de Coordenação em Ata	202
Figura 148: Alerta de Segurança – Intervenção no Acesso “Rio Bahia” - Barragem do Germano	203
Figura 149: Números da Central de Emergência da Samarco	209
Figura 150: Vista Geral do Sistema de Drenagem Superficial da Cava do Germano	212
Figura 151: Sistema de Drenagem Superficial a Montante do Barramento Principal da Cava	212
Figura 152: Sistema de Drenagem Superficial do Barramento Principal da Cava	213
Figura 153: Sistema de Drenagem Superficial a Jusante do Barramento Principal da Cava	213
Figura 154: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem da Bacia do Chico	215

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 155: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem da Barragem – Regiões do Pinheirinho e Ferrovia	218
Figura 156: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem da Barragem – Região do Dique Auxiliar	218
Figura 157: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem da Barragem – Região da Baía 3	219
Figura 158: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem da Barragem – Canal de Drenagem Principal	219
Figura 159: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem do Dique Sela Tulipa	221
Figura 160: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem do Dique Selinha	223
Figura 161: Evidências das Condições do Sistema a de Drenagem de Selinha – Vale do Fundão	224
Figura 162: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem a Montante da Barragem Eixo 1	226
Figura 163: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem a Jusante da Barragem Eixo 1	226
Figura 164: Cavidades por Grau de Relevância da Descaracterização e Áreas de Influência Definidas	227
Figura 165: Registro Fotográfico do Inventário do Resgate Espeleológico na Caverna CA-08	228
Figura 166: Aplicação da Metodologia de Busca Ativa Dentro das Cavidades	229
Figura 167: Monitoramento de Integridade Física Ponto de Fragilidade P4 da caverna LOC-0291(Oitava Campanha)	231
Figura 168: Vistorias de Equipamentos Instalados – Cavidades BG-01, BG-05, LOC-0149 e SM-121	233
Figura 169: Sinalização – Identificação de Caverna, Limite de Velocidade e Proibição de Uso de Rolo Compactador	236
Figura 170: Sinalização de Área de Proteção de Cavidades Naturais Subterrâneas – Acesso Restrito	236
Figura 171: Vista Geral do Centro de Desenvolvimento Florestal, Social e Ambiental	238
Figura 172: Viveiro no Distrito de Antônio Pereira	238
Figura 173: Área de Expansão do Viveiro	238
Figura 174: Fluxograma Operacional de Supressão Vegetal	239
Figura 175: Aplicação de Biomanta (Região do Pinheirinho)	240
Figura 176: Aplicação de hidrossemeadura (Selinha)	241
Figura 177: Aplicação de Hidrossemeadura (Regrade)	241
Figura 178: Aplicação de Hidrossemeadura (Regrade)	241
Figura 179: Avaliação de Campo da Recomposição na região de Sela Tulipa	242
Figura 180: Avaliação de Campo da Recomposição em Selinha	242
Figura 181: Avaliação de Campo da Recomposição em Selinha	243
Figura 182: Estação Automática de Monitoramento da Samarco em Santa Rita Durão	244
Figura 183: Vista da Estação de Monitoramento em Santa Rita Durão	244
Figura 184: Detalhes dos Equipamentos da Estação de Monitoramento em Santa Rita Durão	245
Figura 185: Placa Indicativa de Velocidade Máxima de 20km/h em Via Não-Pavimentada	248
Figura 186: Placa Indicativa de Velocidade Máxima de 40km/h em Via Não-Pavimentada	249
Figura 187: Rotograma de Umectações de Vias de Acesso	249
Figura 188: Umectação de Vias das Obras da Barragem do Germano	250
Figura 189: Umectação de Vias nas Áreas de Canteiros da Barragem do Germano	250
Figura 190: Umectação de Vias na região da Barragem do Germano (Pinheirinho)	250

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 191: Umectação de Vias do Canteiro da Ápia - Barragem do Germano	251
Figura 192: Abastecimento do Caminhão Pipa no Apanhador da Selinha	251
Figura 193: Rotograma de Umectação de Vias de Acesso com Aplicação de Polímero	252
Figura 194: Pontos Monitoramento - Qualidade de Água Superficial - Vertente do Córrego Santarém.....	253
Figura 195: Mapa de Localização e acesso ao Dique Sela Tulipa no Complexo do Germano.....	267
Figura 196: Identificação das Obras do Programa Descaracterização (Sela Tulipa).....	275
Figura 197: Região de Sela Tulipa – Obras Concluídas	276
Figura 198: Anexo 7.1 - Plano de Chuvas 2023-2024	277
Figura 199: Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico.....	277
Figura 200: Recomendação 4 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	278
Figura 201: Anexos 4.2 (Manejo das Águas) e 4.3 (Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024-2025).....	280
Figura 202: Dique Sela Tulipa – Berma de Reforço e Regrade a Montante da Estrutura (Obras Concluídas)	280
Figura 203: Ano 5 Arranjo Geral – Volumes (Estéril, Arenoso e Agregados) Finais por Região ...	281
Figura 204: Delimitação da Área do Regrade Associada à Descaracterização dos Diques Sela Tulipa e Selinha.....	281
Figura 205: Regrade da Bacia Hidrológica dos Diques de Sela Tulipa e Selinha (Obras Concluídas)	282
Figura 206: Cronograma das Obras de Descaraterização de Sela Tulipa (Obras Concluídas)	283
Figura 207: Recomendação 5 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	283
Figura 208: Recomendação 6 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	284
Figura 209: Recomendação 7 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	285
Figura 210: Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho	286
Figura 211: Item 4 – Recomendações da AECOM – 17/01/23.....	286
Figura 212: Anexo II – Cronograma das Obras de Descaracterização de Sela Tulipa	286
Figura 213: EAP do Projeto de Descaracterização do Dique Sela Tulipa (Histórico)	288
Figura 214: Cronogramas da Descaracterização do Dique Sela Tulipa	291
Figura 215: Mapa de Localização e acesso ao Dique Selinha no Complexo do Germano	299
Figura 216: Identificação das Obras do Programa Descaracterização (Selinha)	307
Figura 217: Região a Jusante de Selinha e Sela Tulipa – Obras Concluídas	307
Figura 218: Layout do Manejo das Águas – Vale do Fundão.....	308
Figura 219: Anexo 7.1 - Plano de Chuvas 2024-2025	309
Figura 220: Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico.....	310
Figura 221: Recomendação 4 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	310
Figura 222: Anexos 4.2 (Manejo das Águas) e 4.3 (Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024-2025).....	312
Figura 223: Berma de Reforço / Contrapilhamento da Estrutura, Drenagens e Proteção Vegetal (Obras Concluídas)	312
Figura 224: Ano 5 Arranjo Geral – Volumes (Estéril, Arenoso e Agregados) Finais por Região ...	313
Figura 225: Delimitação da Área do Regrade Associada à Descaracterização dos Diques Selinha e Sela Tulipa	313
Figura 226: Regrade da Bacia Hidrológica dos Diques de Selinha e Sela Tulipa (Obras Concluídas)	314
Figura 227: Cronograma das Obras de Descaraterização de Selinha (Obras Concluídas).....	315
Figura 228: Recomendação 5 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	315
Figura 229: Recomendação 6 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	316

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 230: Recomendação 7 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	317
Figura 231: Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho	318
Figura 232: Item 4 – Recomendações da AECOM – 17/01/23	318
Figura 233: Anexo 2 – Cronograma das Obras de Descaracterização de Selinha.....	319
Figura 234: EAP do Projeto de Descaracterização do Dique Selinha	320
Figura 235: Cronogramas da Descaracterização do Dique Selinha.....	323
Figura 236: Mapa de Localização e acesso à Barragem Eixo 1 no Complexo do Germano	331
Figura 237: Identificação das Obras do Programa Descaracterização (Barragem Eixo 1).....	340
Figura 238: Canais de Drenagem No Vale do Fundão (Porção do Eixo 1) Concluídos.....	340
Figura 239: Layout do Manejo das Águas – Vale do Fundão (Porção no Eixo 1)	341
Figura 240: Anexo 7.1 - Plano de Chuvas 2024-2025	342
Figura 241: Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico.....	343
Figura 242: Recomendação 4 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	344
Figura 243: Anexos 4.2 (Manejo das Águas) e 4.3 (Plano de Ação da Execução do Plano de Chuvas 2024/2025)	345
Figura 244: Ano 5 Arranjo Geral – Volumes (Estéril, Arenoso e Agregados) Finais por Região ...	346
Figura 245: Cronograma das Obras de Descaraterização da Barragem Eixo 1 (Obras Concluídas)	347
Figura 246: Recomendação 5 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	348
Figura 247: Recomendação 6 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	348
Figura 248: Recomendação 7 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025.....	349
Figura 249: Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho	350
Figura 250: Item 4 – Recomendações da AECOM – 17/01/23	351
Figura 251: Anexo 2 – Cronograma das Obras de Descaracterização do Eixo 1.....	351
Figura 252: EAP do Projeto de Descaracterização da Barragem Eixo 1.....	353
Figura 253: Cronogramas da Descaracterização da Barragem Eixo 1	356

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

ITEM	PÁGINA
<i>Foto 1: Emboque e Setores 1 / 2 do Canal Principal Em Operação(Obras Concluídas)</i>	<i>258</i>
<i>Foto 2: Vista do Setores 3 / 4 e Bacia Final do Canal Principal Em Operação (Obras Concluídas)</i>	<i>258</i>
<i>Foto 3: Vista da Bacia Final do Canal Principal Em Operação (Obras Concluídas)</i>	<i>259</i>
<i>Foto 4: Vista da Berma de Reforço do Barramento Principal (Obras Concluídas)</i>	<i>259</i>
<i>Foto 5: Vista da Barragem Eixo 1 – Obras de Preenchimento e Drenagem Superficial Concluídas</i>	<i>260</i>
<i>Foto 6: Vista das Obras do Vale do Fundão a Montante da Barreira 3 e Seção AA Concluídas ..</i>	<i>260</i>
<i>Foto 7: Regiões a Montante do Barramento Principal e dos Diques de Sela Tulipa e Selinha (Obras Concluídas)</i>	<i>261</i>
<i>Foto 8: Regiões do Pinheirinho e Ferrovia (Obras do Canal de Drenagem Definitivo em Andamento).....</i>	<i>261</i>
<i>Foto 9: Regiões a Montante do Barramento Principal e dos Diques de Sela Tulipa / Selinha (Obras Concluídas)</i>	<i>262</i>
<i>Foto 10: Região do Dique Auxiliar (Obras em Andamento).....</i>	<i>262</i>
<i>Foto 11: Região da Baía 3 (Obras de Aterro e Canal de Drenagem Definitivo em Andamento) ...</i>	<i>263</i>
<i>Foto 12: Berma de Reforço, Canal Principal, Drenagens Superficiais e Proteção Vegetal (Obras Concluídas)</i>	<i>263</i>
<i>Foto 13: Vista da do Dique Sela Tulipa com a Berma de Reforço, Drenagem Superficial e Proteção Vegetal Concluídas</i>	<i>294</i>
<i>Foto 14: Regrade a Montante de Sela Tulipa e Selinha Concluído</i>	<i>295</i>
<i>Foto 15: Visão Geral de Sela Tulipa – Obras de Descaracterização Concluídas</i>	<i>295</i>
<i>Foto 16: Dique Selinha - Berma de Reforço, Drenagem Superficial e Proteção Vegetal Concluídas</i>	<i>326</i>
<i>Foto 17: Vale do Fundão (Porção em Selinha) – Preenchimento, Drenagem Superficial e Proteção Vegetal Concluídos</i>	<i>326</i>
<i>Foto 18: Vista Geral da Região do Dique Selinha, Montante da Barreira (Obras Concluídas)</i>	<i>327</i>
<i>Foto 19: Proteção da Conexão do Colchão Drenante e Canal da Ombreira Esquerda (Obras Concluídas)</i>	<i>359</i>
<i>Foto 20: Região a Jusante do Eixo 1 – Canais de Drenagem OD/OE (Obras Concluídas).....</i>	<i>359</i>
<i>Foto 21: Região a Montante da Barreira 4 – Preenchimentos, Drenagens e Proteção Vegetal (Obras Concluídas)</i>	<i>360</i>
<i>Foto 22: Visão Geral da Barragem Eixo 1 (Obras Concluídas)</i>	<i>360</i>

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



LISTA GRÁFICOS

ITEM	PÁGINA
Gráfico 1: Movimentação de Terra e Est. Metálicas – Quant. Prev. x Real. Acumuladas – Obras Concluídas	145
Gráfico 2: Obras Cíveis – Quant. Prev. x Real Acumuladas – Obras Concluídas	145
Gráfico 3: Canal Principal – Quantidades Previstas x Realizadas Acumuladas – Obras Concluídas	146
Gráfico 4: Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Eixo 1 Etapa 2 – Quant. Prev. x Real. Acumuladas - Obras Concluídas.....	146
Gráfico 5: Regrade Etapas 2 e 3 – Quant. Prev. x Real. Acumuladas – Obras Concluídas	146
Gráfico 6: Regrade Etapa 3 – Quant. Prev. x Real. Acumuladas (Obras Em Andamento)	147
Gráfico 7: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000630b – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)	147
Gráfico 8: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000630b – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)	148
Gráfico 9: Equipamentos Principais (Contrato 4300000630b – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)	148
Gráfico 10: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000659 – Real Estruturas – Finalizado)...	149
Gráfico 11: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000659 – Real Estruturas – Finalizado)	149
Gráfico 12: Equipamentos Principais (Contrato 4300000659 – Real Estruturas – Finalizado)	150
Gráfico 13: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000595b – Consórcio MRF – Finalizado).	150
Gráfico 14: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000595b – Consórcio MRF – Finalizado) ...	151
Gráfico 15: Equipamentos Principais (Contrato 4300000595b – Consórcio MRF – Finalizado) ...	151
Gráfico 16: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000642 – Hexágono Engenharia – Finalizado)	152
Gráfico 17: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000794 – Milplan Engenharia – Finalizado)	152
Gráfico 18: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000794 – Milplan Engenharia – Finalizado)	153
Gráfico 19: Equipamentos Principais (Contrato 4300000794 – Milplan Engenharia – Finalizado)	153
Gráfico 20: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000764 – Progeo Engenharia – Finalizado)	154
Gráfico 21: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000764 – Progeo Engenharia – Finalizado)	154
Gráfico 22: Equipamentos Principais (Contrato 4300000764 – Progeo Engenharia – Finalizado)	155
Gráfico 23: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000106 – Consórcio MRF – Finalizado) ..	155
Gráfico 24: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000106 – Consórcio MRF – Finalizado)	156
Gráfico 25: Equipamentos Principais (Contrato 4300000106 – Consórcio MRF – Finalizado)	156
Gráfico 26: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000630 – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)	157
Gráfico 27: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000630 – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)	157
Gráfico 28: Equipamentos Principais (Contrato 4300000630 – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)	158

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Gráfico 29: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000868 – Progeo - Finalizado)	158
Gráfico 30: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000868 – Progeo - Finalizado).....	159
Gráfico 31: Equipamentos Principais (Contrato 4300000868 – Progeo - Finalizado).....	159
Gráfico 32: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000595 – Consórcio MRF - Finalizado) ...	160
Gráfico 33: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000595 – Consórcio MRF - Finalizado).....	160
Gráfico 34: Equipamentos Principais (Contrato 4300000595 – Consórcio MRF - Finalizado).....	161
Gráfico 35: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300001308 – Ápia).....	161
Gráfico 36: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300001308 – Ápia)	162
Gráfico 37: Equipamentos Principais (Contrato 4300001308 – Ápia)	162
Gráfico 38: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300001042 – CRD - Finalizado)	163
Gráfico 39: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300001042 – CRD - Finalizado)	163
Gráfico 40: Equipamentos Principais (Contrato 4300001042 – CRD - Finalizado).....	164
Gráfico 41: Médias Diárias MP2,5 – Fonte: Ambion	246
Gráfico 42: Médias Diárias MP10 – Fonte: Ambion	246
Gráfico 43: Médias Diárias PTS – Fonte: Ambion.....	246
Gráfico 44: Evolução do IQAR (MP2,5 e MP10) na Estação Santa Rita Durão – Fonte: Ambion .	247
Gráfico 45: Rosa dos Ventos (Estação Santa Rita Durão) – Fonte: Ambion	247
Gráfico 46: Acumulados Diários (Precipitação Pluviométrica) – Fonte: Ambion.....	248
Gráfico 47: Status da Execução do Aterro a Jusante de Sela Tulipa (Concluído)	292
Gráfico 48: Status da Execução do Aterro a Montante de Sela Tulipa (Concluído).....	292
Gráfico 49: Status dos Aterros a Montante da Barreira 3, Seção AA e Contrapilhamento (Concluídos).....	324
Gráfico 50: Status dos Aterros a Montante do Eixo1 (Concluídos)	357

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



LISTA DE TABELAS

ITEM	PÁGINA
<i>Tabela 1: Controle das Emissões</i>	<i>2</i>
<i>Tabela 2: Assinaturas dos Responsáveis</i>	<i>2</i>
<i>Tabela 3: Finalidade do Relatório</i>	<i>3</i>
<i>Tabela 4: Caracterização do Programa Descaracterização do Germano.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabela 5: Identificação da Estrutura da Cava do Germano.....</i>	<i>34</i>
<i>Tabela 6: Identificação da Estrutura da Barragem do Germano.....</i>	<i>34</i>
<i>Tabela 7: Coordenadas da Cava do Germano.....</i>	<i>34</i>
<i>Tabela 8: Coordenadas da Barragem do Germano</i>	<i>35</i>
<i>Tabela 9: Matriz de Classificação da Cava do Germano (Versão Final)</i>	<i>37</i>
<i>Tabela 10: Matriz de Classificação da Barragem do Germano</i>	<i>38</i>
<i>Tabela 11: Identificação do Empreendimento – Cava do Germano</i>	<i>39</i>
<i>Tabela 12: Identificação do Empreendimento – Barragem do Germano.....</i>	<i>40</i>
<i>Tabela 13: Identificação do Empreendedor</i>	<i>40</i>
<i>Tabela 14: Responsável Técnico pela Cava e Barragem do Germano.....</i>	<i>41</i>
<i>Tabela 15: Equipe Técnica dos Projetistas Responsável Pelos Projetos de Descaracterização....</i>	<i>41</i>
<i>Tabela 16: Equipe Técnica da Samarco Responsável Pelo Acompanhamento dos Projetos de Descaracterização.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabela 17: Responsável Técnico (Samarco) Pelas Obras de Descaracterização da Cava e Barragem do Germano.....</i>	<i>44</i>
<i>Tabela 18: Responsáveis Técnicos (Contratadas) Pelas Obras de Descaracterização da Cava do Germano</i>	<i>44</i>
<i>Tabela 19: Responsáveis Técnicos (Contratadas) Pelas Obras de Descaracterização da Barragem do Germano</i>	<i>46</i>
<i>Tabela 20: Responsáveis Técnicos (Contratadas) Pelas Obras do Sistema de Transporte de Rejeito e Estéril</i>	<i>50</i>
<i>Tabela 21: Responsáveis Técnicos pela Supressão Vegetal e Revegetação nas Áreas da Cava e Barragem</i>	<i>51</i>
<i>Tabela 22: Atendimento à Recomendação 1 – Notas Técnicas de 10/10/2023 e 15/12/2023.....</i>	<i>55</i>
<i>Tabela 23: Síntese do Plano de Ação Implantado para o Período de Chuvas 2024–2025.....</i>	<i>73</i>
<i>Tabela 24: Total de Efluentes Sanitários Gerados no Período.....</i>	<i>89</i>
<i>Tabela 25: Veículos Monitorados no Período</i>	<i>93</i>
<i>Tabela 26: Quantitativo de Resíduos Gerados no Programa Descaracterização do Germano (TON) no Período.....</i>	<i>97</i>
<i>Tabela 27: Áreas de Empréstimo e Localização da ADME das Obras de Descaracterização.....</i>	<i>98</i>
<i>Tabela 28: Precipitação Real – Fonte: Centro de Monitoramento & Inspeção (CMI) Samarco</i>	<i>117</i>
<i>Tabela 29: Memória de Cálculo do Impacto das Chuvas na Berma de Reforço da Cava</i>	<i>118</i>
<i>Tabela 30: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados No Período – Programa Descaracterização.....</i>	<i>134</i>
<i>Tabela 31: Análise do Caminho Crítico dos Pacotes da Barragem</i>	<i>141</i>
<i>Tabela 32: Composição dos Desvios / Ações dos Pacotes da Construção da Barragem</i>	<i>142</i>
<i>Tabela 33: Avaliação das Atividades da Descaracterização da Cava Realizadas no Trimestre x Planejadas</i>	<i>144</i>
<i>Tabela 34: Avaliação das Atividades da Barragem Realizadas no Trimestre x Planejadas</i>	<i>144</i>

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



<i>Tabela 35: Composição do Desvios / Ações dos Pacotes de Suprimentos da Barragem</i>	<i>165</i>
<i>Tabela 36: Principais Materiais de 2021 – Acumulados Previstos x Realizados</i>	<i>166</i>
<i>Tabela 37: Principais Materiais de 2022 – Acumulados Previstos x Realizados</i>	<i>166</i>
<i>Tabela 38: Principais Materiais de 2023 – Acumulados Previstos x Realizados</i>	<i>167</i>
<i>Tabela 39: Principais Materiais de 2024 – Acumulados Previstos x Realizados</i>	<i>167</i>
<i>Tabela 40: Principais Materiais de 2025 – Acumulados Previstos x Realizados (em andamento)</i>	<i>167</i>
<i>Tabela 41: Composição dos Desvios / Ações dos Pacotes de Engenharia da Barragem</i>	<i>169</i>
<i>Tabela 42: Matriz de Responsabilidade para Lideranças.....</i>	<i>181</i>
<i>Tabela 43: Matriz de Responsabilidade para Gestores na Execução</i>	<i>181</i>
<i>Tabela 44: Indicadores e Metas de SST.....</i>	<i>183</i>
<i>Tabela 45: Especificação de Equipamentos da Estação de Monitoramento em Santa Rita Durão</i>	<i>245</i>
<i>Tabela 46: Mix de Sementes e Insumos para Hidrossemeadura</i>	<i>256</i>
<i>Tabela 47: Identificação do Dique Sela Tulipa</i>	<i>267</i>
<i>Tabela 48: Coordenadas do Dique Sela Tulipa.....</i>	<i>267</i>
<i>Tabela 49: Matriz de Classificação do Dique Sela Tulipa.....</i>	<i>268</i>
<i>Tabela 50: Identificação do Empreendimento – Dique Sela Tulipa</i>	<i>269</i>
<i>Tabela 51: Identificação do Empreendedor do Dique Sela Tulipa</i>	<i>269</i>
<i>Tabela 52: Responsável Técnico pelo Dique Sela Tulipa.....</i>	<i>269</i>
<i>Tabela 53: Equipe Técnica dos Projetistas Responsável Pelos Projetos de Descaracterização do Dique Sela Tulipa</i>	<i>270</i>
<i>Tabela 54: Equipe Técnica da Samarco Responsável Pelo Acompanhamento dos Projetos de Descaracterização do Dique Sela Tulipa</i>	<i>270</i>
<i>Tabela 55: Responsável Técnico (Samarco) Pelas Obras de Descaracterização do Dique Sela Tulipa</i>	<i>271</i>
<i>Tabela 56 : Responsáveis Técnicos (Contratadas) Pelas Obras de Descaracterização do Dique Sela Tulipa</i>	<i>271</i>
<i>Tabela 57 : Responsável Técnico pela Revegetação nas Áreas de Sela Tulipa</i>	<i>273</i>
<i>Tabela 58: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados no Período – Dique Sela Tulipa (Histórico).....</i>	<i>288</i>
<i>Tabela 59: Avaliação das Atividades do Dique Sela Tulipa Realizadas no Trimestre x Planejadas</i>	<i>292</i>
<i>Tabela 60: Identificação do Dique Selinha.....</i>	<i>298</i>
<i>Tabela 61: Coordenadas do Dique Selinha</i>	<i>298</i>
<i>Tabela 62: Matriz de Classificação do Dique Selinha</i>	<i>299</i>
<i>Tabela 63: Identificação do Empreendimento – Dique Selinha</i>	<i>300</i>
<i>Tabela 64: Identificação do Empreendedor do Dique Selinha.....</i>	<i>301</i>
<i>Tabela 65: Responsável Técnico pelo Dique Selinha</i>	<i>301</i>
<i>Tabela 66: Equipe Técnica dos Projetistas Responsável Pelos Projetos de Descaracterização do Dique Selinha.....</i>	<i>302</i>
<i>Tabela 67: Equipe Técnica da Samarco Responsável Pelo Acompanhamento dos Projetos de Descaracterização do Dique Selinha.....</i>	<i>302</i>
<i>Tabela 68: Responsável Técnico (Samarco) Pelas Obras de Descaracterização do Dique Selinha</i>	<i>303</i>
<i>Tabela 69 : Responsáveis Técnicos (Contratada) Pelas Obras de Descaracterização do Dique Selinha</i>	<i>303</i>
<i>Tabela 70 : Responsável Técnico pela Revegetação nas Áreas de Selinha</i>	<i>304</i>
<i>Tabela 71: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados No Período – Dique Selinha</i>	<i>320</i>

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



<i>Tabela 72: Avaliação das Atividades do Dique Selinha Realizadas no Trimestre x Planejadas.....</i>	<i>324</i>
<i>Tabela 73: Identificação da Estrutura da Barragem Eixo 1</i>	<i>330</i>
<i>Tabela 74: Coordenadas da Barragem Eixo 1</i>	<i>330</i>
<i>Tabela 75: Matriz de Classificação da Barragem Eixo 1</i>	<i>331</i>
<i>Tabela 76: Identificação do Empreendimento – Barragem Eixo 1.....</i>	<i>332</i>
<i>Tabela 77: Identificação do Empreendedor – Barragem Eixo 1</i>	<i>333</i>
<i>Tabela 78: Responsável Técnico – Barragem Eixo 1.....</i>	<i>333</i>
<i>Tabela 79: Equipe Técnica dos Projetistas Responsável Pelos Projetos de Descaracterização da Barragem Eixo 1.....</i>	<i>334</i>
<i>Tabela 80: Equipe Técnica da Samarco Responsável Pelo Acompanhamento dos Projetos de Descaracterização da Barragem Eixo 1</i>	<i>334</i>
<i>Tabela 81: Responsável Técnico (Samarco) Pelas Obras de Descaracterização da Barragem Eixo 1.....</i>	<i>335</i>
<i>Tabela 82: Responsáveis Técnicos (Contratadas) Pelas Obras de Descaracterização da Barragem Eixo 1</i>	<i>335</i>
<i>Tabela 83 : Responsável Técnico pela Revegetação nas Áreas da Barragem Eixo 1</i>	<i>338</i>
<i>Tabela 84: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados No Período – Barragem Eixo 1</i>	<i>353</i>
<i>Tabela 85: Avaliação das Atividades da Barragem Eixo 1 Realizadas no Trimestre x Planejadas.....</i>	<i>357</i>

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



1. INTRODUÇÃO

1.1 Sobre o Relatório

As informações aqui contempladas, referentes ao andamento das obras de descaracterização e ao acompanhamento da etapa de monitoramento ativo, são resultantes das apurações das atividades realizadas no Programa Descaracterização do Germano — Barragem do Germano (incluindo as estruturas associadas Sela Tulipa e Selinha, bem como a Barragem Eixo 1) e Cava do Germano — no último trimestre, no período compreendido entre 21/03/2025 e 22/06/2025.

As obras de descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e da Barragem Eixo 1 foram concluídas em 16/01/2025 (data mais tarde) e a *Punch List* em 15/02/2025, conforme atestado no Relatório Técnico de Descaracterização destas estruturas, emitido pela BVP Engenharia, protocolado junto à FEAM em janeiro de 2025, através do ofício SAM-G-0029/2025 e disponibilizado no Anexo 3.6 – G102400-G-1RT352_R-02 na pasta “Anexo III – Engenharia” do presente relatório. Atualmente, as estruturas se encontram em fase de monitoramento ativo.

A solicitação formal de conclusão do processo de descaracterização para cada estrutura (Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Barragem Eixo 1) junto à FEAM no início de 2025 representou um marco importante na implantação do Programa Descaracterização do Germano. Ademais, permite o início da implantação da PDER Eixo 1.

Cabe destacar que o *Regrade* no reservatório, os serviços complementares de drenagem superficial e a proteção vegetal compõem a última etapa de obras de descaracterização a ser concluída. Em função dos avanços na implantação desta última etapa, a Samarco identificou potencial oportunidade de antecipação da conclusão do Programa de Descaracterização do Germano para 2026.

Isto posto, a Samarco apresenta em detalhes o histórico do andamento das obras e o acompanhamento do monitoramento ativo do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e da Barragem Eixo 1, com as respectivas informações específicas contempladas nos Apêndices I, II e III do presente relatório, a saber:

- Apêndice I – Descaracterização do Dique Sela Tulipa;
- Apêndice II – Descaracterização do Dique Selinha;
- Apêndice III – Descaracterização da Barragem Eixo 1.

Importante ressaltar que as obras de descaracterização da Cava do Germano foram concluídas em 02/06/2023 e a *Punch List* em 15/08/2023, conforme atestado no relatório de conformidade emitido pela Stantec Consulting International Ltd., disponibilizado no Anexo 3.4 – G122600-G-1RT096_R-01 na pasta “Anexo III – Engenharia” do presente relatório, incluindo evidências específicas que constata o atendimento. Cabe informar que a etapa do monitoramento ativo desta estrutura, pelo período mínimo de 2 (dois) anos após a conclusão das etapas de descaracterização anteriores, conforme previsto na Resolução 130 — Artigo 2º da ANM, foi concluída em 02/06/2025. Porém, a Cava do Germano continua

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



em monitoramento ativo até que o descadastramento da estrutura junto à ANM seja efetivado.

Os dados relacionados ao Programa Descaracterização do Germano são fornecidos pelas áreas de Engenharia, Suprimentos, Construção, Geotecnia, Meio Ambiente e Saúde & Segurança do Trabalho, analisados e compilados pela Gerência de Planejamento e Gestão de Projetos (GGPR) e aplicados, neste relatório, em comum acordo com as áreas envolvidas na execução dos projetos.

As análises são elaboradas levando em consideração informações técnicas e gerenciais, baseadas nas melhores práticas de gerenciamento e execução de projetos disponíveis na Samarco e no mercado.

Informações consideradas importantes e relevantes apuradas fora do período de referência poderão ser incluídas no relatório, em caráter de exceção. Na ocorrência de exceções, notas explicativas indicarão a pertinência da inclusão.

A versão digital do presente relatório é publicada no portal da Samarco na Internet com livre acesso ao público.

Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o conteúdo do relatório, contatos abaixo poderão ser acessados:

Eduardo Moreira – Gerente Geral de Projetos e Retomada

eduardo.moreira@samarco.com

Anderson Henrique dos Santos – Gerente de Planejamento e Gestão de Projetos

anderson.santos@samarco.com

1.2 Propósito do Relatório

O Relatório Trimestral se destina a informar aos compromitentes, Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), bem como a Interveniente, a Agência Nacional de Mineração (ANM), sobre o andamento das obras de descaracterização e monitoramento ativo das estruturas geotécnicas que compõem o Programa Descaracterização do Germano.

O presente documento tem a finalidade de:

- Atender ao Termo de Referência de Descaracterização da FEAM para Barragens Alteadas pelo Método a Montante, conforme previsto na Lei 23.291, de 25 de fevereiro de 2019 e instituído pela Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº 2.784 de 21 de março de 2019;
- Atender ao Termo de Compromisso de Descaracterização, assinado em 25 de fevereiro de 2022, entre a Samarco, o Estado de Minas Gerais (representado pela SEMAD e FEAM), MPMG, MPF e interveniência da ANM;

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Atender ao Termo de Referência do Governo do Estado de Minas Gerais (representado pela SEMAD e FEAM), encaminhado através do ofício FEAM/GERAM nº 484/22 em 25 de novembro de 2022;
- Atender às recomendações das Notas Técnicas da AECOM, emitidas em 17/01/2023, 10/10/2023, 15/12/2023, 02/08/2024, 31/01/2025, 11/04/2025, encaminhadas pela FEAM via ofícios NUBAR 238/2023, GBM 1073/2023, GBM 125/2024, GBM 561/2024, GBM 95/2025 e 401/2025, respectivamente;
- Servir como o principal instrumento de comunicação entre as partes, para garantir que todos os envolvidos estejam bem-informados e conscientes de todos os processos e etapas da execução do Programa.

1.3 Sobre as Recomendações e Solicitações referentes à Auditoria Técnica Independente Acerca das Descaracterizações de Barragens no Complexo de Germano

Em 25 de fevereiro de 2022, a SAMARCO, o Ministério Público Federal — MPF, o Ministério Público Estadual — MPMG, o Estado de Minas Gerais através da SEMAD, a Fundação Estadual do Meio Ambiente — FEAM e a Agência Nacional de Mineração — ANM firmaram um Termo de Compromisso denominado “TC Descaracterização”, o qual previu a continuidade dos serviços de Auditoria Técnica Independente realizados pela AECOM, no âmbito dos projetos e obras associados ao programa de descaracterização das barragens alteadas a montante do Complexo do Germano, em Mariana.

Sinteticamente, o acompanhamento da AECOM integra ciclos anuais de Auditoria Técnica Independente que abrangem visitas técnicas realizadas nas barragens (inspeções de campo), sessões técnicas de acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e das obras (reuniões onde a Samarco apresenta, periodicamente, os avanços em estudos, projetos, monitoramentos), e reuniões técnicas específicas para avaliação e discussão das recomendações da auditoria (reuniões do CIGA). Trimestralmente, a AECOM emite um relatório consolidado com as análises da documentação disponibilizada pela Samarco, o seu posicionamento técnico, bem como a apresentação das recomendações da auditoria.

As recomendações apresentadas pela AECOM em seus relatórios trimestrais integram o Plano de Ação do TC da Descaracterização, sendo sistematicamente atualizados pela SAMARCO e disponibilizados para validação por parte da AECOM. Após a validação da AECOM os *status* das ações são revisados e novamente atualizados.

A atualização do Plano de Ação TC Descaracterização e os alinhamentos técnicos acerca das ações associadas ao atendimento das recomendações faz parte de uma rotina específica, de caráter mensal, que envolve uma grande equipe técnica da Samarco, englobando a área da geotecnia operacional, engenharia, planejamento, implantação e meio ambiente. Destaca-se que a Samarco, ao longo dos anos, atua com foco concentrado no atendimento das recomendações apresentadas no relatório de auditoria da AECOM, que é alvo de um fórum específico de discussões e reuniões, não fazendo parte das informações fornecidas no relatório trimestral.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



1.4 Público-alvo do Relatório

Este relatório tem como público-alvo a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Ministério Público Federal (MPF), além de toda a comunidade que poderá acessá-lo no portal da empresa na Internet, conforme compromisso assumido no Termo firmado.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DO GERMANO

Diante dos eventos ocorridos com barragens de mineração, as normativas relacionadas à segurança de barragens sofreram alterações que culminaram com a criação da Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº 2.784/2019, da Lei Federal 12.334/2010, da Lei Federal 14.066/2020 (que altera a Lei Federal 12.334/2010), da Lei Estadual 23.291/2019, do Decreto Estadual 48.140/2021 (que regulamenta dispositivos da Lei nº 23.291/2019), da Resolução ANM nº 95/2022, e da Resolução ANM nº 130/2022 (que altera a Resolução ANM nº 95/2022), entre outras. Tais normativas incluem obrigações e determinam que o empreendedor descaracterize todas as barragens construídas pelo método de alteamento a montante.

A segurança é um valor para a Samarco e o grande motivador deste programa. A Barragem do Germano é a maior estrutura construída pelo método de alteamento a montante na América Latina, com aproximadamente 129,6 milhões m³ de rejeitos e situada numa região de cabeceira de vales, encaixados com outras barragens de menor porte que também deverão passar pelo processo de descaracterização. A Cava do Germano possui volume aproximado de 13,1 milhões m³ de rejeitos arenosos atualmente depositados. Nenhuma das estruturas recebe disposição de rejeitos desde 2013 e 2015, respectivamente.

O programa considera um cronograma de aproximadamente 10 anos para a total e completa execução, contemplando todos os aspectos relevantes, como logística, disponibilidade de recursos, impactos ambientais e, o principal deles, a segurança, de forma a cumprir todos os requisitos ambientais e de estabilização de longo prazo. Neste sentido, a descaracterização do Germano prioriza qualidade, segurança e conformidade ambiental.

A descaracterização das estruturas demanda intervenções complexas e interfaces com as demais estruturas existentes na região, a saber, a execução simultânea de projetos de descaracterização de barragens por outras mineradoras. Esta complexidade é refletida na questão de limitação de recursos e de infraestrutura.

Em relação à logística, a Samarco tem preocupação com o tráfego na rodovia MG-129. Em função disso, o projeto considera o uso de sistema de transporte de correias de longa distância (TCLD) existente e de uma nova linha complementar de correias (implantação concluída em setembro de 2023), permitindo a redução do fluxo rodoviário na MG-129 e seus impactos, bem como a ampliação da produtividade. O aumento da produtividade atua em benefício da redução do prazo de conclusão da descaracterização definitiva das estruturas.

A etapa final do programa compreende atividades de recuperação vegetacional, a fim de mitigar impactos ambientais, como processos erosivos superficiais e emissões de particulados por arraste eólico.

A previsão é que as estruturas sejam descaracterizadas de forma antecipada ou dentro dos prazos previstos, considerando que o desempenho medido mantém a probabilidade de ocorrência em 90%, conforme apresentado a seguir.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



2.1 Descaracterização da Cava do Germano Conforme TC: 21/10/23 (ver cronograma detalhado da Cava na pasta “Anexo II”)

2.1.1 Etapa de Obras de Descaracterização (concluída)

- i. Plugagem da Galeria: Obras concluídas em 16/11/20 (ver atividade 5443A2245);
- ii. Remoção de Interferências: Obras concluídas em 21/05/21 (ver atividade 5443A2210);
- iii. Supressão Vegetal: Serviços concluídos em 22/04/22 (ver atividade 5443A2230);
- iv. Tamponamento do Túnel existente: Obras concluídas em 14/09/22 (ver atividade 5443A2355);
- v. Túnel-Bala sob a Ferrovia da VALE: Obras concluídas em 29/09/22 (ver atividades 5443A2365W para a linha 1 e 5443A2375W para a linha 2);
- vi. *Regrade*: Obras concluídas em 09/12/22 (ver atividade 5443A2740);
- vii. Berma de Reforço: Obras concluídas em 20/04/23 (ver atividade 5443A2415W);
- viii. Instrumentação: Instalações concluídas em 01/06/23 (ver atividade 5443A2395);
- ix. Canal Principal (do emboque até o Túnel-Bala da MG-129): Obras concluídas em 31/05/23 (ver atividades 5443A2445, 5443A2460W, 5443A2470 e 5443A2475);
- x. Drenagens Superficiais (ombreiras direita e esquerda + canaletas sobre a Berma): Obras concluídas em 01/06/23 (ver atividade 5443A2425);
- xi. Proteção Vegetal (ombreiras direita e esquerda + Berma): Serviços concluídos em 02/06/23 (ver atividade 5443A2420);

Nota: *Serviços e obras dos itens i até xi citados acima compõem o Marco de Descaracterização da Cava.*

- xii. Bacia do Chico (preenchimento da Bacia, Canal de Transposição e drenagens): Obras concluídas em 15/09/23 (ver atividades 5443A2305W, 5443A2315, 5443A2325 e 5443A2330);
- xiii. Sistema de Transporte de Estéril 11CV027: Obras concluídas em 15/09/23 (ver atividades 5443A2565, 5443A2570, 5443A2575, 5443A2580 e 5443A2755);
- xiv. Recuperação Estrutural e Tratamento Anti-Corrosivo (REC/TAC) dos TCLDs 11CV026/027: Serviços concluídos em 15/09/23 (ver atividades 5443A2625, 5443A2650, 5443A2655, 5443A2665W, 5443A2670 e 5443A2675);

Nota: *Serviços e obras dos itens xii até xiv citados acima não compõem o Marco de Descaracterização da Cava.*

- xv. Desmobilizações de Canteiros de Obras e de Apoio: Concluídas em 15/10/23.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



2.1.2 Etapa de Monitoramento Ativo (em andamento)

Processo de Descaracterização e Descadastramento da Cava do Germano

Em junho de 2023, a Samarco protocolou junto à FEAM o Relatório Técnico de Conclusão das Obras de Descaracterização da Cava do Germano — SMIN-G-OPC-RC0001 R-01, formalizando a comunicação de encerramento da etapa de obras de descaracterização desta estrutura, cumprindo todo o escopo previsto no projeto, inclusive a documentação pertinente, assim configurando sua completa execução.

Em razão disso, o Núcleo de Gestão de Barragens — NUBAR solicitou a apresentação de relatório técnico conforme o artigo 28 da Portaria FEAM nº 699, de 07 de junho de 2023, visando ao atendimento integral ao “TR de Elaboração de Relatório Técnico de Descadastramento de Barragem” disponibilizado pela referida entidade.

Desta forma, em agosto de 2023, a Samarco protocolou na FEAM o Relatório Técnico de Descadastramento da Cava do Germano — SMIN-G-OPC-RTDC-01, disponibilizado na pasta “Anexo III – Engenharia” – Anexo 3.5 do presente relatório, formalizando a solicitação de descaracterização e descadastramento da Cava do Germano no SIGIBAR, uma vez que todo o escopo previsto no projeto foi cumprido, inclusive a documentação pertinente, assim configurando sua completa execução.

Em janeiro de 2024, a Samarco recebeu três documentos da FEAM associados ao processo de Descaracterização da Cava do Germano, cuja conclusão já havia sido indicada em relatório específico para este fim, conforme segue:

- **Ofício FEAM/GBM nº 1/2024** de 04 de janeiro de 2024 sobre descadastramento e descaracterização do Empilhamento Drenado da Cava do Germano

Redação original:

“Em sua análise, por meio do Parecer de Descaracterização (75503582) e da Nota Técnica nº7 (78946602), a AECON concluiu que as obras de descaracterização foram 100% executadas e apresentou recomendações de correção e melhoria quanto ao monitoramento futuro da estrutura (...)

(...) considerando as constatações do Relatório de Vistoria nº289/2023, as manifestações da AECON e a documentação apresentada pela empresa, registramos que a estrutura Empilhamento Drenado Cava de Germano deixou de apresentar características de barramento e não se enquadra no conceito de barragem vigente, encontrando-se devidamente descaracterizada.”

- **Memorando FEAM/GBM nº 3/2024** de 04 de janeiro de 2024 sobre deferimento de descadastramento do Empilhamento Drenado da Cava do Germano

Redação original:

“(...) que seja realizado o deferimento da solicitação de descadastramento da estrutura no SIGIBAR e, havendo anuência institucional deste posicionamento, seja realizada

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



notificação à Unidade Regional de Regularização Ambiental - URA Central Metropolitana para acompanhamento dos controles ambientais da área remanescente no âmbito do processo licenciamento ambiental do empreendimento.”

- **Memorando FEAM/GBM nº 4/2024** de 04 de janeiro de 2024 ratificando o parecer de descadastramento e descaracterização do Empilhamento Drenado da Cava do Germano do Memorando FEAM/GBM nº 3/2024 de 04 de janeiro de 2024

Redação original:

“Diante do exposto, a estrutura foi retirada do cadastro da Feam, estando desobrigada de atender as determinações da Lei Estadual nº 23.291/2019, e do Decreto Estadual nº 48.140/2021, sendo o empreendedor comunicado dessa decisão por meio do Ofício FEAM/GBM nº 1/2024 (79941483).”

Em 02/06/2025, foi concluído o prazo da etapa do monitoramento ativo da estrutura, pelo período mínimo de 2 (dois) anos após a conclusão das etapas de descaracterização anteriores, conforme previsto na Resolução 130 — Artigo 2º da ANM. Contudo, é importante ressaltar que a Cava do Germano continua em monitoramento ativo até que o descadastramento da estrutura junto à ANM seja efetivado.

2.2 Descaracterização da Barragem do Germano, incluindo as estruturas associadas Dique Sela Tulipa e Dique Selinha, bem como a Barragem Eixo 1, Conforme TC: 08/05/29 (ver cronograma detalhado da Barragem na pasta “Anexo II”)

2.2.1 Etapa de Obras de Descaracterização (em andamento)

- Remoção de interferências: Obras concluídas em 21/08/20 (ver atividades 5442A1910 e 5442A1990);
- Supressão Vegetal: Serviços concluídos em 06/11/21 (ver atividade 5442A8870);
- Drenagem Passiva do Barramento Principal: Obras concluídas em 21/12/21 (ver atividades 5442A8860 e 5442A9570);
- Berma de Reforço do Barramento Principal: Obras concluídas em 10/08/22 (ver atividade 5442A5230W);
- Regrade* Etapa 2: Obras concluídas em 29/02/24 (ver atividades 5442A6370 e 5442A6390);
- Canal de Drenagem Principal: Obras da bacia final do canal e contenções dos taludes concluídas em 16/09/24 (ver atividades 5442A3560 e 5442A10130). Drenagens superficiais das bermas concluídas em 28/11/24 (ver atividade 5442A10550);
- Descaracterização do Dique Sela Tulipa: Obras 100% concluídas.
Jusante da estrutura: Obras da berma de reforço da estrutura concluídas em 10/10/24 (ver atividade 5442A6110). Drenagem superficial e proteção vegetal concluídas em 31/12/24.
Montante da estrutura: Obras do *Regrade* concluídas em 16/01/25. *Punch List* da drenagem

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



superficial e serviços de proteção vegetal finalizada em 15/02/25 (previsão de conclusão das obras no Termo de Compromisso em 06/03/25). Ver também Apêndice I;

- viii. Descaracterização do Dique Selinha: Obras 100% concluídas.
Preenchimento a montante da Barreira 3 / Seção AA (porção Vale do Fundão em Selinha) concluídas em 26/11/24 (ver atividade 5442A5970), berma de reforço da estrutura concluída em 22/12/24 (ver atividade 5442A6000), drenagem superficial (inclui pedra argamassada) e proteção vegetal concluídas em 31/12/24 (ver atividade 5442A6020). *Punch List* da drenagem superficial e serviços de proteção vegetal finalizada em 15/02/25 (previsão de conclusão das obras no Termo de Compromisso em 10/04/25). Ver também Apêndice II;
- ix. Descaracterização da Barragem Eixo 1: Obras 100% concluídas.
Preenchimento a montante do Eixo 1 e Barreira 4 (porção Vale do Fundão da Barragem Eixo 1) concluídas em 10/10/24 (ver atividade 5442A9240), ramal de drenagem subsuperficial principal concluído em 20/10/24 (ver atividade 5442A9510), ramais de drenagem subsuperficial secundários e canais das obreiras esquerda e direita concluídos em 26/11/24 (ver atividades 5442A8990 e 5442A6310), Eixo 1 concluído em 30/12/24 (ver atividade 5442A6260) e canais de drenagem superficial em pedra argamassada concluídos em 31/12/24 (ver atividade 5442A6290). *Punch List* da drenagem superficial e serviços de proteção vegetal finalizada em 15/02/25 (previsão de conclusão das obras no Termo de Compromisso em 03/06/25). Ver também Apêndice III;
- x. Drenagem do Barramento Principal: Obras em andamento. Previsão de conclusão em 16/09/25 (ver atividades 5442A5180 do canal da ombreira direita e 5442A10050 do canal da ombreira esquerda);
- xi. *Regrade* Etapa 3: Obras em andamento. Previsão em 08/05/29 (ver atividades 5442A6930, 5442A7440 e 5442A8830).
- xii. Desmobilizações de Canteiros de Obras e de Apoio: Previsão até 08/05/29.

Nota: *Em função dos avanços na implantação das obras do Regrade, a Samarco identificou potencial oportunidade de antecipação da conclusão do Programa de Descaracterização do Germano para 2026.*

2.2.2 Etapas de Monitoramento Ativo (em andamento)

Processo de Descaracterização: Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Barragem Eixo 1

Em janeiro de 2025, a Samarco protocolou junto à FEAM, através do ofício SAM-G-0029/2025, o Relatório Técnico de Descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha, bem como da Barragem Eixo 1 — G102400-G-1RT352_R02, disponibilizado na pasta “Anexo III – Engenharia” — Anexo 3.6 do presente relatório, formalizando a comunicação de término da etapa de obras de descaracterização e a solicitação de descaracterização destas estruturas no SIGIBAR, uma vez que todo o escopo previsto no projeto foi cumprido, inclusive a documentação pertinente, assim configurando sua completa execução.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Processo de Descadastramento da Barragem Eixo 1

Em janeiro de 2025, a Samarco protocolou junto à FEAM, através do ofício SAM-G-0010/2025, o Relatório Técnico de Descadastramento da Barragem Eixo 1 — G103600-G-1RT039_R02, disponibilizado na pasta “Anexo III – Engenharia” — Anexo 3.7 do presente relatório, formalizando a solicitação de descadastramento desta estrutura no SIGIBAR, uma vez que todo o escopo previsto no projeto foi cumprido, inclusive a documentação pertinente, assim configurando sua completa execução.

Monitoramento Ativo das Obras de Descaracterização Implantadas

O acompanhamento das obras de descaracterização dos diques de Sela, na fase corrente de Monitoramento Ativo, no primeiro trimestre de 2025, registra a continuidade do comportamento apresentado em períodos anteriores, com alguns dos instrumentos posicionados na área de abrangência dos maciços de contenção ainda acusando efeitos dos carregamentos associados às subidas dos aterros. Em particular, o dique Selinha, onde as variações associadas à sazonalidade climática sempre foram comparativamente mais patentes, apresenta picos temporários de nível de água resultantes da combinação do período de precipitações com o excesso de poro pressão causado pela fase final do carregamento que encerra a etapa de descaracterização. Em suma, os registros de leitura de variações do nível de água indicaram comportamento de queda ou estabilização, conforme previsto em projeto, e valores dentro dos limites estabelecidos na Carta de Risco (G102400-G-1RT394).

Alguns instrumentos de medição do nível de água, bastante úteis no monitoramento da etapa de implantação das obras, tiveram de ser desativados e novos instrumentos foram instalados conforme a configuração geométrica final dos reforços e após a implementação de novos acessos.

Em relação aos inclinômetros, posicionados nas estruturas ou nos perfis montante-jusante desde os eixos dos diques até a região dos aterros ano vale de Fundão, os registros de leitura indicaram variações pouco significativas, compatíveis com o comportamento padrão esperado pelo projeto, não indicando tendência de acelerações ou eventual formação de zona de cisalhamento.

A fase de Monitoramento Ativo integrante do processo completo de Descaracterização terá continuidade até que os limites de variação sazonal estejam completamente definidos e os excessos de poro pressão totalmente dissipados ao longo do tempo, até a caracterização da condição estacionária.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



2.3 Caracterização do Programa Descaracterização do Germano

Tabela 4: Caracterização do Programa Descaracterização do Germano

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DO GERMANO	
Patrocinadores	Vale e BHP
Diretor do Programa	Reuber Luiz Neves Koury – Samarco
Gerente Geral do Programa	Eduardo Moreira Rodrigues – Samarco
Auditoria Externa	AECOM – Serviços de Auditoria em atendimento ao Termo de Compromisso firmado em 25 de fevereiro de 2022 entre Samarco, Estado de MG (FEAM e SEMAD), ANM, MPMG e MPF.
Consultoria	ITRB – Junta de Consultores Independentes dos Sistemas de Rejeitos, conforme previsto no TAC.
Localização	Rodovia MG-129, Km 118,50 – Zona Rural de Mariana / MG. Distante aproximadamente 129 km de Belo Horizonte, a partir das rodovias BR-040 e BR-356.
Fase Atual	<u>Cava do Germano</u>: Monitoramento ativo em andamento. <u>Barragem do Germano</u>: Obras de descaracterização (<i>regrade</i>, serviços complementares de drenagens e proteção vegetal) em andamento. <u>Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Barragem Eixo 1</u>: Obras de descaracterização das estruturas concluídas. Em monitoramento ativo pós-obras.
Previsão de Término	<u>Cava do Germano</u>: Obras de descaracterização concluídas em 02/06/2023 e a <i>Punch List</i> em 15/08/2023. Prazo da etapa do monitoramento ativo da estrutura, pelo período mínimo de 2 (dois) anos, foi concluído em 02/06/2025. O monitoramento ativo será mantido até o descadastramento junto à ANM. <u>Barramento Principal, Reconformação do Reservatório e Sistema de Drenagem da Barragem do Germano</u>: Conforme cronograma e projeto apresentados aos órgãos competentes e Termo de Compromisso, com previsão de conclusão em 08/05/2029. <u>Dique Sela Tulipa</u>: Obras de descaracterização a jusante da estrutura concluídas em 10/10/2024, a montante em 16/01/25 e a <i>Punch List</i> em 15/02/2025. Em monitoramento ativo pós-obras. <u>Dique Selinha</u>: Obras de descaracterização concluídas em 31/12/2024 e a <i>Punch List</i> em 15/02/2025. Em monitoramento ativo pós-obras. <u>Barragem Eixo 1</u>: Obras de descaracterização concluídas em 30/12/2024 e a <i>Punch List</i> em 15/02/2025. Em monitoramento ativo pós-obras.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



3. IDENTIFICAÇÃO

3.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao Item 1.1 – Identificação, subitens I a VIII do Termo de Referência da FEAM.

As informações referentes à identificação das estruturas Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Barragem Eixo 1 estão contempladas, respectivamente, nos Apêndices I, II e III do presente relatório.

3.2 Nome da Barragem e da Mina, Conforme Bancos de Dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e da Agência Nacional de Mineração – ANM, Quando Couber (Item 1.1 – Subitem I do TR da FEAM)

Identificações das estruturas, conforme bancos de dados da Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM e da Agência Nacional de Mineração – ANM (tabelas 5 e 6).

Tabela 5: Identificação da Estrutura da Cava do Germano

Nome da Estrutura	Cava do Germano
Mina	Mina do Germano

Tabela 6: Identificação da Estrutura da Barragem do Germano

Nome da Estrutura	Barragem do Germano
Mina	Mina do Germano

3.3 Coordenadas Geográficas do Ponto Central da Barragem Antes do Início das Obras de Descaracterização, Referenciadas no Datum SIRGAS-2000 (Item 1.1 – Subitem II do TR da FEAM)

3.3.1 Cava do Germano

A Cava do Germano está situada na Mina do Germano, ou “Complexo do Germano”. As coordenadas geográficas da estrutura indicam o ponto central da crista da barragem, antes do início das obras de descaracterização, referenciadas no Datum SIRGAS-2000 do cadastro SIGBM, conforme a tabela 7.

Tabela 7: Coordenadas da Cava do Germano

Latitude	-20°11'41.300"
Longitude	-43°29'35.100"

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



3.3.2 Barragem do Germano

A Barragem do Germano está situada na Mina do Germano, ou “Complexo do Germano”. As coordenadas geográficas da estrutura indicam o ponto central da crista da barragem, antes do início das obras de descaracterização, referenciadas no Datum SIRGAS-2000 do cadastro SIGBM, conforme a tabela 8.

Tabela 8: Coordenadas da Barragem do Germano

Latitude	-20°12'59.400"
Longitude	-43°28'04.600"

O Complexo do Germano está localizado na porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero, na parte sul da Serra do Espinhaço, entre as serras do Caraça e de Antônio Pereira, nos municípios de Mariana e Ouro Preto, distritos de Santa Rita Durão (Mariana) e de Antônio Pereira (Ouro Preto), no estado de Minas Gerais. Está inserido nas sub-bacias dos rios Piracicaba e Piranga, pertencentes à bacia do Rio Doce.

Dista aproximadamente 20,0 km de Catas Altas e 129,0 km de Belo Horizonte, a capital do estado. Em linha reta, dista 23,0 km da área urbana de Ouro Preto, 24,0 km de Mariana, 32,0 km de Itabirito, 52,0 km de Belo Horizonte e 25,0 km de Santa Bárbara.

O acesso ao Complexo do Germano pode ser realizado a partir de Belo Horizonte, seguindo a BR-040 no sentido Rio de Janeiro até o trevo da Lagoa dos Ingleses. A partir daí, pela rodovia BR-356 até o município de Mariana, percorrendo 62,0 km até a área urbana da sede municipal.

Passando pela área urbana, seguindo até o entroncamento com a rodovia MG-129 (Rodovia Mariana – Samarco Mineração S.A.), tomando o rumo norte e percorrendo mais 30,0 km em direção ao município de Catas Altas, onde está localizada a portaria do Complexo do Germano. Da portaria, a Cava e a Barragem do Germano podem ser acessadas por vias internas.


A figura 1 apresenta o mapa com a localização do Complexo do Germano em Mariana, e a microrregião em relação a Belo Horizonte.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 1: Mapa de Localização do Complexo do Germano

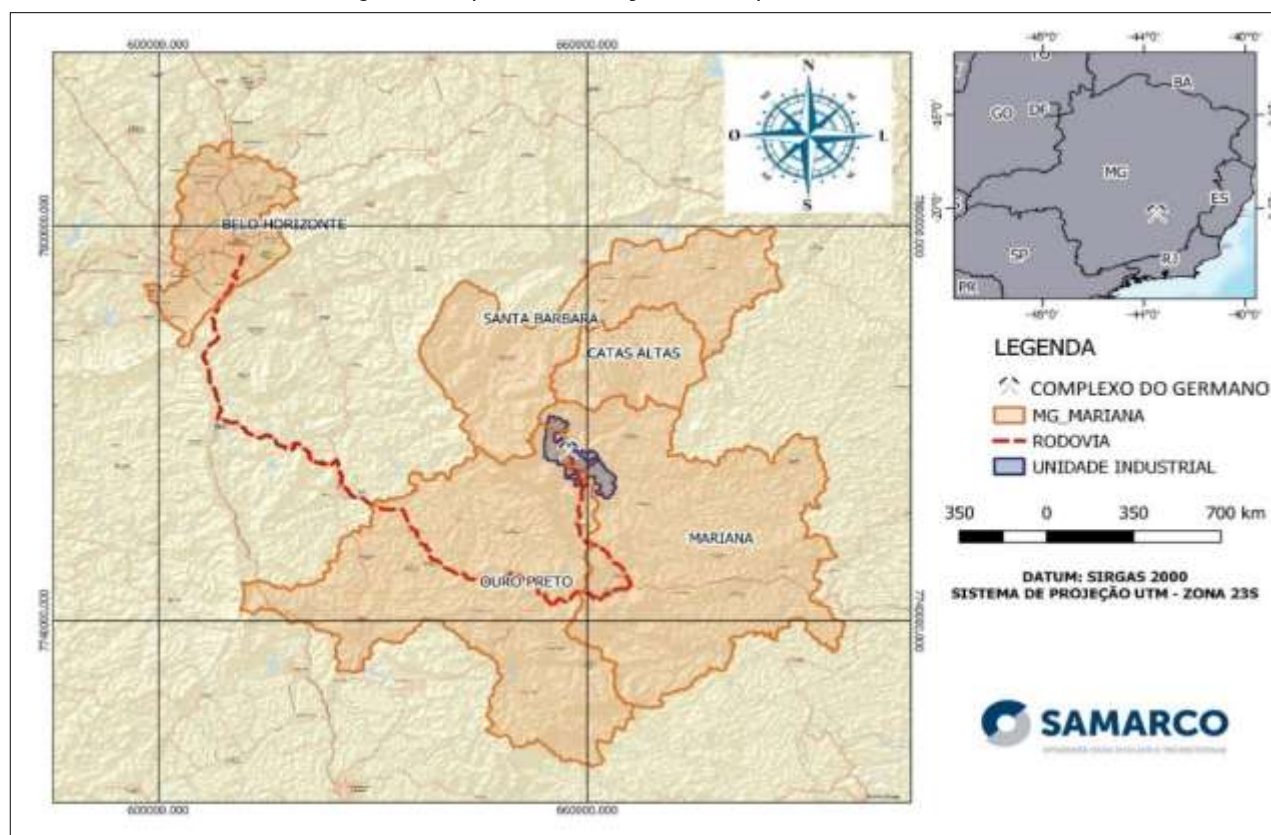

A figura 2 apresenta a localização das estruturas da Cava e Barragem (incluindo o Dique Sela Tulipa, o Dique Selinha e a Barragem Eixo 1) no Complexo do Germano.

Figura 2: Localização das Estruturas no Complexo do Germano



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



3.4 Matriz de Classificação, com Base nos Critérios Estabelecidos nos Anexos I a IV do Decreto 48.140, de 25 de Fevereiro de 2021 (Item 1.1 – Subitem III do TR da FEAM)

3.4.1 Cava do Germano (Histórico)

A matriz de classificação da Cava do Germano, apresentada na tabela 9, foi reavaliada pelas auditorias de inspeção, monitoramento da instrumentação e análise de segurança realizadas no período e mantida conforme a última avaliação realizada pela projetista BVP em 20/02/2024 (versão final) e aprovada em 18/03/2024, conforme a legislação pertinente (Decreto Estadual 48.140 de 25 de fevereiro de 2021).

Tabela 9: Matriz de Classificação da Cava do Germano (Versão Final)

Categoria de Risco - Resultado Da Avaliação: Baixo	
Resultado da Pontuação Total do CRI da Cava do Germano = 16 → Referência: CRI ≤ 37	
Potencial de Dano Ambiental - Resultado Da Avaliação: Alto	
Resultado da Pontuação Total do PDA da Cava do Germano = 24 → Referência: PDA ≥ 13	
Características Técnicas (CT) - Resultado Da Avaliação: $\sum CT = 16$	
Altura Atual (a)	51m máximo → 30m < Altura ≤ 60m (4)
Comprimento (b)	454m → 200 < Comprimento ≤ 600m (2)
Vazão de Projeto (c)	CMP (Cheia Máxima Provável) ou Decamilenar (0)
Método Construtivo (d)	Alteamento a montante ou desconhecido (10)
Auscultação (e)	Existe instrumentação de acordo com o projeto técnico (0)
Estado de Conservação (EC) - Resultado Da Avaliação: $\sum EC = 0$	
Confiabilidade das Estruturas Extravasoras (f)	Estruturas civis bem mantidas e em operação normal / barragem sem necessidade de estruturas extravasoras (0)
Percolação (g)	Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem (0)
Deformações e Recalques (h)	Não existem deformações e recalques com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (0)
Deterioração dos Taludes / Paramentos (i)	Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva (0)
Plano de Segurança da Barragem (PSB) - Resultado Da Avaliação: $\sum PS = 0$	
Documentação de Projeto (j)	Projeto executivo ou "como construído" (0)
Estrutura Organizacional e Qualificação dos Profissionais na Equipe de Seg.da Barragem (k)	Possui unidade administrativa com profissional técnico qualificado responsável pela segurança da barragem (0)
Manuais de Procedimentos para Inspeções de Segurança e Monitoramento (l)	Possui manuais de procedimentos para inspeção, monitoramento e operação (0)
Plano de Ação Emergencial - PAE (quando exigido pelo órgão fiscalizador) (m)	Possui PAE (0)
Relatórios de inspeção e monitoramento da instrumentação e de Análise de Segurança (n)	Emite regularmente relatórios de inspeção e monitoramento com base na instrumentação e de Análise de Segurança (0)
Potencial de Dano Ambiental (PDA) - Resultado Da Avaliação: $\sum PDA = 24$	
Volume Total do Reservatório (a)	13,1 milhões m ³ → Médio 5 milhões a 25 milhões m ³ (3)
Existência de população a jusante (b)	EXISTENTE (Existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem; portanto, vidas humanas poderão ser atingidas) (10)
Impacto ambiental (c)	SIGNIFICATIVO (Área afetada a jusante da barragem apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, excluídas APPs, e armazena apenas resíduos inertes (Classe II B segundo a NBR 10.004 da ABNT) (6)
Impacto socioeconômico (d)	MÉDIO (Existe alta concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância socioeconômica e cultural na área afetada a jusante da barragem) (5)
Enquadramento - Resultado Da Avaliação: Classe B	
Categoria de Risco	Baixo
Potencial de Dano Ambiental	Alto

Nota: A partir do 12º RT, o Relatório de Inspeção de Segurança Regular (RISR) versão ANM passou a ser disponibilizado na pasta "Anexo V – Geotecnia", considerando a descontinuidade da versão do documento destinado à FEAM em função do descadastramento da Cava do Germano junto à entidade.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



3.4.2 Barragem do Germano

A matriz de classificação da Barragem do Germano, apresentada na tabela 10, foi reavaliada pelas auditorias de inspeção, monitoramento da instrumentação e análise de segurança realizadas no período e mantida conforme a última avaliação realizada pela projetista BVP em 10/03/2025 e aprovada em 24/03/2025, em conformidade com a legislação pertinente (Decreto Estadual 48.140 de 25 de fevereiro de 2021).

Tabela 10: Matriz de Classificação da Barragem do Germano

Categoria de Risco - Resultado Da Avaliação: Baixo	
Resultado da Pontuação Total do CRI da Barragem do Germano = 20 → Referência: CRI ≤ 37	
Potencial de Dano Ambiental - Resultado Da Avaliação: Alto	
Resultado da Pontuação Total do PDA da Barragem do Germano = 26 → Referência: PDA ≥ 13	
Características Técnicas (CT) - Resultado Da Avaliação: $\sum CT = 20$	
Altura Atual (a)	163m máximo → Altura > 60m (7)
Comprimento (b)	650m → Comprimento > 600m (3)
Vazão de Projeto (c)	CMP (Cheia Máxima Provável) ou Decamilenar (0)
Método Construtivo (d)	Alteamento a montante ou desconhecido (10)
Auscultação (e)	Existe instrumentação de acordo com o projeto técnico (0)
Estado de Conservação (EC) - Resultado Da Avaliação: $\sum EC = 0$	
Confiabilidade das Estruturas Extravasoras (f)	Estruturas civis bem mantidas e em operação normal / barragem sem necessidade de estruturas extravasoras (0)
Percolação (g)	Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem (0)
Deformações e Recalques (h)	Não existem deformações e recalques com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (0)
Deterioração dos Taludes / Paramentos (i)	Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva (0)
Plano de Segurança da Barragem (PSB) - Resultado Da Avaliação: $\sum PS = 0$	
Documentação de Projeto (j)	Projeto executivo e "como construído" (0)
Estrutura Organizacional e Qualificação dos Profissionais na Equipe de Segurança da Barragem (k)	Possui unidade administrativa com profissional técnico qualificado responsável pela segurança da barragem (0)
Manuais de Procedimentos para Inspeções de Segurança e Monitoramento (l)	Possui manuais de procedimentos para inspeção, monitoramento e operação (0)
Plano de Ação Emergencial - PAE (quando exigido pelo órgão fiscalizador) (m)	Possui PAE (0)
Relatórios de inspeção e monitoramento da instrumentação e de Análise de Segurança (n)	Emite regularmente relatórios de inspeção e monitoramento com base na instrumentação e de Análise de Segurança (0)
Potencial de Dano Ambiental (PDA) - Resultado Da Avaliação: $\sum PDA = 26$	
Volume Total do Reservatório (a)	129,6 milhões m ³ → Muito Grande ≥ 50 milhões m ³ (5)
Existência de população a jusante (b)	EXISTENTE (Existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem; portanto, vidas humanas poderão ser atingidas) (10)
Impacto ambiental (c)	SIGNIFICATIVO (Área afetada a jusante da barragem apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, excluídas APPs, e armazena apenas resíduos inertes (Classe II B segundo a NBR 10.004 da ABNT) (6)
Impacto socioeconômico (d)	ALTO (Existe alta concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância socioeconômica e cultural na área afetada a jusante da barragem) (5)
Enquadramento - Resultado Da Avaliação: Classe B	
Categoria de Risco	Baixo
Potencial de Dano Ambiental	Alto

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



3.5 Identificação do Empreendimento com Respectiva Razão Social, CNPJ, Endereço, Nome e Telefone do Representante Legal para Contato (Item 1.1 – Subitem IV do TR da FEAM)

As estruturas da Cava e Barragem estão situadas na Mina do Germano, ou “Complexo do Germano”, pertencente à Samarco Mineração. A identificação de cada empreendimento, incluindo razão social, CNPJ, endereço, nome e telefone do representante legal para contato está apresentada nas tabelas 11 e 12.

Tabela 11: Identificação do Empreendimento – Cava do Germano

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	
Nome da estrutura	CAVA DO GERMANO (estrutura em monitoramento ativo)
Finalidade	A Cava Germano fica na área de antiga mina de minério de ferro, esgotada no final da década de 1990. Como parte dos esforços de recuperação da área, a Samarco desenvolveu planos para reaproveitar a Cava como instalação de armazenamento para o fluxo de rejeitos arenosos provenientes da concentração de minérios. A instalação de empilhamento de rejeitos drenados da Cava do Germano foi então construída em duas fases, desde o início dos anos 2000 a 2015. Este projeto foi descontinuado desde que o empilhamento drenado foi entendido como barragem de rejeitos alteada pelo método a montante e, portanto, passível de ser descaracterizada, conforme Lei Estadual 23.291 e Decreto Estadual 48.140, além de normas e regulamentações da ANM, em especial a Resolução nº 95 e, mais recentemente, a Resolução nº 130. As obras de descaracterização foram concluídas em junho de 2023 e a <i>Punch List</i> em agosto de 2023. Atualmente, a estrutura se encontra em fase de monitoramento ativo.
Empreendedor	Samarco Mineração S.A, Em Recuperação Judicial
CNPJ	16.628.281/0003-23
Endereço Mina do Germano	Rodovia MG-129 s/n, Zona Rural - Mariana / MG - CEP: 35420-970
Endereço Sede Administrativa	Ed. das Américas, Rua Paraíba, 1.122 - Andares 9º, 19º e 23º - Funcionários Belo Horizonte/MG CEP 30.130-141
Telefone Sede Administrativa	(31) 3559-5000
Diretoria	Gerência de Geotecnia
Complexo	Germano
Mina	Germano
Município	Mariana
Estado	Minas Gerais
Tipo de Minério	Ferro

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 12: Identificação do Empreendimento – Barragem do Germano

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	
Nome da estrutura	BARRAGEM PRINCIPAL DO GERMANO
Finalidade	O Barramento Principal teve por função a disposição dos rejeitos finos e arenosos provenientes do processo de beneficiamento do minério de ferro efetuado em duas usinas: a da Mina do Germano e a da Mina de Alegria. Possui estruturas associadas dentro do reservatório, Dique Auxiliar, Baía 3, Dique Sela Tulipa e Dique Selinha, projetados para aumentar a capacidade do reservatório da Barragem do Germano. Atualmente, as obras do <i>Regrade</i> no reservatório, os serviços complementares de drenagem superficial e a proteção vegetal estão em andamento (compõem a última etapa de obras de descaracterização da Barragem do Germano a ser concluída). Cabe destacar que as estruturas do Dique Sela Tulipa e Dique Selinha encontram-se em fase de monitoramento ativo.
Empreendedor	Samarco Mineração S.A, Em Recuperação Judicial
CNPJ	16.628.281/0003-23
Endereço Mina do Germano	Rodovia MG-129 s/n, Zona Rural - Mariana / MG - CEP: 35420-970
Endereço Sede Administrativa	Ed. das Américas, Rua Paraíba, 1.122 - Andares 9º, 19º e 23º - Funcionários Belo Horizonte/MG CEP 30.130-141
Telefone Sede Administrativa	(31) 3559-5000
Diretoria	Gerência de Geotecnia
Complexo	Germano
Mina	Germano
Município	Mariana
Estado	Minas Gerais
Tipo de Minério	Ferro

3.6 Identificação do Empreendedor com Respectiva Razão Social, CNPJ, Endereço, Nome e Telefone do Representante Legal para Contato (Item 1.1 – Subitem V do TR da FEAM)

Os dados com a identificação do empreendedor são apresentados na tabela 13.

Tabela 13: Identificação do Empreendedor

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR	
Razão Social	Samarco Mineração S.A, Em Recuperação Judicial
CNPJ	16.628.281/0003-23
Endereço Sede Administrativa	Rua Paraíba, 1.122 - Andares 9º, 19º e 23º - Funcionários Belo Horizonte/MG CEP 30.130-141
Endereço Mina do Germano	Rodovia MG-129 s/n, Zona Rural - Mariana/MG CEP 35.420-970
Representante legal	Rodrigo Alvarenga Vilela
Formação	Engenheiro Metalurgista
CREA	27157-D BA
Cargo	Diretor Presidente
Telefone	(31) 3269-8808 / (31) 3269-8787
E-mail	rodrigo.vilela@samarco.com

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



3.7 Identificação do Responsável Técnico pela Barragem, com Formação Profissional, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido, Endereço do Correio Eletrônico, e Telefone para Contato (Item 1.1 – Subitem VI do TR da FEAM)

A identificação do responsável técnico pela Cava e Barragem do Germano (incluindo os diques Sela Tulipa, Selinha e Eixo 1), sua formação, cargo, responsabilidades, nº de registro em conselho de classe e endereço do correio eletrônico são apresentados na tabela 14.

Tabela 14: Responsável Técnico pela Cava e Barragem do Germano

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE BARRAGEM DO EMPREENDEDOR	
Nome	Ernesto Tadeu Bossi
Formação	Engenheiro Civil
Cargo	Gerente Geral de Geotecnia
Responsabilidades	Gerente geral responsável pelas operações/estruturas geotécnicas do Complexo do Germano
CREA	87931/D MG
RNP	1400165911
Telefone	(31) 3269-8683
E-mail	ernesto.bossi@samarco.com

Obs.: A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com a atribuição do responsável consta na pasta “Anexo I – ARTs _Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

3.8 Identificação da Equipe Técnica Responsável pelos Projetos de Descaracterização (Nome Completo, Formação Acadêmica, Áreas sob Sua Responsabilidade no Estudo, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido). A Anotação de Responsabilidade Técnica Deverá Ser Apresentada no Anexo I (Item 1.1 – Subitem VII do TR da FEAM)

A identificação da equipe técnica, com nome completo, formação, áreas sob sua responsabilidade no estudo e nº do registro em conselho de classe são apresentados a seguir nas tabelas 15 (Projetistas) e 16 (Samarco).

Tabela 15: Equipe Técnica dos Projetistas Responsável Pelos Projetos de Descaracterização

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO - PROJETISTA STANTEC	
Razão social	Norwest Brasil Engenharia Ltda. (Stantec)
CNPJ	25.530.731/0001-70
Endereço	Av. do Contorno, 6594 - SI 701- Funcionários Belo Horizonte/MG - CEP 30.110-044
Registro CREA (Empresa)	55621-MG
Responsável Técnico - Projeto	Maurício Pinheiro de Souza
Formação	Engenheiro Civil, Mestre e Doutor em barragens
Responsabilidade no projeto	(1) Consultoria obras hidráulicas e recursos hídricos (2) Conformidade conclusão das obras da Cava do Germano (3) As built obras de descaracterização da Barragem do Germano (4) As built da berma do barramento principal da Barragem do Germano
CREA (Profissional)	MG0000248973/D – RNP 1419091026
ART Cava do Germano	(1) MG 20210104553 (2) MG 20242727668
ART Barragem do Germano	(1) MG 20210104643 (3) MG 20242727672 (4) MG 20242727676

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO - PROJETISTA BVP	
Razão social	BVP Engenharia e Projetos Ltda.
CNPJ	04.723.774/0001-00
Endereço	Rua Tomé de Souza 616 – Savassi Belo Horizonte/MG - CEP 30.140-131
Registro CREA (Empresa)	38070-MG
Responsável Técnico - Projeto	Paulo Roberto Costa Cella
Formação	Mestrado - EESC-USP Mestre em Engenharia - Área de Concentração: Geotecnia. Doutorado - E. Politécnica - USP: Doutor em Engenharia - Área de Concentração: Engenharia Mineral.
Responsabilidade no projeto	(1) Pareceres geológico-geotécnicos utilizados pela projetista Stantec para as análises de estabilidade da Cava do Germano. (2) Estruturas do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e Eixo 1. (3) Consultoria Geotécnica Barragem do Germano
CREA (Profissional)	06.0.0600697382 – RNP 2613925922
ART Cava e Barragem Germano	(1) 14201900000005153888 (2) MG20242931282
Responsável Técnico - Projeto	Thiago Borges Gomes Moreira
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade no projeto	(1) Elaboração de projeto de geotecnia e geologia da engenharia, pressões sobre os solos e resistência ao cisalhamento e estudos geotécnicos
CREA (Profissional)	MG0000107296D MG – RNP 1406417599
ART Cava e Barragem Germano	MG20253831203
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO - PROJETISTA JM SOUTO	
Razão social	JM Souto Engenharia e Consultoria Ltda.
CNPJ	70.951.686/0001-81
Endereço	Rua Aracaju, 196 - Conjunto 09 - Cidade Jardim Belo Horizonte/MG - CEP 30.380-020
Registro CREA (Empresa)	17046-MG
Responsável Técnico - Projeto	Marcelo Figueiredo da Silva Souto
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade no estudo	Consultoria, estudos/projetos hidrológicos túneis-bala.
CREA (Profissional)	MG0000090204D MG – RNP 1400495512
ART	14202000000005874443
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO - PROJETISTA VLB	
Razão social	VLB Engenharia Ltda.
CNPJ	70.952.106/0001-70
Endereço	Rua Paraíba, 889 - Andar 4 - SI 1 e 2 - Savassi Belo Horizonte/MG - CEP 30.130-145
Registro CREA (Empresa)	73366-MG
Responsável Técnico - Projeto	Jose Henrique Rodrigues Lopes
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade no estudo	(1) Viabilidade de contenção dos taludes da Cava do Germano e Relatório de Consolidação das Alternativas. (2) Projeto estrutural para dispositivos de drenagem superficial da Barragem do Germano e elaboração de projeto estrutural para tampa de uma canaleta existente na Barragem do Germano.
CREA (Profissional)	0400000012545MG – RNP 1404978801
ART	(1) MG20210712821 (2) MG20210135176

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO - PROJETISTA FCK	
Razão social	FCK Premoldados Ltda. (Vinculada ao Contrato da Aterpa)
CNPJ	29.315.419/0001-04
Endereço	Avenida Barão Homem de Melo, 3.382 - Sala 501 - Estoril Belo Horizonte/MG CEP 30.494-270
Registro CREA (Empresa)	NA
Responsável Técnico - Projeto	Jefferson Menezes Ramos
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade no estudo	Aduelas de concreto pré-moldados do canal de drenagem principal da Cava do Germano
CREA (Profissional)	MG 000213765/D – RNP 1416217053
ART	MG 20221220062

Obs.: As Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos de descaracterização da Cava e Barragem do Germano constam na pasta “Anexo I – ARTs_Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

Tabela 16: Equipe Técnica da Samarco Responsável Pelo Acompanhamento dos Projetos de Descaracterização

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO - SAMARCO	
Nome	Alexandre Ângelo do Carmo Luiz da Silva
Formação	Engenheiro Ambiental e Mestre em recursos hídricos
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos hidrológicos e hidráulicos.
CREA	MG0000174587/D – RNP 1412886864
Nome	Anelisa Vasconcelos
Formação	Engenheira Civil e Mestre em geotecnia
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos geotécnicos.
CREA	MG0000091141/D – RNP 1400665574
Nome	José Bernardo Vasconcelos Rodrigues Oliveira
Formação	Engenheiro Civil e Mestre em geotecnia
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos geotécnicos.
CREA	MG0000065519/D
Nome	Lucas Samuel Santos Brasil
Formação	Engenheiro Civil e Mestre em recursos hídricos
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos hidrológicos e hidráulicos.
CREA	MG0000 85104/D

3.9 Identificação da Equipe Técnica Responsável pela Execução e/ou Acompanhamento da Obra de Descaracterização (Nome Completo, Formação Acadêmica, Áreas sob Sua Responsabilidade no Estudo, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido). A Anotação de Responsabilidade Técnica Deverá Ser Apresentada no Anexo I (Item 1.1 – Subitem VIII do TR da FEAM)

A identificação da equipe técnica, com nome completo, formação, áreas sob sua responsabilidade no estudo e nº do registro em conselho de classe são apresentados nas tabelas 17 (Samarco), 18 (descaracterização da Cava do Germano), 19 (descaracterização da Barragem do Germano), 20 (sistemas de transporte de rejeito e estéril – TCLDs) e 21 (supressão vegetal e revegetação).

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 17: Responsável Técnico (Samarco) Pelas Obras de Descaracterização da Cava e Barragem do Germano

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO GERAL PELA EXECUÇÃO - SAMARCO	
Razão Social	Samarco Mineração S/A, em Recuperação Judicial
Responsável Técnico - Obra	Eduardo Moreira Rodrigues
Formação	Engenheiro Civil
Cargo	Gerente Geral de Projetos e Retomada (GGPR)
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Exec. de obra / serviços / mineração / pilha de estéril. (2) Complementar – Aditivo de prazo.
CREA	MG04.0.0000072262/D – RNP 1408981297
ART	(1) 14202000000006351149 (2) MG20232390149

Tabela 18: Responsáveis Técnicos (Contratadas) Pelas Obras de Descaracterização da Cava do Germano

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS CONTRATO 4300000065	
Razão social	MIP Engenharia Ltda.
CNPJ	33.193.996/0001-58
Endereço	Rodovia Anel Rodoviário s/n, km 3,8 - Palmeiras Belo Horizonte/MG CEP 30.575-716
Registro CREA (Empresa)	0000064334
Responsável Técnico - Obra	Weber de Oliveira
Formação	Engenheiro Mecânico
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obra mecânica de sistemas fluidodinâmicos de dutos industriais de líquidos e desmontagem de estruturas metálicas de edificação.
CREA	MG0000077889/D – RNP 1403083479
ART	(1) MG20210370011
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PLUGAGEM DA GALERIA CONTRATO 4300000007	
Razão social	Construtora G Maia S/A
CNPJ	053.46.072/0001-09
Endereço	Rua Olympio Teixeira Guimarães, 60 – Estoril Belo Horizonte/MG CEP 30.494-380
Registro CREA (Empresa)	30.467MG
Responsável Técnico - Obra	Rangel Elias Pinheiro
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Plugagem da galeria de drenagem da Cava do Germano para o projeto de descaracterização.
CREA	04.0.0000170043 – RNP 1412440114
ART	(1) 14202000000006154705
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA DESCARACTERIZAÇÃO ETAPA 1 CONTRATO 4300000466	
Razão social	Construtora Aterpa S/A
CNPJ	24.027.175/0001-50
Endereço	Rua Wilson Rocha Lima, 137 - SI 301A - Estoril Belo Horizonte/MG CEP 30.494-460
Registro CREA (Empresa)	0000036226MG
Responsável Técnico - Obra	André Pentagna Guimarães Salazar
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Obras civis de terraplenagem, execução de drenos e/ou tapetes drenantes, reaterros, sistema de drenagem superficial, proteção superficial, instrumentação geotécnica, ADME, forma, armação, concretagem e montagem eletromecânica das obras da Cava.
CREA	MG0000075908/D – RNP 1406141518
ART	(1) MG20210470805
Responsável Técnico - Obra	Antônio Francisco de Miranda
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Estabilidade de taludes e contenções - proteção de encosta por cortina atirantada, por solo grampeado, estruturas metálicas para andaimes, gerenciamento de riscos de projeto de ancoragem e trabalho em altura das obras das contenções 1, 3, 8 E 11CV027.
CREA	MG0000008708/D – RNP 1402951973
ART	(1) MG20210464594

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Responsável Técnico - Obra	Eduardo Vaz de O. Yatros
Formação	Engenheiro de Produção Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Estruturas de obra de arte de túnel bala em concreto de alto desempenho para as obras do sistema de drenagem em Germano.
CREA	MG0000144171/D – RNP 1410079988
ART	(1) MG20210493619
Responsável Técnico - Obra	Humberto Pires Terra Filho
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Obras civis de terraplenagem, execução de drenos e/ou tapetes drenantes, reaterros, sistema de drenagem superficial, proteção superficial, instrumentação geotécnica, ADME, forma, armação, concretagem e montagem eletromecânica das obras da Cava.
CREA	MG0000091928/D – RNP 1401036465
ART	(1) MG20210482034
Responsável Técnico - Obra	Júlio Pentagna Guimarães Salazar
Formação	Engenheiro de Produção Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Obras civis de terraplenagem, execução de drenos e/ou tapetes drenantes, reaterros, sistema de drenagem superficial, proteção superficial, instrumentação geotécnica, ADME, forma, armação, concretagem e montagem eletromecânica das obras da Cava.
CREA	MG0000123405/D – RNP 1408177927
ART	(1) MG20210476334
Responsável Técnico - Obra	Vladimir Henrique da Silva
Formação	Engenheiro de Produção Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Obras civis de terraplenagem, execução de drenos e/ou tapetes drenantes, reaterros, sistema de drenagem superficial, proteção superficial, instrumentação geotécnica, ADME, forma, armação, concretagem e montagem eletromecânica das obras da Cava.
CREA	MG0000108290/D – RNP 1405324384
ART	(1) MG20210472056
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA DESCARACTERIZAÇÃO ETAPA 2	
CONTRATO 4300000630	
Razão social	Consórcio Ápia-EXE
CNPJ	45.908.477/0001-08
Endereço	Rua Tito Simões, 99 - Pilar Belo Horizonte/MG CEP 30.390-100
Registro CREA (Empresa)	1136321MG
Responsável Técnico - Obra	Bruno Botelho Braga
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem para obras civis: canal para o <i>Regrade</i> da Barragem Etapa 2).
CREA	MG0000074414/D – RNP 1402714076
ART	(1) MG20221221739
Responsável Técnico - Obra	Eduardo Menin Ferreira
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal - Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem para obras civis: canal para o <i>Regrade</i> da Cava Etapa 2).
CREA	0400000048207MG – RNP 1403794510
ART	(1) MG20221219889
Responsável Técnico - Obra	Flávio Agostinho Costa
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem para obras civis: canal para o <i>Regrade</i> da Barragem Etapa 2).
CREA	MG0000066040/D – RNP 1405918969
ART	(1) MG20221303474
Responsável Técnico - Obra	Paulo Thiago Puga Miranda
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem para obras civis: canal para o <i>Regrade</i> da Barragem Etapa 2).
CREA	MG0000234117/D – RNP 1417914564
ART	(1) MG20221308626

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 19: Responsáveis Técnicos (Contratadas) Pelas Obras de Descaracterização da Barragem do Germano

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS	
CONTRATO 4300000491	
Razão social	Engelig Montagem e Manutenção Elétrica Ltda.
CNPJ	05.484.048/0001-36
Endereço	Rua José Vicente de Souza, 440 - São Cristóvão - Mariana/MG CEP 35.420-000
Registro CREA (Empresa)	12967MG e 30738NAC
Responsável Técnico - Obra	Lucas Henrique de Lima
Formação	Engenheiro Industrial-Elétrica
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Execução de montagem eletrotécnica, instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de energia elétrica de microgeração distribuída e telecomunicações para as obras de remoção de interferências.
CREA	MG0000131835/D – RNP 1408981297
ART	(1) MG20210438895
Responsável Técnico - Obra	Vinicius Rosa Sette
Formação	Engenheiro Eletricista
Responsabilidade na Obra	(1) Execução obra / serviço geração, transmissão e utilização de energia elétrica, sistema de distribuição de energia elétrica para a construção de rede elétrica para a alimentação das válvulas motorizadas do <i>tie-in</i> da linha do Glaxo-Brumal.
CREA	04.0.000096044 – RNP 1404400729
ART	(1) 142020000000006220691
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA DRENAGEM PASSIVA	
CONTRATO 4300000003	
Razão social	Salum Construções Ltda.
CNPJ	19.739.564/0006-83
Endereço	Av. Nossa Senhora do Carmo, 673 - Apt. 02 - Vila do Carmo - Mariana/MG CEP 35.420-000
Registro CREA (Empresa)	0000043431MG
Responsável Técnico - Obra	Antônio Eduardo Ayres Carneiro de Souza
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) 7º TAC – Alteração de prazo das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva.
CREA	MG0000074179/D – RNP 1402850280
ART	(1) MG20220837832
Responsável Técnico - Obra	Caio Márcio Salum
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) 7º TAC – Alteração de prazo das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva.
CREA	MG0000016469/D – RNP 1405961082
ART	(1) MG20220837714
Responsável Técnico - Obra	Carlos Eduardo Kehdi Nascentes Coelho
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva do barramento principal. (2) 1º TAC – Prazo e valor das obras civis e injeção de colunas de <i>jet grouting</i> para reforço de fundação. (3) 2º TAC – Alteração de prazo das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva. (4) 4º TAC – Alteração de prazo-valor das obras de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva.
CREA	MG0000075127/D – RNP 1406753157
ART	(1) 142020000000006165649 (Principal), (2) 142020000000006174652, (3) MG20210069317 e (4) MG20210320519
Responsável Técnico - Obra	Carolina Mariana Cantão Dias
Formação	Engenheira Civil
Responsabilidade na Obra	(1) 7º TAC – Alteração de prazo das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva.
CREA	MG0000183456/D – RNP 1413609546
ART	(1) MG20220837955

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Responsável Técnico - Obra	Jorge Salum
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) 7º TAC – Alteração de prazo das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva.
CREA	MG0000025204/D – RNP 1406100960
ART	(1) MG20220837733
Responsável Técnico - Obra	José Eustáquio Rezende Pereira
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) 1º TAC – Prazo e valor das obras civis e injeção de colunas de <i>jet grouting</i> para reforço de fundação. (2) 2º TAC – Alteração de prazo das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva. (3) 4º TAC – Alteração de prazo-valor das obras de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva.
CREA	MG0000078113/D – RNP 1403837589
ART	(1) 14202000000006174665, (2) MG20210069270 e (3) MG20210320535
Responsável Técnico - Obra	Júlio Dutra de Oliveira
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva do barramento principal. (2) 4º TAC – Alteração de prazo-valor das obras de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva. (3) 7º TAC – Alteração de prazo das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva.
CREA	MG0000042856/D – RNP 1404352511
ART	(1) MG20210120587, (2) MG20210320380 e (3) MG20220837864
Responsável Técnico - Obra	Marco Antônio Beltrão Bueno
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) 7º TAC – Alteração de prazo das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva.
CREA	MG0000044122/D – RNP 1403837538
ART	(1) MG20220837783
Responsável Técnico - Obra	Marcus Vinicius Salum
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva do barramento principal. (2) 1º TAC – Prazo e valor das obras civis e injeção de colunas de <i>jet grouting</i> para reforço de fundação. (3) 2º TAC – Alteração de prazo das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva. (4) 4º TAC – Alteração de prazo-valor das obras de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva. (5) 7º TAC – Alteração de prazo das obras civis de terraplenagem e estruturas de concreto armado da drenagem passiva.
CREA	MG0000023135/D – RNP 1404522719
ART	(1) 14202000000005913435 (Principal), (2) 14202000000006174621, (3) MG20210069165, (4) MG20210320434 e (5) MG20210837757
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA DESCARACTERIZAÇÃO – 2ª FASE (REFORÇO DA BARRAGEM PRINCIPAL, CANAL PRINCIPAL E REGRADE ETAPA 1) CONTRATO 4300000106	
Razão social	Consórcio MRF
CNPJ	32.909.546/0001-56
Endereço	Rua Nossa Senhora de Lourdes, 262 - SI 01 - Olhos D'Água Belo Horizonte/MG CEP 30.390-530
Registro CREA (Empresa)	49483MG e 81683NAC
Responsável Técnico - Obra	Antônio Carlos Pereira Vieira Júnior
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1. (2) 6º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1. (3) 7º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1. (4) 8º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



CREA	0400000087976 – RNP 1400173396
ART	(1) 14202000000006246690, (2) MG20221358028, (3) MG20231818982 e (4) MG20231844108
Responsável Técnico - Concreto	Luiza Borges Dias
Formação	Engenheira Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Materiais de construção civil – dosagem e mistura de concreto para as obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1.
CREA	MG0000217823/D – RNP 1416548645
ART	(1) MG20210811683
Responsável Técnico - Obra	Marcus Veloso da Silveira Cassini
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1. (2) 6º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1. (3) 7º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1. (4) 7º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1.
CREA	0400000080345 – RNP 1403250111
ART	(1) 14202000000006246637, (2) MG20221357994, (3) MG20231818845 e (4) MG20231844030
Responsável Técnico - Obra	Renã Alcântara Lara
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal - Execução das obras civis do reforço do barramento principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1. (2) Gerenciamento de aspecto ambiental para a implantação da central móvel de concreto de canteiro.
CREA	0400000072142/D – RNP 1403884650
ART	(1) 14202000000006241956 (Principal) (2) MG20210373739
Responsável Técnico - Obra	William Perdigão Frade
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de estruturas de concreto armado, abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem, obras hidráulicas, diques barragem de terra-enrocamento e canais das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1. (2) TAC - Obras de descaracterização da Barragem do Germano 2ª fase, berma de reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, extravasor do eixo 1, canal drenagem principal e <i>Regrade</i> etapa 1.
CREA	MG0000064857/D – RNP 1409140350
ART	(1) MG20210813361 (2) MG20231843558
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DESCARACTERIZAÇÃO – 2ª FASE (REFORÇO DA BARRAGEM PRINCIPAL, CANAL PRINCIPAL E REGRADE ETAPA 1) CONTRATO 4300000106 (CONTINUAÇÃO)	
Razão social	Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S/A (Vinculada ao contrato do Consórcio MRF)
CNPJ	02.229.411/0022-03
Endereço	Avenida Percio Perfeito s/n - Quadra 2, Lote 01 a 03 - Distrito Industrial Araguari/MG CEP 38.446-394
Registro CREA (Empresa)	1988MG
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA DESCARACTERIZAÇÃO – 2ª FASE (REGRADE ETAPAS 2 E 3) - CONTRATO 4300000630	
Razão social	Consórcio Ápia-EXE
CNPJ	45.908.477/0001-08
Endereço	Rua Tito Simões, 99 - Pilar Belo Horizonte/MG CEP 30.390-100
Registro CREA (Empresa)	1136321MG

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Responsável Técnico - Obra	Bruno Botelho Braga
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem para obras civis: canal para o <i>Regrade</i> da Barragem Etapa 2).
CREA	MG0000074414/D – RNP 1402714076
ART	(1) MG20221221739
Responsável Técnico - Obra	Eduardo Menin Ferreira
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal - Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem para obras civis: canal) para o <i>Regrade</i> da Barragem Etapa 2.
CREA	040000004820MG – RNP 1403794510
ART	(1) MG20221219889
Responsável Técnico - Obra	Flávio Agostinho Costa
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem para obras civis: canal para o <i>Regrade</i> da Barragem Etapa 2).
CREA	MG0000066040/D – RNP 1405918969
ART	(1) MG20221303474
Responsável Técnico - Obra	Paulo Thiago Puga Miranda
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem para obras civis: canal para o <i>Regrade</i> da Barragem Etapa 2).
CREA	(1) MG0000234117/D – RNP 1417914564
ART	MG20221308626
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA DESCARACTERIZAÇÃO – 2ª FASE (REGRADE ETAPA 3) - CONTRATO 4300001308	
Razão social	Construtora Apia S/A
CNPJ	17.155.391/0001-16
Endereço	Rua Tito Simões, 99 - Pilar Belo Horizonte/MG CEP 30.390-100
Registro CREA (Empresa)	36141-MG
Responsável Técnico - Obra	Eduardo Menin Ferreira
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), de obras de concreto armado, de concretagens, de obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem) para obras civis do <i>Regrade</i> da superfície do reservatório da Barragem.
CREA	0400000048207MG– 1403794510
ART	(1) MG20253617797
Responsável Técnico - Obra	Odilon Aparecido Henriques
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), de obras de concreto armado, de concretagens, de obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem) para obras civis do <i>Regrade</i> da superfície do reservatório da Barragem.
CREA	MG0000092342D MG – 1401541534
ART	(1) MG20253627745
Responsável Técnico - Obra	Pedro Nunes Lopes
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), de obras de concreto armado, de concretagens, de obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem) para obras civis do <i>Regrade</i> da superfície do reservatório da Barragem.
CREA	MG0000163673D MG – 1411860837
ART	(1) MG20243574738

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 20: Responsáveis Técnicos (Contratadas) Pelas Obras do Sistema de Transporte de Rejeito e Estéril

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO REC/TAC DOS TCLDS 11CV026 E 11CV027 CONTRATO 4300000659	
Razão social	Real Estruturas e Construções Ltda.
CNPJ	02.265.872/0001-07
Endereço	Rua Costa Capanema, 638 - Jardim Industrial Contagem/MG CEP 32.215-300
Registro CREA (Empresa)	0000002130MG
Responsável Técnico - Obra	Daniel Moraes Belém
Formação	Engenheiro de Produção Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Estruturas metálicas contemplando serviços de montagem e desmontagem de equipamentos e peças estruturais para recuperação estrutural (REC), tratamento anticorrosivo (TAC) e serviços de montagem eletromecânica para recuperação de transportadores nas áreas do complexo industrial do Germano.
CREA	MG0000174790/D MG – RNP 1412900026
ART	(1) MG20221249963
Responsável Técnico - Obra	Domingos José Couto Pinto
Formação	Engenheiro Eletricista
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Controle e automação – sistemas e processos de produção e fabricação – sistemas de controle e automação da produção ou fabricação. Serv. montagem e desmontagem de equipamentos e peças estruturais para recuperação estrutural (REC), tratamento anticorrosivo (TAC) e serv. montagem eletromecânica para recuperação de transportadores nas áreas da unidade da do complexo industrial do Germano.
CREA	MG0000006181/D MG – RNP 1403592071
ART	(1) MG20221250230
Responsável Técnico - Obra	Oswaldo Luiz Chiabi de Queiroz
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Estruturas metálicas contemplando serv. de montagem e desmontagem de equipamentos e peças estruturais para recuperação estrutural (REC), tratamento anticorrosivo (TAC) e serv. de montagem eletromecânica para recuperação de transportadores nas áreas da unidade da do complexo industrial do Germano.
CREA	DF0000005294/D MG – RNP 0703564927
ART	(1) MG20221250032
Responsável Técnico - Obra	Saulo Versiani Chiabi de Queiroz
Formação	Engenheiro Mecânico
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Estruturas metálicas contemplando serv. de montagem e desmontagem de equipamentos e peças estruturais para recuperação estrutural (REC), tratamento anticorrosivo (TAC) e serv. de montagem eletromecânica para recuperação de transportadores nas áreas da unidade da do complexo industrial do Germano.
CREA	MG0000209476/D MG – RNP 1415860769
ART	(1) MG20221250284
Responsável Técnico - Obra	Theodoro Holtz Filho
Formação	Engenheiro de Produção
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Estruturas metálicas contemplando serv. de montagem e desmontagem de equipamentos e peças estruturais para recuperação estrutural (REC), tratamento anticorrosivo (TAC) e serv. de montagem eletromecânica para recuperação de transportadores nas áreas da unidade da do complexo industrial do Germano.
CREA	MG0000156182/D MG – RNP 1402402996
ART	(1) 20221250147

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REDE DE ALTA TENSÃO DOS TCLDS CONTRATO 4300000518	
Razão social	Engelig Montagem e Manutenção Elétrica Ltda.
CNPJ	05.484.048/0001-36
Endereço	Rua José Vicente de Souza, 440 - São Cristóvão Mariana/MG CEP 35.420-000
Registro CREA (Empresa)	12967MG e 30738NAC
Responsável Técnico - Obra	Lucas Henrique de Lima
Formação	Engenheiro Industrial-Elétrica
Responsabilidade na Obra	(1) Principal - Execução de instalação de rede de distribuição de energia elétrica, trifásica, 13,8kV, para alimentação elétrica do sistema de manuseio da descaracterização do Germano. (2) Execução de instalação de rede de distribuição de energia elétrica, trifásica, 13,8kV, para alimentação elétrica do sistema de manuseio da descaracterização do Germano. (3) Execução de instalação de rede de distribuição de energia elétrica, trifásica, 13,8kV, para alimentação elétrica do sistema de manuseio da descaracterização do Germano.
CREA	MG0000131835/D – RNP 1408981297
ART	(1) MG20210766799, (2) MG20221476465 e (3) MG20231819514
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS ELETROCENTROS DOS TCLDS CONTRATO 4300000701	
Razão social	Tecnexus Soluções Ltda.
CNPJ	07.550.669/0001-04
Endereço	Rua Poços de Caldas, 248 - Parque Turistas Contagem/MG CEP 32.110-380
Registro CREA (Empresa)	17724-MG
Responsável Técnico - Obra	Marco Antônio Rodrigues
Formação	Engenheiro Eletricista
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Serviços e materiais para integração dos sistemas especiais dos novos eletrocentros e adequação dos pontos do <i>backbone</i> existentes em Germano.
CREA	MG0000067343/D – RNP 1410428761
ART	(1) MG20231819514
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS OBRAS DE CONTENÇÕES E PROTEÇÕES DE TALUDES CONTRATO 4300000764	
Razão social	Progeo Engenharia Ltda.
CNPJ	17.069.832/0001-67
Endereço	Rua Maria Beatriz, 998 - Havaí Belo Horizonte/MG CEP 30.555-140
Registro CREA (Empresa)	35941-MG
Responsável Técnico - Obra	Antônio Francisco de Miranda
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Inicial – Estabilidade de taludes e contenções, proteção de encostas – cortina atirantada em Germano. (2) 1º TAC – Estabilidade de taludes e contenções, proteção de encostas – cortina atirantada em Germano. (3) 2º TAC – Estabilidade de taludes e contenções, proteção de encostas – cortina atirantada em Germano.
CREA	MG0000008708/D – RNP 1402951973
ART	(1) MG20221648378, (2) MG20231832883 e (3) MG20232169021

Tabela 21: Responsáveis Técnicos pela Supressão Vegetal e Revegetação nas Áreas da Cava e Barragem

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA / RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA SUPRESSÃO VEGETAL CONTRATO 4300000372	
Razão social	JM Reflorestamentos e Serviços Ltda.
CNPJ	08.011.784/0001-65
Endereço	Rua Joaquim Pacífico, 120 – Centro Santa Barbara/MG CEP 35.960-000
Registro CREA (Empresa)	19252-MG

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Responsável Técnico - Obra	César Simões Soares
Formação	Engenheiro Florestal
Responsabilidade na Obra	(1) Coordenação atividades supressão vegetal da descaracterização. (2) Execução atividades supressão vegetal da descaracterização / adequação ambiental. (3) Execução atividades supressão vegetal AIA2100.01.0009415/2021-44 / desmatamento ambiental. (4) Coordenação atividades supressão vegetal da descaracterização / adequação ambiental. (5) Aditivo ref. execução atividades supressão vegetal AIA2100.01.0009415/2021-44 / desmatamento ambiental
CREA	MG0000108032/D – RNP 1406493775
ART	(1) MG20210134518, (2) MG20210301627, (3) MG20210323847, (4) MG20231784201 e (5) MG20232205416
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA / RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REVEGETAÇÃO CONTRATO 4300000880	
Razão social	JM Reflorestamentos e Serviços Ltda.
CNPJ	08.011.784/0001-65
Endereço	Rua Joaquim Pacífico, 120 – Centro Santa Barbara/MG CEP 35.960-000
Registro CREA (Empresa)	19252-MG
Responsável Técnico - Obra	César Simões Soares
Formação	Engenheiro Florestal
Responsabilidade na Obra	(1) Gestão ambiental para a revegetação de Sela Tulipa.
CREA	MG0000108032/D – RNP 1406493775
ART	(1) MG20243540839
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA / RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REVEGETAÇÃO CONTRATO 4600003441	
Razão social	GHB Revegetação Ambiental Ltda. ME
CNPJ	13.995.447/0001-90
Endereço	Rodovia BR 482, 1516, Gigante Conselheiro Lafaiete/MG CEP 36.402-115
Registro CREA (Empresa)	31614-MG
Responsável Técnico - Obra	Eugênio Geraldo de Castro
Formação	Engenheiro Agrônomo
Responsabilidade na Obra	Serviços de recomposição vegetal.
CREA	40773MG
ART	MG20232295594

Obs.: As Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos profissionais responsáveis técnicos envolvidos na execução das obras de descaracterização, bem como pelos serviços de supressão vegetal e de revegetação nas obras de descaracterização da Cava e Barragem do Germano constam na pasta “Anexo I – ARTs _Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



4. PROJETO DE DESCARACTERIZAÇÃO

4.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao Item 1.2 – Projeto de Descaracterização, subitens I a IV do Termo de Referência da FEAM.

As informações referentes aos projetos de descaracterização das estruturas Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Barragem Eixo 1 estão contempladas, respectivamente, nos Apêndices I, II e III do presente relatório.

4.2 Descrever Sucintamente a Concepção do Projeto Adotada para Descaracterização da Barragem (Item 1.2 – Subitem I do TR)

Os projetos de descaracterização da Cava do Germano e da Barragem do Germano foram desenvolvidos em atendimento à Lei Estadual nº 23.291, publicada em fevereiro de 2019 e abrangem, além dessas estruturas, Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Barragem Eixo 1.

A projetista STANTEC desenvolveu os projetos de descaracterização da Cava do Germano e da berma de reforço da Barragem do Germano. A projetista BVP desenvolveu os projetos da reconformação superficial (*regrade*) sobre o reservatório da Barragem do Germano, bem como os projetos associados à descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha, e da Barragem Eixo 1.

Os projetos de descaracterização mencionados visam à estabilidade geotécnica das estruturas e à adoção de medidas para reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais e subterrâneas para o reservatório no longo prazo.

Considerando a estabilidade geotécnica de longo prazo, foi prevista a implantação de bermas de reforço nos taludes de jusante das estruturas da Cava e Barragem do Germano. Os projetos de descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha preveem o preenchimento do Vale do Fundão e o reforço dos taludes de jusante destas estruturas. O reforço nos referidos diques apresenta como estrutura de partida a região a montante da Barragem Eixo 1 adequadamente preenchida.

Como referência, os volumes das bermas de reforço da Cava do Germano (concluídas em abril de 2023) e do barramento principal da Barragem do Germano (concluído em agosto de 2022) são 410.582 m³ e 205.557 m³, respectivamente. O volume previsto no reforço dos diques Sela Tulipa e Selinha é da ordem de 7 milhões m³, incluindo o Vale do Fundão, cuja conclusão das obras ocorreu antecipadamente no final de 2024 / início de 2025, e a *Punch List* em fevereiro de 2025.

Em relação à passagem de cheias, também visando ao longo prazo, o projeto de reconformação dos reservatórios da Cava e Barragem do Germano considera a implantação de sistema de canais de drenagem na superfície final destas estruturas, com a função de conduzir os fluxos captados nas bacias de contribuição e eliminar a formação de lago permanente. A reconformação da superfície final dos reservatórios apresenta

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



inclinações especificamente projetadas para conduzir os efluentes até os canais de drenagem, o que reduz o processo de infiltração para o interior dos depósitos. Como referência, o volume de reconformação da superfície é da ordem de 13 milhões m³.

Cumprir informar que os reservatórios da Cava e da Barragem do Germano foram implantados no passado em bacias de cabeceira situadas em altas porções do terreno. Devido a este posicionamento topográfico, as contribuições decorrentes da precipitação direta sobre as respectivas bacias hidrológicas convergem para o interior desses reservatórios. Adicionalmente, não é possível efetuar o desvio desses fluxos e lançá-los em vales adjacentes, pois há divisores de água que impedem a transposição de vazões, uma vez que os vales do Brumado e da Natividade, adjacentes à Cava do Germano e à Barragem do Germano, não são de propriedade da Samarco.

4.3 Informar Todas as Alterações de Projetos Ocorridas no Período de Avaliação do Relatório de Acompanhamento, com Respectivas Justificativas (Item 1.2 – Subitem II do TR)

A Samarco possui procedimento específico – Nota de Alteração de Projeto (NAP) – para registrar alterações de projeto, permitindo o arquivamento de informações sobre as obras de forma detalhada e estruturada.

O processo de registro das modificações de projeto envolve as seguintes equipes da Samarco: Engenharia (que formaliza a consulta técnica à Projetista), Planejamento, Fiscalização, Arquivo Técnico, Gerência/Coordenação de Obras e a Contratada.

Resumidamente, durante a execução das obras pode ser identificada a necessidade de promover algum ajuste, ou mesmo melhoria nos projetos e/ou nos métodos executivos. As sugestões de modificações, ou mesmo questionamentos técnicos, são apresentados pela Contratada ou pela própria Gerência/Coordenação de Obras. As sugestões ou solicitações de alterações nos projetos são encaminhadas formalmente à Projetista, em documento de Consulta Técnica.

As alterações sugeridas não podem modificar as premissas e não podem gerar impactos significativos no Capex e no cronograma do projeto. Para o devido registro da NAP é utilizado um formulário específico incluindo, entre outros dados, o local, a disciplina, o solicitante, a empresa executante do serviço, o tipo da mudança, a prioridade de execução, desenhos de referência ou croquis, a descrição do problema, a solução proposta com informações completas sobre a alteração de projeto, os detalhes técnicos relevantes, comentários e/ou observações da Engenharia e/ou da Projetista, além dos responsáveis pela aprovação da NAP.

As NAPs com os respectivos registros e/ou modificações em projetos no período constam na pasta “Anexo III – Engenharia” do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 3: NAPs de Projetos no Período

	430655-G-TRA-NA0018_R-00
	430825-G-CAR-NA0003_R-04
	431308-G-API-NA0001_R-02

4.3.1 Este item é mantido como histórico no relatório, destinado a atender à Recomendação 1 da Nota Técnica de 15/12/2023 (reiterando a Recomendação 1 da Nota Técnica de 10/10/2023), incluindo registros de todas as informações relevantes.

Na Nota Técnica emitida pela AECOM em 10/10/2023, Ofício FEAM/GBM nº 1037/2023, foi apresentada a seguinte recomendação, com prioridade de atendimento “normal” (reiterada na Nota Técnica de 15/12/2023):

Figura 4: Recomendação 1 – Notas Técnicas de 10/10/2023 e 15/12/2023 da AECOM

Nº	Recomendação	G	U	T	I	TC	Prioridade
01	Incluir a lista de projetos revisados e aprovados em função das adequações de campo e/ou revisões de projeto, bem como a descrição sucinta da alteração, como por exemplo notas de alteração de projeto com suas devidas aprovações. Foram identificadas NAP's (Nota de Alteração de Projeto) sem a devida aprovação: 430595-G-MRF-NA0010_R-01, 430595-G-MRF-NA0011_R-00, 430595-G-MRF-NA0018_R-00, 430630-G-CAX-NA0007_R-01 e 430630-G-CAXNA0008_R-00.	3	1	1	5	X	Normal

A tabela 22 apresenta os esclarecimentos solicitados na Recomendação 1, referentes às NAPs encaminhadas na pasta “Anexo III – Engenharia” do 6º Relatório Trimestral, e fornecidos no 8º Relatório Trimestral.

Tabela 22: Atendimento à Recomendação 1 – Notas Técnicas de 10/10/2023 e 15/12/2023

NAP relacionada pela AECOM	Esclarecimentos fornecidos pela Samarco com documentação de referência no Anexo III – Engenharia
430595-G-MRF-NA0010_R01	NAP cancelada. Escopo assumido por outra contratada, conforme consta no corpo da NAP, item 10 – Comentários da Engenharia.
430595-G-MRF-NA0011_R00	NAP aprovada.
430595-G-MRF-NA0018_R00	NAP reprovada. Escopo: dreno do ramal 2. Trecho do ramal implantado em 2024. Revisão 1 da NAP protocolada pela Contratada.
430630-G-CAX-NA0007_R01	NAP aprovada.
430630-G-CAX-NA0008_R00	NAP aprovada.

As evidências de atendimento à Recomendação 1 estão apresentadas no Anexo 3.3 – Atendimento à Recomendação 1 na pasta “Anexo III – Engenharia” do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 5: Lista de Projetos Revisados e Aprovados em Atendimento à Recomendação 1

Anexo 3.3-Atendimento à Recomendação 1

Cabe ressaltar, conforme o Item 10.3 – Registro de Adequações, que os projetos vêm sendo avaliados concomitantemente à implantação. Assim, as eventuais necessidades de adequação podem ser incorporadas.

As listas dos projetos revisados e aprovados para atendimento à Recomendação 7 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23 constam na pasta “Anexo III – Engenharia”, Anexos 3.1 e 3.2 do presente relatório.

Figura 6: Lista de Projetos Revisados e Aprovados no Período

Anexo 3.1.1-Lista Projetos Revisados_Aprovados Barragem
Anexo 3.1.2-Lista Projetos Revisados_Aprovados Cava

4.4 Caso as Obras de Descaracterização Ainda Não Tenham Sido Iniciadas, Informar as Ações e Obras Preparatórias Realizadas no Período, Tais Como: Realização de Estudos, Aquisição de Equipamentos, Construção de Estruturas de Contenção a Jusante, por Exemplo (Item 1.2 – Subitem III)

- O cronograma atualizado de projeto e início efetivo da descaracterização deverá ser apresentado (Item 1.2 – Subitem III).

Este item não se aplica (N/A) aos projetos de Descaracterização da Cava e Barragem do Germano. As obras de descaracterização da Cava do Germano, diques Sela Tulipa e Selinha, bem como a Barragem Eixo 1, estão concluídas. As obras de descaracterização da Barragem do Germano (*regrade*, serviços complementares de drenagens e proteção vegetal) estão em andamento.

4.5 Descrever e Informar os Riscos Geológicos Geotécnicos Associados, Especificamente, a Implantação do Projeto de Descaracterização.

Contextualização:

A localização da Cava do Germano, do barramento principal da Barragem do Germano e dos diques Sela Tulipa e Selinha, compõe um sistema de estruturas geotécnicas posicionadas em cascata, composto de uma bacia de contribuição mais elevada, associada à Cava do Germano, por sua vez conectada a uma bacia de contribuição inferior, da Barragem do Germano, em que se inserem os diques Sela Tulipa e Selinha. Esta composição topográfica e morfológica condiciona um modelo geológico-geotécnico vinculado a um modelo hidrogeológico integrado.

O projeto de descaracterização das estruturas mencionadas foi concebido considerando tal condição, em que o nível de água no interior das estruturas advém não somente dos rejeitos depositados nos seus respectivos reservatórios, das propriedades geotécnicas e da

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



geometria desses depósitos, mas, principalmente, das diversas feições geológicas identificadas nas etapas de investigação e de mapeamento geológico, bem como dos níveis de água regionais e das recargas decorrentes da infiltração natural no referido sistema.

É neste contexto que os riscos geológicos e geotécnicos foram identificados e estão em avaliação técnica de forma contínua, incluindo eventuais ajustes nos projetos de descaracterização da Samarco. Todas as obras são planejadas de forma integrada.

A determinação do nível de saturação no interior do maciço das estruturas em descaracterização é de extrema importância para entender o comportamento geotécnico de longo prazo. O nível de saturação é função da geologia local, das propriedades geotécnicas dos materiais envolvidos (permeabilidade, por exemplo), assim como de elementos específicos previstos no projeto – dispositivos de drenagem superficial e subsuperficial (drenagem interna) – e também dos aterros de reconformação da superfície final (*regrade*), que servem para minimizar infiltrações, coletar e conduzir o “run-off” através de canais de drenagem, especificamente projetados sobre a superfície final, e conectados ao canal principal de drenagem de descaracterização da Barragem do Germano.

De forma a minimizar imprecisões na determinação das linhas de saturação resultantes da associação dessas diferentes variáveis, bem como a necessidade de garantir o nível de segurança estrutural e gerenciar o risco geológico-geotécnico das estruturas que integram o Programa Descaracterização do Germano, foi desenvolvido um modelo hidrogeológico detalhado e representativo das condições locais e dos elementos de projeto.

Este modelo levou em conta as características climáticas do *site*, os níveis freáticos identificados nos dispositivos de monitoramento (piezômetros e indicadores de nível de água), as propriedades geotécnicas dos materiais que integrarão a superfície final da reconformação dos reservatórios e o sistema de drenagem superficial concebido.

O modelo permitiu simular a condição de projeto, mediante calibração, para validar as premissas referentes à posição real das superfícies freáticas identificadas nos dispositivos de monitoramento.

Durante o período de monitoramento ativo será avaliada a aderência do modelo e do projeto às condições locais e, caso necessário, eventuais ajustes poderão ser realizados com a finalidade de manter as estruturas em níveis adequados de segurança.

Avaliação do risco geológico geotécnicos no período:

Este item tem a finalidade de atender à Recomendação 1 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 7: Recomendação 1 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

01	Apresentar no relatório de acompanhamento trimestral os riscos geológico geotécnicos associados a qualquer projeto das etapas do Programa de descaracterizações de barragens alteadas pelo método de montante no complexo de Germano.	2	1	1	4	X	Normal
----	---	---	---	---	---	---	--------

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Avaliações no período:

Outubro à Dezembro/2024 – Período de Referência do 12º Relatório Trimestral:

No ano 2024, a Samarco priorizou, dentre outras atividades, a execução das obras associadas à Descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha, as quais são estruturas auxiliares da barragem do Germano. A finalização das obras de descaracterização destas estruturas na temporada entre o final de 2024 e o início de 2025 representou a antecipação de uma importante etapa integrante do processo de descaracterização da barragem do Germano.

Especificamente em relação ao período de outubro a dezembro de 2024, janela do relatório trimestral número 12, a implantação do projeto de descaracterização buscou mitigar os riscos geológicos geotécnicos associados à passagem de cheias pela área localizada a montante dos diques mencionados anteriormente, mediante a implantação de proteção das superfícies acabadas, e da adequada condução dos fluxos superficiais. Descrevem-se, a seguir, e de modo sintético, as principais atividades executadas na região em questão:

Regrade Sela Tulipa: Esta área está localizada na região a montante dos diques Sela Tulipa / Selinha, onde foram conduzidas a execução do aterro do *regrade* rumo à cota final de projeto, a execução dos canais de drenagem definitivos, a implantação das canaletas de drenagem na crista do Dique Sela Tulipa, bem como aplicação de proteção superficial. Estas atividades visam reduzir a infiltração de água no interior do reservatório do Germano e ao disciplinamento dos fluxos em direção ao canal principal da descaracterização. Com a implantação do *regrade* nesta área, assim como a instalação do caimento associado à revegetação prevista nas superfícies finais, houve uma redução considerável nas áreas anteriormente expostas do reservatório, incorporando o efeito benéfico representado pela redução nas infiltrações.

Figura 8: Vista da área situada a montante dos diques Sela Tulipa, região onde foi priorizada a execução do regrade.



Sela Tulipa: Esta área foi contemplada com a conclusão do aterro da berma de reforço da descaracterização, o que contribuiu para mitigar os riscos geotécnicos associados a


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025


instabilidades neste setor. A conclusão da implantação dos dispositivos de drenagem superficial e o revestimento das superfícies finais na área dos taludes de jusante contribuíram positivamente para combater a possibilidade de erosões com redução de infiltrações no maciço.

Figura 9: Vista do talude de jusante do Dique Sela Tulipa, região onde foi priorizado o término do aterro da berma de reforço, a implantação dos dispositivos de drenagem superficial e as proteções superficiais.



Selinha: Nesta área, a Samarco finalizou o aterro compactado da berma de reforço da descaracterização, finalizou o revestimento das superfícies finais e a implantação dos canais de drenagem superficiais. Uma extensa área com taludes de corte, expostos em fases anteriores das obras, recebeu a aplicação de biomanta associada à hidrossemeadura, de modo a combater os riscos geológicos representados pelas erosões e pelo fluxo concentrado de água sobre as superfícies em geral.

Figura 10: Vista do talude de jusante do dique Selinha, região em que foi priorizado o término do aterro da berma de reforço, assim como a instalação dos dispositivos de drenagem superficial e das proteções superficiais.



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



A finalização dos aterros compactados das bermas de reforço de Sela Tulipa e Selinha, na geometria final prevista em projeto, conferiram aderência aos objetivos de estabilização de projeto. Os dispositivos de drenagem implantados na região do *regrade* a montante dessas estruturas e também sobre os taludes de jusante e na área do platô imediatamente a jusante das bermas de reforço estão aderentes ao projeto, com disciplinamento dos fluxos superficiais e redução das infiltrações, mantendo sob controle os níveis de água no interior das estruturas e assegurando a estabilidade física prevista nos modelos geológicos geotécnicos considerados no projeto.

Canal Principal da Descaracterização (CDP) — no setor 4: Nesta região foi concluído o canal de drenagem da ombreira esquerda da barragem do Germano. Este canal desviou parte dos fluxos que anteriormente eram conduzidos pelo canal periférico esquerdo da Barragem do Germano até a região do pé da estrutura.

Com isso, o fluxo deste canal reduziu a contribuição de fluxo na região do pé da Barragem do Germano, com redução do risco de galgamento dos dispositivos de drenagem. Por sua vez, reduziu o risco de ocorrência de erosões na faixa de contato entre o maciço da Barragem do Germano e a ombreira esquerda.

Ainda na região do Setor 4, foram concluídas as proteções superficiais dos taludes mediante a conclusão do revestimento das superfícies com a aplicação de concreto projetado. Os riscos geológicos decorrentes da exposição direta das superfícies dos taludes de corte que ainda não haviam sido completamente protegidos foram reduzidos.

Na região inferior do Setor 4, foram instaladas as células de carga para o monitoramento das tensões na contenção de concreto localizada na lateral direita da bacia de dissipação do CDP. As juntas no concreto foram tratadas na região da bacia de dissipação e a área situada imediatamente a jusante deste dispositivo recebeu proteção superficial mediante aplicação de concreto projetado sobre tela metálica nas faces do terreno natural que fica em contato direto com o fluxo de base do vale.

Esta proteção superficial da faixa onde se situa o pé dos taludes do terreno natural foi de grande importância para reduzir os riscos geológicos decorrentes da ação direta dos fluxos de água oriundos da região da bacia hidrológica de contribuição do Eixo 1, bem como do próprio fluxo direto decorrente da própria descarga de água que ocorre a jusante da bacia do CDP. Esta proteção superficial também foi aplicada ao longo do trecho a jusante da bacia, até a curva do “feijão” protegendo os taludes naturais da margem direita do córrego das ações erosivas.

Janeiro à Março/2025 – Período de Referência do 13º Relatório Trimestral:

No período, a implantação do projeto de Descaracterização buscou mitigar os riscos geológicos geotécnicos associados à implantação da camada final sobre as superfícies pretéritas dos rejeitos depositados na região denominada *Regrade* Etapa 3. Descrevem-se, a seguir, e de modo sintético, as principais atividades executadas na região em questão. Trata-se de uma região maior localizada na região da área denominada Baía 3 (lagos 3, 4A,

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



4B, região do centro) e região onde se localiza o Dique Auxiliar (faixa ao longo da margem direita do dique Auxiliar, Lago2, Ferrovia) e do Pinheirinho. As atividades, em geral, são de execução de aterros e implantação de drenagem superficial.

Na região da Baía 3 (Lago 3, região central, lagos 4A e 4B), semelhantemente, as atividades estão associadas à cobertura da superfície dos rejeitos pretéritos com a camada de aterro compactado. Esta região apresentou as menores cotas de topo das superfícies dos rejeitos depositados. Por este motivo, no passado recente, a Samarco implantou um sistema de bombeamento de água nesta região, com o propósito de coletar os efluentes que ali se acumulavam nos períodos de chuva.

Recentemente, em 2025, com a ocupação do local através dos aterros de conquista e da implantação de canais temporários, a água ali acumulada foi direcionada sentido canal de drenagem principal. A execução dos aterros do *regrade* ao longo de toda a área da Baía 3 é fundamental para dar aderência entre as obras executadas e o modelo hidrogeológico implantado.

Figura 11: Vista geral das obras do regrade da Barragem do Germano



Estas obras são necessárias para estabelecer uma nova cobertura em consonância com o modelo hidrogeológico simulado, considerando a instalação da camada do *regrade*, nesta região, juntamente com os canais de drenagem superficial previstos, com a conclusão das obras e com a nova conformação da superfície final da descaracterização. O preenchimento da depressão que havia no local eliminará o ponto baixo anteriormente existente e introduzirá um novo caimento, do fundo no sentido dos canais secundários, e destes para o canal principal.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Dique Auxiliar: As atividades realizadas na região do Dique Auxiliar são, basicamente, a execução de aterros de conquista bem como a execução de aterros controlados de modo a ocupar e preencher toda a região, gerando uma nova conformação final das superfícies, com os caimentos previstos em projeto, promovendo o direcionamento das precipitações diretas para os canais secundários e deles para o canal principal. Neste período, a Samarco concentrou esforços na implantação do CS-DS-03.

Figura 12: Vista das obras do regrade na região da Ferrovia



A Samarco, durante o processo de construção do *regrade*, seguiu orientações e adquiriu experiência executiva com apoio de estudos desenvolvidos pela projetista visando dar segurança e a mitigar os riscos geológicos e geotécnicos inerentes ao trabalho associado a movimentações de terra sobre as antigas superfícies dos rejeitos. Os trabalhos relativos à construção do *regrade* permanecem em execução, com previsão de antecipação da conclusão para o final de 2026.

Abril à Junho/2025 – Período de Referência do 14º Relatório Trimestral:

No período, a implantação do projeto de Descaracterização buscou mitigar os riscos geológicos geotécnicos associados à implantação da camada final sobre as superfícies pretéritas dos rejeitos depositados na região denominada *Regrade* Etapa 3. Descrevem-se, a seguir, e de modo sintético, as principais atividades executadas na região em questão.

Como referência, as obras em curso no período foram conduzidas ao longo de uma área extensa situada na região da Baía 3 (lagos 3, 4A, 4B e região central) e da região situada em área adjacente ao Dique Auxiliar (faixa ao longo da margem direita do Dique Auxiliar, Lago2, Ferrovia) e do Pinheirinho. As atividades, em geral, são de continuidade da execução de aterros e da implantação de drenagem superficial.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Na região da Baía 3 (áreas do antigo sistema de bombeamento e central, lagos 4A e 4B), destaque para a construção de um grande trecho do canal de drenagem principal e para as atividades de cobertura da superfície dos rejeitos pretéritos, mediante execução do aterro do *regrade*. Os aterros implantados ocuparam praticamente toda a área com foco na inversão do fluxo sobre a superfície final, do fundo sentido ao canal principal.

Figura 13: Detalhe da continuidade do preenchimento da área do Lago 4 e da implantação do canal principal na Região da Baía 3. Redução dos riscos associados ao avanço sobre as superfícies dos rejeitos pretéritos.



Também foram executados aterros de conquista e controlado na área central da Baía 3, bem como no local onde existia o sistema de bombeamento. Com a continuidade dos preenchimentos em aterro compactado, resta completar a porção situada no fundo da Baía 3, situada nas imediações do Lago 4. Com o preenchimento, os riscos geológicos e geotécnicos foram gradualmente reduzidos, como o risco associado à execução de aterros de conquistas em áreas onde anteriormente praticamente não havia movimentação de equipamentos ou pessoas.

Dique Auxiliar: As atividades realizadas na região do dique Auxiliar foram concentradas na construção do canal principal, desde a região próxima da ferrovia e até o maciço do Dique Auxiliar, juntamente com a continuidade dos preenchimentos na área adjacente à Ferrovia, área do Pinheirinho e na porção situada a montante do Dique Auxiliar.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 14: Vista de um grande trecho de canal executado bem como do aspecto geral do das regiões do Lago 2, da faixa da ferrovia e a montante do Dique Auxiliar.



Além das obras na área da Baía 3 e do Dique Auxiliar, a Samarco concentrou esforços na região de implantação do canal de drenagem da ombreira direita da Barragem do Germano. Nesta região, a declividade do terreno natural introduz a necessidade de cuidados especiais com a movimentação de pessoas e equipamentos, dada a inclinação das superfícies em geral, dada a natureza e a litologia do material local (filitos e solo de alteração de filitos).

Os principais riscos geológicos e geotécnicos inerentes à implantação das obras da descaracterização neste local residem na proteção das superfícies escavadas, mediante instalação de dispositivos de proteção superficial antes da entrada da temporada de chuvas, no bloqueio de eventuais processos erosivos, no caso de precipitações fora de época, mediante instalação de dispositivos temporários do tipo paliçada, onde eventualmente necessário.

Finalmente, observa-se a atenção especial decorrente da interação pessoa-máquina nos acessos de serviço e na região de instalação dos canais, que prevê a execução de cortes e valas em um ambiente com acessos implantados em topografia acidentada, com limites de manobra relativamente estreitos e eventuais condições desfavoráveis de deslizamento de esteiras de escavadeiras no caso de foliações no filito, igualmente desfavoráveis.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Resultados dos Estudos Geológicos Geotécnicos e os Resultados das Análises de Estabilidade Conforme Cenário - Recomendação 8:

Este item tem a finalidade de atender à Recomendação 8 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 15: Recomendação 8 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

08	Apresentar os resultados dos estudos geológicos geotécnicos e os resultados das análises de estabilidade considerando a exclusão do aterro em estéril da Ombreira Comum dos Diques de Sela/Tulipa até a El. 906 m.	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os resultados dos estudos geológicos e geotécnicos, assim como os resultados das análises de estabilidade considerando a exclusão do aterro em estéril da ombreira comum do Dique Sela Tulipa até a El. 906m são apresentados em avanço (documento em processo de aprovação) no relatório BVP 18102-000A-1-GE-RT-0032 - As /s Resultado das Análises de Estabilidade, pasta “Anexo III – Engenharia”, Anexo 3.8 do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5. OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO

5.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao Item 1.3 – Obras de Descaracterização, subitens I a XIV do Termo de Referência da FEAM.

5.2 Memorial Descritivo das Obras de Descaracterização da Barragem, Contendo os Seguintes Dados e Informações e Representações Gráficas em Escala Adequada (Item 1.3 – Subitem I do TR):


5.2.1 Memorial Descritivo e Desenhos das Estruturas Implantadas, Removidas ou Modificadas, ou Informações Equivalentes, Bem Como Dispositivos de Proteção Ambiental (Item 1.3 – Subitem I-a do TR)

Este item apresenta o descritivo das obras de descaracterização da Barragem do Germano (em andamento) e da Cava do Germano (concluídas), com foco nas estruturas implantadas, incluído evidências do estágio atual da construção e dos dispositivos de proteção ambiental.

5.2.1.1 Cava do Germano (Histórico)

Na região da Cava do Germano, as obras de descaracterização foram concluídas em junho de 2023 e a *Punch List* em agosto de 2023. Foram implantados: a berma de reforço do barramento principal, o canal de drenagem principal da ombreira direita, o sistema de drenagem superficial e os túneis-bala. Foram executadas a reconformação do reservatório (*regrade*) e a revegetação dos solos expostos ao final das atividades. A etapa de monitoramento ativo da estrutura, pelo período mínimo de 2 (dois) anos, foi concluída em junho de 2025 e será mantida até o descadastramento junto à ANM. A figura 16 apresenta uma vista geral da Cava do Germano com as obras de descaracterização concluídas.

Figura 16: Vista geral da Cava do Germano (Obras de Descaracterização Concluídas)



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5.2.1.2 Barragem do Germano (Barramento Principal, *Regrade* e Canal de Drenagem Principal)

Para a Barragem do Germano, o projeto estabelece a implantação de obras específicas de descaracterização, conforme identificadas na figura 17:

- Berma de reforço a jusante do barramento principal (obras concluídas);
- Canal de Drenagem Principal – CDP (obras concluídas);
- Reforços dos diques Sela Tulipa e Selinha, bem como a Barragem Eixo 1 (obras concluídas*);
- Preenchimento do Vale do Fundão e o sistema de drenagem superficial associado (obras concluídas); e
- Reconformação do reservatório associada ao sistema de canais de drenagem superficial (obras em andamento).

***Nota:** As informações referentes às obras de descaracterização das estruturas Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Barragem Eixo 1 estão contempladas, respectivamente, nos Apêndices I, II e III do presente relatório.

Figura 17: Obras de Descaracterização da Barragem do Germano



Na região do pé do barramento principal, onde foi construída a berma de reforço em enrocamento e o canal de drenagem superficial da ombreira esquerda, foram realizadas obras de limpeza e de tratamento da fundação, bem como implantada a drenagem passiva. Para tanto, foi executado reforço de fundação utilizando a metodologia *Jet-Grouting*. Após este reforço, foram implantadas as camadas de transição e o aterro da drenagem passiva.

Atualmente, a drenagem de fundo da Barragem do Germano é realizada naturalmente (drenagem passiva), sem necessidade da operação de sistema de bombeamento. Contudo, o sistema de bombeamento ativo permanece instalado e pode ser utilizado, caso necessário.

Na região superior do barramento principal da Barragem do Germano foi realizada a adequação da geometria da face mediante execução de retaludamento, o que resultou em uma superfície levemente inclinada, da ordem de 1V:10H, imediatamente a jusante da crista.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

A figura 18 apresenta evidências de conclusão da implantação da berma de reforço (100% enrocamento), do retaludamento na região superior do barramento principal e dos canais de drenagem intermediário e inferior da ombreira esquerda. As obras do canal da OD e o trecho do canal superior da OE estão em andamento, com previsão de término em setembro de 2025.

Figura 18: Berma de Reforço e Retaludamento do Barramento Principal – Obras Concluídas



A figura 19 apresenta evidências de conclusão da drenagem passiva (100% enrocamento). Pode-se observar a saída do sistema de bombeamento instalado na região, que pode ser acionado caso necessário, bem como o trecho final do canal de drenagem da ombreira esquerda.

Figura 19: Drenagem Passiva sob a Berma de Reforço – Obras Concluídas



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Nas proximidades do flanco direito do Dique Selinha, o emboque do CDP foi implantado. As obras dos setores 1, 2, 3 e 4, bem como a bacia final, foram concluídas em setembro de 2024.

A figura 20 apresenta um arranjo do CDP, incluindo os dispositivos de drenagem superficial (indicados nas cores azul e verde) que integram o projeto de descaracterização da Barragem do Germano.

Figura 20: Arranjo Geral de Implantação do Canal de Drenagem Principal (CDP) da Barragem



Na figura 21, podem-se observar as obras do canal principal e dos dispositivos de proteção ambiental nas áreas das escavações obrigatórias para a implantação do CDP concluídas.

Na margem direita, foi executado concreto projetado nas porções superior e inferior. Na margem esquerda, foi aplicada biomanta.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 21: Visão Geral do Canal de Drenagem Principal Em Operação e Região – Obras Concluídas



A figura 21 apresenta o emboque do CDP, o canal de aproximação e o *regrade* na região a montante de Sela Tulipa concluídos. Nesta região, durante as obras, foi instalada uma ensecadeira provisória para proteção do trecho final do CDP. A ensecadeira foi removida para a operação do canal antes do início o período chuvoso 2024–2025.

Figura 22: Emboque do Canal de Drenagem Principal (CDP) e Canal de Aproximação – Obras Concluídas



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Na região do *regrade* estão em andamento as obras de implantação do sistema de canais superficiais e aterros compactados conforme evidenciado nas figuras 23, 24 e 25, assim como apresentado na gestão a vista das obras na figura 26.

Figura 23: Região do Pinheirinho: Obras de reconformação final e canais de drenagem superficial em andamento



Figura 24: Região a Montante dos Diques Sela Tulipa e Selinha (Obras Concluídas)



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 25: Região da Baía 3 e Lagos Preenchidos (Obras da Etapa 3 em Andamento)



Figura 26: Gestão a Vista das da Execução do Regrade da Barragem

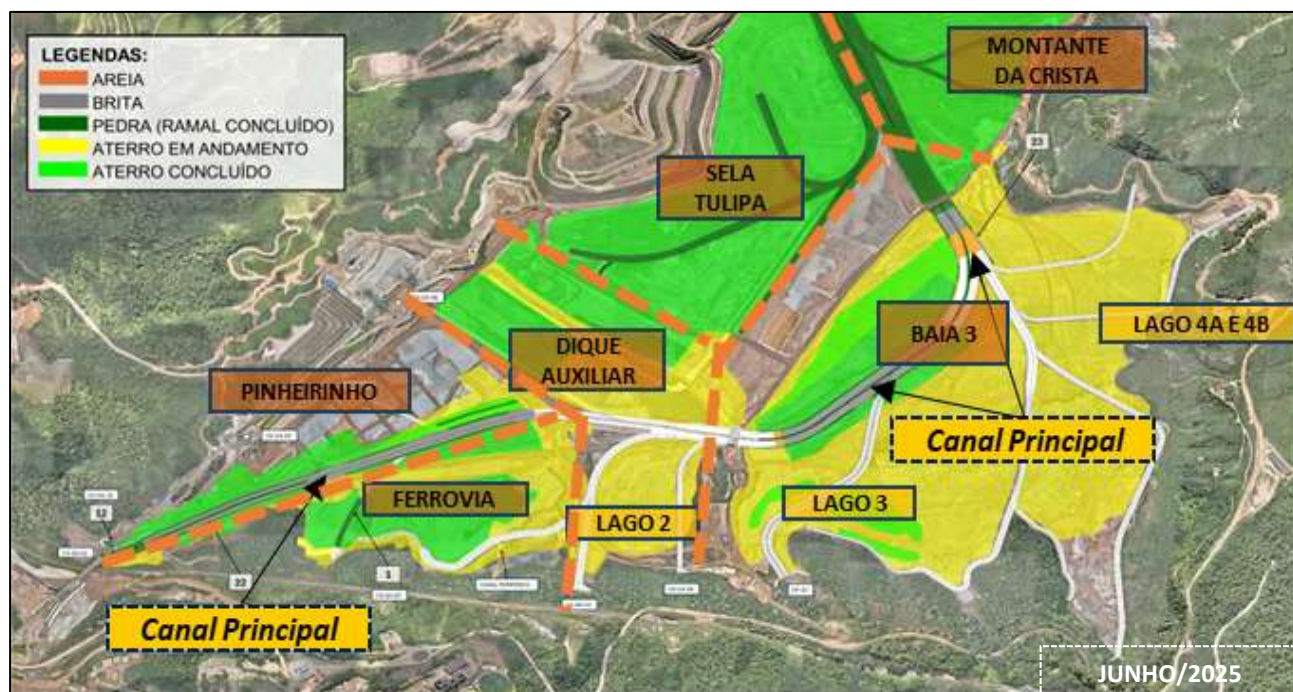

5.2.1.3 Plano de Chuvas


Tendo em vista o longo prazo de implantação do Programa Descaracterização do Germano, e também a necessidade de adoção de ações efetivas visando a garantir a segurança das estruturas frente às temporadas chuvosas nos vários anos de obras, a Samarco concebeu

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



um plano de chuvas para aplicação no período entre outubro de 2024 a março de 2025. O referido plano é apresentado no Anexo 7.1 – Sistema de Drenagem_Plano de Chuvas 24_25_AECOM, na pasta “Anexo VII – Meio Ambiente” do presente relatório.

Figura 27: Anexo 7.1 - Plano de Chuvas 2024–2025



Em linhas gerais, nos trechos com dispositivos de drenagem que não apresentaram tempo hábil para a completa implantação no ano corrente, o plano de ação indicou a necessidade de execução de estruturas provisórias.

A instalação dos dispositivos provisórios foi prevista para coletar e conduzir, de modo adequado e seguro, o escoamento superficial durante as chuvas de 2024–2025, mantendo a necessidade de implantação dos dispositivos permanentes previstos nos projetos detalhados antes do período chuvoso seguinte.

A concepção das estruturas provisórias preserva a capacidade de descarga de projeto, alterando apenas seu revestimento (substituição de concreto por pedra argamassada ou blocos) ou, quando necessário, a implantação de dispositivos não-previstos em projeto. O período de retorno mínimo de 25 anos foi considerado para dimensionamento das estruturas provisórias, garantindo que o risco associado à estação chuvosa seja inferior a 5%.

Resumidamente, o plano para o período de chuvas 2024–2025 indicou as seguintes ações, conforme mostrado na tabela 23.

Tabela 23: Síntese do Plano de Ação Implantado para o Período de Chuvas 2024–2025

Estrutura	Região	Ação	Solução
Barragem do Germano	Regrade	Implantar sistema de drenagem	Conforme Projeto
(obras de descaracterização em andamento)	Regrade a montante dos diques de Sela-Tulipa e Selinha	Implantar sistema de drenagem superficial	Conforme projeto
		Implantar sistema de drenagem superficial do acesso	Conforme projeto
		Executar passagem molhada de ligação entre os canais a montante e jusante do Dique Auxiliar	Conforme projeto
		Fechar dique fusível e nivelar crista	Conforme projeto
	Emboque Canal de Drenagem Principal (CDP)	Remoção da estrutura de desvio (soleira galgável de 1,00m no emboque e derivação por tubos) utilizada no plano de chuva anterior para obras do CDP.	Permanente
		Recuperar lateral do canal	Conforme projeto
	CDP	Concluir a <i>Punch List</i> da bacia de dissipação	Conforme projeto
		Finalizar proteção a jusante da bacia de dissipação	Conforme projeto
		Finalizar concreto projetado nas paredes do Trecho 1 do canal	Permanente
	Upper dam	Implementar o canal periférico ombreira esquerda	Conforme projeto

O link de acesso ao Plano de Chuvas 2024–2025, disponibilizado no *SharePoint* Samarco para *download*, foi encaminhado à AECOM via e-mail em 30 de setembro de 2024.

Importante ressaltar que as ações previstas no plano de chuvas 2024–2025 aprovado pela AECOM estão sendo implantadas conforme planejado, sendo apresentadas no Anexo 4.3 — Status_Implantação_Plano_Chuvas 2024–2025, na pasta “Anexo IV — Execução” do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 28: Anexo 4.3 – Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024–2025

Anexo 4.3-Status_Implantação_Plano_Chuvas 2024-2025_Jun_25

Nota Técnica AECOM – 11/04/2025 – Item 3.3.1.2 (página 20)

Este item tem a finalidade de esclarecer e apresentar evidências de atendimento das “Não Conformidades” apontadas pela AECOM acerca da atualização do Plano de Chuva referente ao 12º Relatório Trimestral (período de outubro a dezembro de 2024).

Apontamento 1: Cava do Germano (Projeto de Proteção dos Taludes da Cava)

Figura 29: Apontamento 1 – Nota Técnica AECOM 11/04/2025

Acesso à Cava do Germano: A execução de *sumps* e a implantação de canais e bueiros no acesso operacional à Cava do Germano não foram realizadas devido ao bloqueio do acesso pelo CMI. O Canal CP-03, previsto na base do Empilhamento, também não foi implantado.

Conforme tratativas e discussões técnicas com a AECOM, a Samarco consolidou o plano de segurança, que contemplou o monitoramento visual, assim como a utilização de radar para a área dos taludes adjacentes ao acesso construtivo para as obras de proteção dos taludes da Cava de Germano. Este plano aprovado, estabeleceu o bloqueio do acesso durante o período de chuvas.

A previsão inicial era utilizar *sumps* e canais visando proteger o acesso, disciplinando os fluxos superficiais. Contudo, conforme a revisão do projeto, a Samarco reconstruiu o trecho do acesso operacional após o término do período chuvoso, dispensando a necessidade de implantação de canais e bueiros.

A figura 30 apresenta a evidência de atendimento do Apontamento 1:

Figura 30: Acesso Construtivo das Obras dos Taludes de Proteção da Cava de Germano reconstruído e em operação



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Importante informar que, para o Plano de Chuvas 2025/2026, a Samarco avaliará a necessidade de implantação de dispositivos de controle dos fluxos de superfície nessa região.

Com relação ao dispositivo de drenagem “Canal CP-03”, que pertence ao escopo do projeto de Proteção dos Taludes da Cava do Germano, a Samarco informa que o dispositivo definitivo foi implantado conforme previsto no projeto executivo. A figura 31 apresenta a evidência da implantação do “Canal CP-03”.

Figura 31: Canal CP-03 Definitivo Implantado



Apontamento 2: Bacia do Chico (Região a Jusante da Cava do Germano)

Figura 32: Apontamento 2 – Nota Técnica AECOM 11/04/2025

Bacia do Chico: O desassoreamento e a recuperação dos canais existentes, a conclusão dos dispositivos projetados e a finalização do aterro não foram concluídos até dezembro de 2024.

O canal de drenagem principal da Bacia do Chico encontra-se desassoreado, limpo, com o revestimento finalizado e em operação. Já o canal secundário será completamente desassoreado quando da remoção da travessia temporária, que permite o acesso de veículos ao almoxarifado avançado localizado na região entre o transportador CV108 e a ferrovia da Vale. Cabe ressaltar que a travessia não impede o fluxo do canal.

Com relação aos dispositivos projetados, a implantação do bueiro encontra-se concluída e a execução do canal principal está em vias de finalização, restando somente o término do canal secundário 2 e da transição triangular para trapezoidal.

Referente ao aterro na Bacia do Chico, a execução encontra-se finalizada.

As figuras 33 e 34 apresentam as evidências de cumprimento das atividades realizadas na Bacia do Chico.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 33: Canal Principal da Bacia do Chico




Figura 34: Aterros e Bueiro BVP



Apontamento 3: Regrade a Montante dos Diques Sela Tulipa e Selinha:

Figura 35: Apontamento 3 – Nota Técnica AECOM 11/04/2025

Regrade a montante dos Diques Selinha e Sela/Tulipa: A finalização do aterro, a revegetação, a implantação do sistema de drenagem superficial e a execução da passagem molhada não foram concluídas.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

As obras do regrade na região a montante dos diques Sela Tulipa e Selinha, contemplando os aterros, canais superficiais e proteção vegetal, encontram-se concluídas. A *Punch List* foi finalizada em fevereiro de 2025. As figuras 36 e 37 apresentam evidências de conclusão dos serviços dentro da área delimitada em amarelo (região a montante dos diques Sela Tulipa e Selinha).

Figura 36: Região a Montante dos Diques de Sela Tulipa e Selinha




Figura 37: Vista das Obras Concluídas da Região a Montante dos Diques de Sela Tulipa e Selinha



Apontamento 4: Vale do Fundão:

Figura 38: Apontamento 4 – Nota Técnica AECOM 11/04/2025

Vale do Fundão: O arranjo de drenagem superficial previsto no projeto da BVP Engenharia não foi finalizado.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

As obras de drenagem superficial na região do Vale do Fundão, previstas no projeto da BVP Engenharia, assim como na NAP, encontram-se concluídas. A *Punch List* foi finalizada em fevereiro de 2025. As figuras 39 e 40 apresentam evidências de conclusão dos serviços na região.

Figura 39: Ortofoto do Vale do Fundão com Arranjo de Drenagem Superficial Conforme Projeto BVP Concluído



Figura 40: Vista do Vale do Fundão com as Obras Concluídas Conforme Projeto BVP



5.2.2 Memorial Descritivo e Layout das Soluções Geotécnicas Empregadas Durante as Obras, Incluindo a Necessidade de Esgotamento da Água Acumulada no Interior da Barragem e, caso haja, da Infraestrutura de Apoio das Frentes de Obras (Item 1.3 – Subitem I-b do TR)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



As soluções geotécnicas empregadas nas obras do Programa Descaracterização das estruturas da Samarco se aplicam à Barragem do Germano (obras do regrade, serviços complementares de drenagens e proteção vegetal em andamento), incluindo as estruturas: diques Sela Tulipa e Selinha, e Barragem Eixo 1 (obras concluídas); bem como à Cava do Germano, cujas obras já estão finalizadas.

Essencialmente, a descaracterização consiste de implantação de bermas de reforço a jusante das estruturas; retirada de pontos localizados de acúmulo de água no reservatório; reconformação da superfície final (*regrade*) do reservatório, através da implantação de superfícies inclinadas, com caimentos direcionados a canais de drenagem especialmente dimensionados para evitar acúmulo permanente de água no reservatório; e, finalmente, implantação dos respectivos canais principais de drenagem, dimensionados para verter as cheias decorrentes da Precipitação Máxima Provável (PMP).

5.2.2.1 Barragem do Germano

Berma de Reforço

As obras referentes à implantação da berma de reforço do barramento principal foram concluídas em agosto de 2022.

Regrade

As obras da reconformação do reservatório ocorrem avançadamente em relação ao previsto no cronograma de planejamento, tendo sido iniciadas com o preenchimento dos pontos mais baixos, onde existiam depressões e algum acúmulo de água (Lagos 1, 1A, 2, 3, 4A, 4B e região da antiga estação de bombeamento). Esses pontos de depressão estavam associados a locais de recarga nos fundos de alguns braços do reservatório principal da Barragem do Germano, na região da Baía 3 e na porção do extremo norte, nas imediações da ferrovia. Os lagos foram aterrados no início das obras de reconformação do reservatório da Barragem do Germano.

É necessário destacar que o reservatório da Barragem do Germano não apresentava lâmina de água contínua, nem acúmulo permanente de água sobre toda a extensão da superfície dos rejeitos depositados, que consiste na região dos lagos mencionados.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 3 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 41: Recomendação 3 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

03	Atualizar o mapa do reservatório da Barragem de Germano, identificando precisamente os lagos com aterros de preenchimento, delimitar as áreas remanescentes com acúmulo de água e apresentar justificativa técnica para a persistência dessa água no interior da estrutura. Adicionalmente, recomenda-se que mapeamento atualizado seja integrado aos relatórios trimestrais subsequentes.	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Atualização do mapa da superfície do reservatório da Barragem do Germano

As figuras 42, 44 e 46 a seguir identificam precisamente os locais dos antigos lagos (laranja) e delimitam as áreas remanescentes dos pontos de acúmulos de água (azul) por período.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Dezembro de 2024 – 12º Relatório Trimestral:

Figura 42: Mapa Reservatório da Barragem do Germano - Dezembro de 2024





Figura 43: Região da Baía 3 – Dezembro de 2025



Março de 2025 – 13º Relatório Trimestral:

Figura 44: Mapa do Reservatório da Barragem do Germano - Março de 2025




Figura 45: Região da Baía 3 – Março de 2025



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Junho de 2025 – 14º Relatório Trimestral:

Figura 46: Mapa do Reservatório da Barragem do Germano - Junho de 2025




Figura 47: Região da Baía 3 – Junho de 2025



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Justificativa Técnica dos Pontos de Acúmulo de Água

Os pontos de acúmulos de água da região da Baía 3 (Lagos 4A e 4B) e (Bombas) observados na vistoria técnica de campo, realizada em dezembro de 2024, foram formados em decorrência das chuvas ocorridas no período.

É importante destacar que estes pontos correspondem às áreas com as menores elevações no interior do reservatório da Barragem do Germano, na região da Baía 3. A cota final do *regrade* nesta região, cujas obras estão em andamento, ainda não foi totalmente alcançada.

Em suma, a partir do início de 2025 foram iniciadas a implantação as camadas finais de aterro compactado, permitindo assim, a execução dos caimentos direcionados para os canais de drenagem e a eliminação gradual dos pontos de acúmulo temporário de água. Paralelamente ao preenchimento em questão, um novo sistema de drenagem local foi implantado com o objetivo de direcionar o fluxo de água para o canal principal do reservatório. Atualmente, os pontos de acúmulo temporário de água foram praticamente eliminados, conforme evidência apresentada anteriormente na figura 47.

O sequenciamento da execução do *regrade* segue o planejamento aprovado, conforme a seguir:

- Região a montante do Barramento Principal: Aterros com a conformação final, canais de drenagem superficiais e proteção vegetal concluídos (ver figura 48).

Figura 48: Região a Montante do Barramento Principal – Maio de 2025




PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

- Regiões do Pinheirinho e Ferrovia: Aterros de conquista e compactados concluídos (lagos 1A e 2 eliminados). Atualmente, as obras do canal de drenagem principal encontram-se em andamento (ver figura 49).

Figura 49: Região do Pinheirinho – Junho de 2025



- Região a montante dos diques Sela Tulipa e Selinha: Aterros com a conformação final, canais de drenagem superficiais e proteção vegetal concluídos (ver figura 50).

Figura 50: Região de Sela Tulipa e Selinha – Junho de 2025



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

- Região do Dique Auxiliar: Aterros compactados, canal principal definitivo e implantação da travessia sobre o canal principal em andamento (ver figura 51).

Figura 51: Região do Dique Auxiliar – Junho de 2025



- Regiões da Baía 3: A execução dos aterros de conquista e compactados segue em andamento (lagos 4A e 4B, assim como o lago na área da antiga estação de bombeamento, eliminados). A implantação do canal de drenagem definitivo foi iniciada. A figura 52 apresenta o status das obras no início de junho de 2025.

Figura 52: Região da Baía 3 – Junho de 2025



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



De forma geral, as obras do *Regrade* estão em curso avançadamente em relação ao previsto na linha de base do cronograma do Termo de Compromisso (ver figura 53), com potencial tendência de antecipação do término para 2026.

Figura 53: Cronograma das Obras do Regrade 3 – Status: 22/06/2025

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BC Project Start	BC Project Finish
5442_22_06_2025.4.6.2.2 REGRADO ETAPA 3		13,12%	92,39%	2430,754	14/02/22 A	18/10/28	14/02/22		14/02/22	09/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1 DIGUE AUXILIAR		23,82%	54,13%	2032,378	14/02/22 A	26/02/28	14/02/22		14/02/22	21/08/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.1 GERAL		0%	18,92%	1575,578	02/05/23 A	25/09/27	02/05/23		05/02/26	25/08/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.2 FERROVIA		30,35%	80,06%	1739,594	14/02/22 A	19/11/28	14/02/22		14/02/22	19/11/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.2.1 TERRAPLENAGEM		30,35%	80,06%	1739,594	14/02/22 A	19/11/28	14/02/22		14/02/22	19/11/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.3 PIMBERRINHO		47,2%	64,49%	2004,204	23/05/22 A	17/11/27	23/05/22		23/05/22	12/06/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.3.1 TERRAPLENAGEM		47,2%	64,49%	2004,204	23/05/22 A	17/11/27	23/05/22		23/05/22	12/06/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.4 LAGO 3		20,3%	26,46%	752,768	05/02/25 A	27/02/27	05/02/25		06/02/26	03/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.4.1 TERRAPLENAGEM		20,3%	26,46%	752,768	05/02/25 A	27/02/27	05/02/25		06/02/26	03/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.5 LAGO 1A		0%	100%	5,138	04/09/23 A	09/09/23 A	04/09/23	09/09/23	13/03/27	13/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.5.1 TERRAPLENAGEM		0%	100%	5,138	04/09/23 A	09/09/23 A	04/09/23	09/09/23	13/03/27	13/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.6 MONTANTE DA CRISTA DO DIGUE AUXILIAR		0%	43,1%	1190,378	02/01/25 A	26/02/28	02/01/25		02/04/27	21/08/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.6.1 TERRAPLENAGEM		0%	43,1%	1190,378	02/01/25 A	26/02/28	02/01/25		02/04/27	21/08/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2 BAIA 3		8,97%	50,32%	2151,294	28/11/22 A	18/10/28	28/11/22		09/02/26	09/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.1 GERAL		0%	10,56%	1617,944	01/02/23 A	09/07/27	01/02/23		12/07/26	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.1.1 DRENAGEM		0%	10,56%	1617,944	01/02/23 A	09/07/27	01/02/23		12/07/26	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.1.1.1 CANAL PRINCIPAL		0%	26,59%	1409,564	01/02/23 A	12/12/26	01/02/23		12/07/26	13/12/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.1.1.2 CANAL SECUNDÁRIO		0%	0%	196,094	12/12/26	08/07/27			13/12/27	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.2 LAGO 3		40,38%	63,71%	2151,294	28/11/22 A	18/10/28	28/11/22		09/02/26	18/10/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.2.1 TERRAPLENAGEM		40,38%	63,71%	2151,294	28/11/22 A	18/10/28	28/11/22		09/02/26	18/10/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.3 LAGO 4A & 4B		0%	76,06%	1593,078	11/07/23 A	20/11/27	11/07/23		25/06/26	20/11/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.3.1 TERRAPLENAGEM		0%	76,06%	1593,078	11/07/23 A	20/11/27	11/07/23		25/06/26	20/11/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.4 BOMBAS		21,99%	36,47%	1965,624	01/12/22 A	18/04/28	01/12/22		09/02/26	23/10/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.4.1 TERRAPLENAGEM		21,99%	36,47%	1965,624	01/12/22 A	18/04/28	01/12/22		09/02/26	23/10/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.5 MONTANTE DA CRISTA DO DIGUE DA BAIA 3		0%	24,81%	397,954	02/04/25 A	05/05/28	02/04/25		28/09/26	30/01/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.5.1 TERRAPLENAGEM		0%	24,81%	397,954	02/04/25 A	05/05/28	02/04/25		28/09/26	30/01/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.6 BAIA 3		0%	24,84%	1102,694	03/03/25 A	09/03/28	03/03/25		12/07/26	09/03/29
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.6.1 TERRAPLENAGEM		0%	24,84%	1102,694	03/03/25 A	09/03/28	03/03/25		12/07/26	09/03/29
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3 JUSANTE DO DIGUE AUXILIAR (LESTE CANAL PRINCIPAL)		0%	54,01%	1207,524	08/11/22 A	26/02/28	08/11/22		25/06/26	03/10/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.1 GERAL		0%	65,16%	961,794	17/05/23 A	03/01/28	17/05/23		25/06/26	07/08/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.2 JUSANTE DIGUE AUXILIAR		0%	15,48%	194,794	20/05/25 A	26/02/26	20/05/25		23/07/26	03/10/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.2.1 TERRAPLENAGEM		0%	15,48%	194,794	20/05/25 A	26/02/26	20/05/25		23/07/26	03/10/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.3 CRISTA DO DIGUE AUXILIAR		0%	0%	88,744	23/09/25	26/02/26			03/06/26	01/10/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.3.1 TERRAPLENAGEM		0%	0%	88,744	23/09/25	26/02/26			03/06/26	01/10/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.4 ACESSO VALE DO FUNDAO		0%	59,93%	1049,974	08/11/22 A	23/09/25	08/11/22		27/10/25	03/06/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.4.1 TERRAPLENAGEM		0%	59,93%	1049,974	08/11/22 A	23/09/25	08/11/22		27/10/25	03/06/26
5442_22_06_2025.4.6.3 REGRADO ETAPAS 3 E 3 - MARCO DE TERMINO		0%	0%	2474,034	08/01/22 A	18/10/28	08/01/22		08/05/29	08/05/29

Canal de Drenagem Principal (CDP)

As obras do CDP foram concluídas em setembro de 2024. Sendo assim, o canal encontra-se em operação (figura 54), conforme previsto no plano de chuvas 2024-2025.

Figura 54: Canal de Drenagem Principal – Emboque e Setores 1/2 – Obras Concluídas e Canal em Operação



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

As obras da bacia final do CDP e da proteção dos taludes a jusante da bacia foram finalizadas (figura 55).

Figura 55: Bacia de Dissipação do CDP e Proteção dos Taludes (Obras Concluídas e Canal em Operação)



5.2.2.2 Cava do Germano

As obras de descaracterização da Cava do Germano, contemplando a berma de reforço do barramento principal, o canal de drenagem principal localizado na ombreira direita, o sistema de drenagem superficial (barramento principal, berma de reforço e superfície da Cava), o bueiro sob a rodovia e a revegetação foram concluídos em junho de 2023 e a *Punch List* em agosto de 2023. Atualmente, a estrutura se encontra em fase de monitoramento ativo.

5.2.3 Descrição das Estruturas e Layout dos Sistemas de Controle Ambiental dos Efluentes Líquidos, Emissões Atmosféricas e Resíduos Sólidos Gerados no Canteiro de Obras e Infraestrutura de Apoio das Frentes de Obras (Item 1.3 – Subitem I-c do TR).

5.2.3.1 Descrição das Estruturas

Os efluentes das instalações sanitárias são esgotados periodicamente por caminhões apropriados (limpa-fossa) na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE 01) do Complexo do Germano, já licenciada (figura 56).

O tratamento na ETE 01 é controlado pela Samarco. Os efluentes tratados são lançados no canal de drenagem da Barragem do Germano e direcionados para o reservatório de Nova Santarém, sem interface com compartimentos ambientais a jusante.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 56: Vista do Sistema de Controle Ambiental da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE 01



5.2.3.2 Efluentes Líquidos

Efluentes Sanitários

A coleta de efluentes nos canteiros avançados, nas áreas de responsabilidade da Samarco, é realizada por empresas subcontratadas, licenciadas e homologadas pela Samarco.

As figuras 57 e 58 demonstram algumas etapas da atividade, e a tabela 24 apresenta a geração de efluentes no período.

Figura 57: Limpeza e Sucção dos Banheiros Hidráulicos nas Frentes de Serviços – Barragem do Germano



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 58: Limpeza e Sucção dos Banheiros Hidráulicos nas Frentes de Serviços – Barragem do Germano



Tabela 24: Total de Efluentes Sanitários Gerados no Período

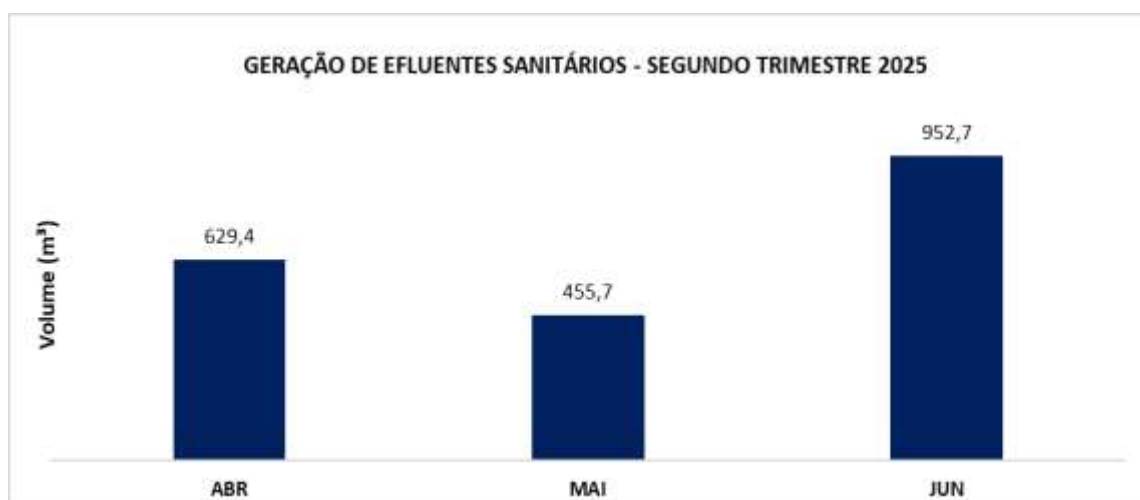

Nota: A gestão de recursos hídricos visa a subsidiar a melhor gestão operacional dos processos e minimizar os impactos sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, inclusive considerando os sistemas de controle ambiental implantados e os efluentes líquidos gerados.

Efluentes Oleosos

Verificados por meio de inspeções ambientais nas oficinas das empresas prestadoras de serviços localizadas em áreas externas à Samarco, com o objetivo de assegurar o atendimento à legislação ambiental e às normas e diretrizes ambientais da Samarco.

Um dos itens avaliados é a Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), de forma a adequar os efluentes gerados, o que está demonstrado na figura 59.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 59: Caixa SAO em Destaque – Oficina de Manutenção da Contratada Ápia



O descarte dos resíduos contaminados com efluentes oleosos (Classe I) atende à NBR 12235: Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos.

Os resíduos Classe I são acondicionados temporariamente em depósitos intermediários das contratadas, posteriormente encaminhados à destinação final em receptores externos à Samarco. Os pontos de descarte nas frentes de serviço são áreas cobertas, compostas de tambor metálico cor laranja, bacia de contenção com piso impermeabilizado, dimensionada com volume 10% maior que a quantidade de óleo utilizado pela máquina ou equipamento, e caixa de drenagem.

Além da estrutura citada para acondicionamento dos resíduos contaminados, há *kits* de emergência ambiental (Figura 60) próximos aos pontos de geração dos efluentes oleosos, para situações de necessidade de mitigação de vazamentos ocasionais.

Figura 60: Kit de Emergência Ambiental na Frente de Serviço



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5.2.3.3 Emissões Atmosféricas

Monitoramento de Fumaça Preta

Aplicável a todos os veículos, caminhões e equipamentos movidos a diesel que circulam nas áreas do Complexo do Germano. É realizado com periodicidade semestral, conforme descrito em instrução técnica da Samarco, respeitando todos os documentos complementares listados abaixo:

Deliberação Normativa COPAM nº 11/1986: Para o estado de Minas Gerais, estabelece normas e padrões para emissões de poluentes na atmosfera e dá outras providências.

Resolução CONAMA nº 08/1990: Dispõe sobre o estabelecimento de limites máximos de emissão de poluentes no ar para processos de combustão externa de fontes fixas de poluição.

Portaria IBAMA nº 85/1996: Determina que as empresas possuidoras de frota própria de transporte de carga e de passageiros com veículos movidos a diesel adotem o Programa Interno de Autofiscalização e Correta Manutenção da Frota.

Norma Técnica CETESB L9.061: Determinação do grau de enegrecimento de fumaça emitida por fontes estacionárias otimizando a Escala de Ringelmann Reduzida: método de ensaio.

ABNT NBR 6016:2015: Gás de escapamento de motor diesel – Avaliação de teor de fuligem com a Escala de Ringelmann. Esta Norma prescreve o método de avaliação para o gás de escapamento de motor alternativo de combustão interna – ACI, ciclo diesel, de injeção direta ou indireta, com ou sem superalimentação, e em qualquer condição usual de trabalho, utilizando a Escala de Ringelmann Reduzida.

ABNT NBR 7027:2001: Veículos rodoviários automotores – Fumaça emitida por motor diesel: Determinação da opacidade ou do grau de enegrecimento em regime constante. Esta Norma descreve o método de avaliação para o gás de escapamento emitido por motores diesel de veículos rodoviários automotores, sob condições de regime constante.

Plano de Controle Ambiental – PCA da Licença de Operação Corretiva do Complexo do Germano 020/2019 – Atendimento ao Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar.

O procedimento para monitoramento e controle de emissões de fumaça preta está detalhado no documento SMIN-POP-SGA-007, intitulado “Monitoramento e Controle das Emissões de Fumaça por Motores Movidos a Óleo Diesel”.

As emissões veiculares são monitoradas com opacímetro, equipamento eletrônico que permite, por meio de um feixe de luz, avaliar a densidade da fumaça coletada por sonda introduzida no tubo de escapamento, em compartimento fechado. A partir do resultado do monitoramento, os veículos, caminhões ou equipamentos que estejam desregulados são direcionados à manutenção.

A Gerência de Meio Ambiente, após aprovação dos documentos recebidos, realiza a entrega dos selos para identificar que o veículo ou equipamento está adequado às regras.

A figura 61 ilustra os selos utilizados. No verso constam as seguintes informações: data, identificação do equipamento e assinatura do inspetor.

- Selo Verde: Veículo/equipamento aprovado no 1º semestre;
- Selo Azul: Veículo/equipamento aprovado no 2º semestre.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 61: Selos de Identificação da Condição de Emissão de Veículos e Equipamentos



Os resultados dos monitoramentos semestrais de fumaça preta são encaminhados à Gerência de Meio Ambiente no formato de laudo de opacidade, juntamente com o certificado de calibração do equipamento, no qual estão registrados o nome da empresa proprietária, TAG ou placa do veículo, data do monitoramento e o resultado assinado pelo responsável técnico, conforme exemplo na figura 62.

Figura 62: Monitoramento de Fumaça Preta Realizado – Contratada Ápia

BMQ 6000 **Calibração**

Fabricante: Mensor
Modelo: Opacimetro Smoke Check 2000
Serial: 54.134
Fluxo: Opacimetro de Suco passivo

Calibração: 24/01/2025
Nº RMETRO: 15.727.063
Validade: 24/01/2026

Dados da Empresa

Nome: Construtora Ápia SA
Endereço: Rua Tito Cordeiro, nº 99, Pôrto, São Francisco
CNPJ: 17.755.291/0001-16
Telefone: (31) 36116.3621
E-mail: atendimento@grupapia.com.br

Operador: Amanda Silva

Dados do Cliente

Nome: CONSTRUTORA ÁPIA
Endereço: RUA TITO CORDEIRO Nº 99
Bairro: PIRARÉ
Cidade: BELLO HORIZONTE - MG
CEP: 30090-100
Telefone: (31) 3485.4300/3486-4275
CNPJ/CPF: 17.755.291/0001-16
E-mail: atendimento@grupapia.com.br

Dados do Veículo

Cadastrado pelo usuário

Marca: MERCEDES
Tipo: CABOTAGEM BASCULIA
Modelo: AXC 4164
Tempo Motor: 4 TEMPOS
Sistema de Alimentação: INJEÇÃO ELETRÔNICA
Combustível: DIESEL 510
Limite Marcha Livre: 530
Limite Rotação Corte: 2000
Limite Operação: 2,5
Limite Ruído: 85

Placa: RHM0003/ APR104 KM ou Horímetro: 8540 2810-0 Ano Fabricação: 2021

Dados do Ensaio

Início: 11/06/2025 15:00h Fim: 11/06/2025 15:30h

Ruído Ambiente: 6,00 Atmômetro: Acima de 300cm Temperatura Ambiente: 33,00°C

Aceleração	Rotação de Corte	Tempo	Opacidade Kim-15
1	0	0	0,53
2	0	0	0,50
3	0	0	0,50
4	0	0	0,50

Resultado Final

Média: 0,50

APROVADO

A tabela 25 indica o número de veículos monitorados no período (408 no total) e todos apresentaram resultados satisfatórios, conforme procedimentos supracitados.


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 25: Veículos Monitorados no Período

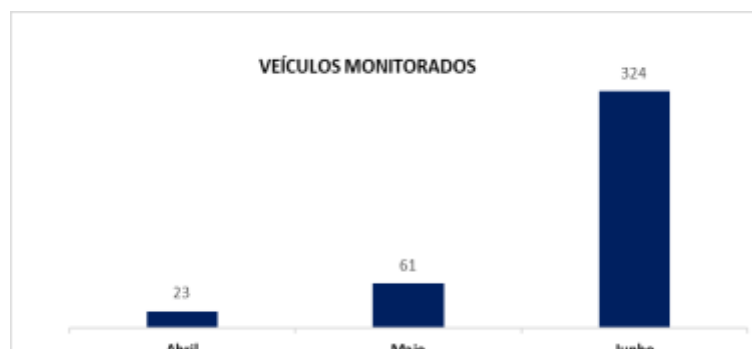

5.2.3.4 Resíduos Sólidos

O manejo adequado dos resíduos sólidos proporciona benefícios ambientais, considerando a redução da utilização e a necessidade de novos aterros sanitários, bem como a diminuição dos gastos com acondicionamento e transporte, menor uso dos recursos naturais, e menos riscos ambientais decorrentes desses resíduos.

Para identificação dos resíduos gerados nas obras de implantação do empreendimento, foram adotados os critérios da ABNT estabelecidos na NBR 10004/2004:

- **Classe I (perigosos):** aqueles que apresentam periculosidade ou uma das características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, ou constem nos anexos A ou B da referida Norma;
- **Classe IIA (não-inertes):** aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos Classe I – Perigosos, ou de resíduos Classe II B – Inertes. Os resíduos classe IIA podem ter propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água;
- **Classe IIB (inertes):** quaisquer resíduos que não tenham quaisquer de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. Além dos critérios estabelecidos pela ABNT, também devem ser considerados os critérios das Resoluções CONAMA nº 307/2002, 348/2004 e 431/2011, que abordam diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;
- **Classe A:** resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (construção, fabricação, entre outros);
- **Classe B:** resíduos recicláveis para outras destinações (plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, entre outros);
- **Classe C:** resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam sua reciclagem ou recuperação;
- **Classe D:** resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde.

O manuseio, a segregação, o acondicionamento e o transporte de resíduos por meio da coleta diferenciada possibilitam vantagens e benefícios sanitários, ambientais e econômicos. A correta identificação dos resíduos, assim como a descrição de suas

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



características, permite destinação de forma adequada. Tal identificação é realizada com base na Resolução CONAMA nº 275/2001, que define código de cores para os diferentes tipos de resíduos.

Isso favorece o manejo e assegura maior possibilidade de reciclagem dos materiais segregados, em função da não-contaminação por outros materiais, bem como a redução do volume de resíduos destinados à disposição em aterro sanitário.

Coletores específicos com cores padronizadas estão instalados em toda a área do Complexo do Germano, inclusive nas frentes de obras de descaracterização, de forma a garantir a efetiva gestão dos resíduos sólidos gerados (coleta seletiva). Nas áreas de maior geração de resíduos existem caçambas específicas, devidamente identificadas, para garantir o adequado acondicionamento e o posterior transporte.

A movimentação interna (transporte dos resíduos) é realizada diariamente, ou na frequência necessária, por equipe de limpeza contratada, treinada e autorizada para executar tal atividade. A coleta interna de resíduos é realizada utilizando caminhão *Brook*, *Munck* e/ou com carroceria. Os resíduos gerados no Complexo do Germano são transportados e destinados à Central de Materiais Descartáveis (CMD).

5.2.3.5 Central de Materiais Descartáveis (CMD)

A CMD está localizada dentro da área industrial do Complexo do Germano, portanto, com acesso restrito a pessoas autorizadas. Na chegada de caminhão à CMD, o resíduo é pesado e emitido um *ticket* para controle da geração e posterior elaboração do inventário de resíduos, conforme determina a legislação vigente.

A CMD conta com as estruturas: portaria de acesso, balança para pesagem de veículo e escritório administrativo. Também conta com sistema de combate a incêndio, no caso de eventual emergência. No local onde ocorre a triagem dos materiais, utiliza-se prensa hidráulica para compactação, seguida de enfardamento para posterior venda e reciclagem.

As figuras 63 e 64 mostram vistas gerais da Central de Triagem de Resíduos.

Figura 63: Balança da Portaria da Central de Materiais Descartáveis – CMD



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 64: Área de Triagem da Central de Materiais Descartáveis – CMD



Central de Triagem de Resíduos

Tem área coberta para que os resíduos fiquem ao abrigo de intempéries. Seu piso é concretado (impermeabilizado) e conta com sistema de drenagem segregado, direcionando os efluentes para sistema de tratamento específico.

Pátio de Compostagem

Ressalta-se que, após o rompimento da Barragem de Fundão, ainda não foram retomadas as atividades de compostagem. Os resíduos orgânicos, provenientes de restos de alimentos do restaurante e de restos de vegetais da jardinagem, eram direcionados ao pátio de compostagem, que atualmente está inoperante.

Desse modo, os resíduos orgânicos estão sendo destinados a aterro sanitário contratado e homologado para tal.

O piso em toda área do aterro é impermeabilizado, eliminando o contato do composto com o solo. Na lateral, possui área sem cobertura, destinada à disposição dos resíduos de jardinagem. O combate a vetores é realizado por empresa contratada e especializada no serviço de dedetização.

Depósito de Resíduos Oleosos (Classe I)

Os resíduos sólidos contaminados, provenientes da manutenção de máquinas pesadas e correias transportadoras, são recolhidos, transportados e armazenados no depósito de resíduos oleosos (Resíduos Classe I), sendo estes:

- ✓ Graxa lubrificante;
- ✓ EPIs contaminados com óleo e graxa;
- ✓ Serragem contaminada com óleo e graxa;
- ✓ Óleo lubrificante contaminado;
- ✓ Outros materiais contaminados.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



A borra de óleo drenada das máquinas é recolhida em bandejas para evitar o contato com o solo, e acondicionada em tambores, posteriormente encaminhados ao depósito citado.

O piso do depósito de resíduos oleosos é impermeabilizado segundo as especificações técnicas para armazenamento de produtos e resíduos perigosos. Também tem iluminação e força, o que permite ação de emergência à noite. Os acessos internos e externos são protegidos e mantidos, permitindo sua utilização sob quaisquer condições climáticas. Possui hidrantes para atuação no caso de risco de incêndio, bases de concreto denominadas 'baías', que impedem a lixiviação e a percolação de substâncias no solo e em águas subterrâneas, sistema de drenagem para captação de óleo e kits de absorventes para conter eventuais derramamentos.

Depósito de Resíduos Químicos

Neste depósito são acondicionados insumos de laboratório vencidos, produtos químicos vencidos, sucatas de baterias, lâmpadas queimadas, entre outros. Tem área coberta, sistema de ventilação para evitar o acúmulo de gases, sinalização de segurança em conformidade com as simbologias de riscos compatíveis com os produtos armazenados, bem como o controle de acesso de pessoas.

Área para Disposição de Resíduos Classe II

Cumpra-se destacar que os resíduos não-perigosos Classe I são armazenados de forma separada dos resíduos Classe II, em razão da possibilidade de a mistura resultante ser caracterizada como resíduo perigoso. O armazenamento de resíduos Classe II é realizado em contêineres, tambores, tanques e a granel, de forma segregada.

A ABNT NBR 11174/1990 regulamenta o armazenamento de resíduos Classe II e fixa as condições mínimas exigíveis para seu acondicionamento adequado, de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente.

Nota: As lâmpadas inservíveis são armazenadas em local seco e coberto, no espaço destinado aos resíduos perigosos. Os funcionários responsáveis pelo setor recebem orientação para que, em nenhuma hipótese, as lâmpadas sejam quebradas para armazenamento, pois esta operação acarreta risco ao operador, além da contaminação do local. No contato com lâmpadas quebradas é exigido o uso de avental e de luvas plásticas. Os cacos são coletados de forma a não ferir quem os manipula, e colocados em tambor metálico de 200 litros, devidamente lacrado. As lâmpadas inteiras, depois de acondicionadas em caixas, também são armazenadas em tambores de 200 litros, devidamente identificados na área de armazenamento de resíduos perigosos.

Contêiner para Acondicionamento de Resíduos Orgânicos

Quanto aos resíduos orgânicos e sanitários (não-recicláveis), estes são destinados ao contêiner existente na CMD, para posterior encaminhamento ao aterro sanitário operado por terceiros e devidamente licenciado.

Os procedimentos adotados pelas contratadas para a Gestão de Resíduos Sólidos se aplicam à coleta seletiva nas frentes de trabalho e à gestão para armazenamento temporário, recolhimento e destinação dos resíduos dos canteiros e das frentes de trabalho.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



As atividades que evidenciam a Gestão de Resíduos Sólidos são acompanhadas por Gerenciadora, através de Inspeções, *Blitz* Ambientais e evidências apresentadas, como o envio dos manifestos de geração, transporte e destinação dos resíduos, além dos registros de inspeções em campo. A tabela 26 apresenta o quantitativo de resíduos gerados pelas obras de descaracterização do Germano durante o período, separados por classe, sendo mais significativo o volume de resíduo orgânico.

Tabela 26: Quantitativo de Resíduos Gerados no Programa Descaracterização do Germano (TON) no Período

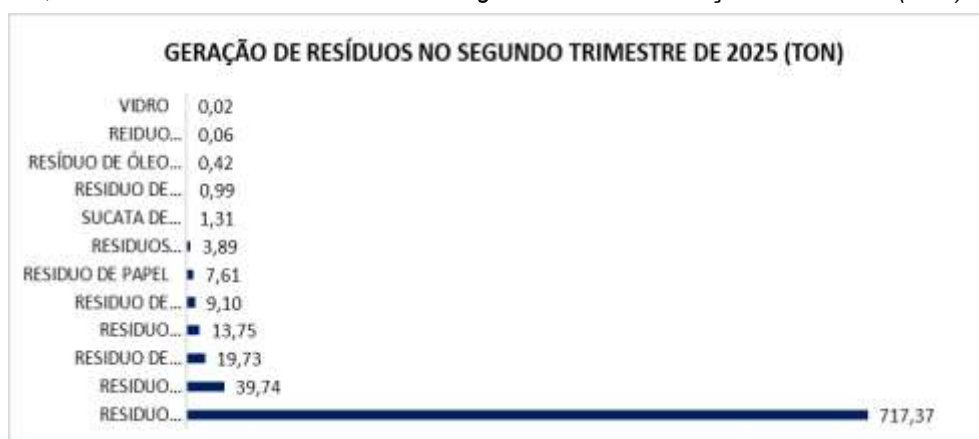

Os resíduos de construção civil são destinados a locais licenciados e homologados pela Samarco. Após a destinação, é solicitado que a empresa responsável evidencie as notas fiscais, bem como o manifesto de transporte, como demonstrado na figura 65.

Figura 65: Evidência de Manifesto de Transporte e Certificado de Destinação Final dos Resíduos

The figure displays three documents related to waste management:

- Manifesto de Transporte de Resíduos:** A form from the Brazilian Ministry of Environment (Ministério do Meio Ambiente) used for tracking the transport of waste. It includes fields for waste type, quantity, origin, and destination, along with a barcode and official stamps.
- Certificado de Destinação Final:** A document certifying the final destination of waste. It includes details about the waste, the receiving facility, and the responsible parties, with a signature and stamp.
- Certificado de Destinação Final (another instance):** A similar document, also certifying the final destination of waste, with its own set of details and official markings.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5.2.4 Descrição das Ações de Movimentação de Terra, Incluindo Localização e Caracterização das Áreas de Empréstimo e Bota-Fora Utilizadas (Item 1.3 – Subitem I-d do TR)

As áreas de empréstimos e as áreas de disposição de material excedente (ADMEs) utilizadas nas atividades de descaracterização da Cava do Germano (obras concluídas) e Barragem do Germano (obras vigentes) são apresentadas na tabela 27.

Tabela 27: Áreas de Empréstimo e Localização da ADME das Obras de Descaracterização

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO EMPRÉSTIMO	LOCALIZAÇÃO ADME
1	DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM DO GERMANO (Obras em andamento)	PDER Alegria Sul	DS 2 Regrade
		Pinheirinho	
		Ilha	
2	DESCARACTERIZAÇÃO CAVA DO GERMANO (Obras concluídas)	DP 5	DS 3/ DS 4 Regrade
		Portaria Mina Sul	
		Pilha Cônica da Filtragem	

5.2.4.1 Descaracterização da Barragem do Germano

Áreas de Empréstimo (obras em andamento)

Figura 66: Áreas de Empréstimo das Obras – Barragem do Germano



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

ADMEs (obras em andamento)

Figura 67: ADMEs das Obras – Barragem do Germano



5.2.4.2 Descaracterização da Cava do Germano (Obras Concluídas)

Áreas de Empréstimo

Figura 68: Áreas de Empréstimo das Obras – Cava do Germano



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



ADMEs

Figura 69: ADMEs das Obras – Cava do Germano




5.2.5 Apresentar Levantamentos Topográficos e Batimétricos, Quando Couber, da Barragem no Estado Atual das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem II do TR)

Levantamentos Topográficos

Os levantamentos topográficos do estado atual do empreendimento estão contemplados no Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico Obras Descaracterização Germano, na pasta “Anexo IV – Execução” do presente relatório.

Figura 70: Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico



Levantamentos Batimétricos

Este item não se aplica, pois no Complexo do Germano o curso d'água é superficial (não há reservatórios); assim sendo, não é possível realizar levantamentos batimétricos na Cava e na Barragem do Germano.

5.2.6 No Caso de Remoção do Maciço e do Reservatório, Apresentar as Medidas Adotadas Para a Execução Deste Procedimento e Um Quantitativo dos Materiais Retirados (Item 1.3 – Subitem III do TR)

Este item não se aplica, pois o Programa Descaracterização do Germano não prevê remoção dos maciços das estruturas, nem dos seus respectivos reservatórios.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL N°14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5.2.7 Apresentar as Medidas Adotadas Para a Redução do Nível do Lençol Freático no Reservatório, Quando Couber, Bem Como Informar o Seu Nível no Estágio Atual das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem IV do TR)

A primeira medida adotada foi o encerramento das operações de lançamento de rejeitos no reservatório, compreendendo, inclusive, a retirada das tubulações de rejeitos.

Nas regiões do reservatório onde havia acúmulo permanente de água (pontos mais baixos), foram projetados aterros de reconformação, de modo a preencher essas depressões e permitir a elevação da cota atual do terreno nesses pontos, formando as declividades previstas no projeto para as superfícies finais do reservatório e direcionando o fluxo de água aos canais de drenagem superficial na superfície final.

As figuras 71, 72 e 73 demonstram os pacotes de obras de reconformação superficial (*regrade*) concluídas para a Cava e Barragem do Germano.

Figura 71: Filtro do Cronograma das Obras do Regrade da Cava do Germano – Obras Concluídas

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5443-2023-06-18_RT.4.1.7_GCTM0 - Reconformação da Cava do Germano		100%	100%	276	08/03/22 A	08/12/22 A	08/03/22	08/12/22	08/03/22	08/05/23
5443A2685	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 1/11 (9,7%)	100%	100%	6	08/03/22 A	16/03/22 A	08/03/22	16/03/22	08/03/22	16/03/22
5443A2680	TÉRMINO DA MOBILIZAÇÃO REGRADE ETAPA 2	100%	100%	0		08/03/22 A		08/03/22		08/03/22
5443A2690	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 2/11 (9,7%)	100%	100%	11	17/03/22 A	02/04/22 A	17/03/22	02/04/22	17/03/22	02/04/22
5443A2695	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 3/11 (9,7%)	100%	100%	20	04/04/22 A	26/04/22 A	04/04/22	26/04/22	04/04/22	26/04/22
5443A2700	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 4/11 (9,7%)	100%	100%	13	26/04/22 A	10/05/22 A	26/04/22	10/05/22	26/04/22	10/05/22
5443A2705	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 5/11 (9,7%)	100%	100%	15	10/05/22 A	24/05/22 A	10/05/22	24/05/22	10/05/22	24/05/22
5443A2710	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 6/11 (9,7%)	100%	100%	5	25/05/22 A	30/05/22 A	25/05/22	30/05/22	25/05/22	30/05/22
5443A2715	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 7/11 (9,7%)	100%	100%	57	31/05/22 A	29/07/22 A	31/05/22	29/07/22	31/05/22	29/07/22
5443A2715W	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 7/11 (9,7%)	100%	100%	18	22/08/22 A	08/09/22 A	22/08/22	08/09/22	05/09/22	03/01/23
5443A2715M	MARCO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DE RECONFORMAÇÃO DA CAVA DE GERMANO	100%	0%	0		22/08/22 A		22/08/22		05/09/22
5443A2720	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 8/11 (9,7%)	100%	100%	31	08/09/22 A	11/10/22 A	08/09/22	11/10/22	03/01/23	11/02/23
5443A2725	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 9/11 (9,7%)	100%	100%	12	11/10/22 A	26/10/22 A	11/10/22	26/10/22	11/02/23	22/03/23
5443A2730	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 10/11 (9,7%)	100%	100%	11	26/10/22 A	11/11/22 A	26/10/22	11/11/22	22/03/23	28/04/23
5443A2735	RECONFORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA CAVA DE GERMANO_Parte 11/11 (3%)	100%	100%	19	09/11/22 A	09/12/22 A	09/11/22	09/12/22	28/04/23	08/05/23
5443-2023-06-18_RT.4.1.7.1 RECONFORMAÇÃO DA CAVA DO GERMANO (GCTM0) - MARCO DE TÉRMINO		0%	0%	0	09/12/22 A	09/12/22 A	09/12/22	09/12/22	08/05/23	08/05/23
5443A2740	Término Regrade da Cava do Germano	100%	100%	0		09/12/22 A		09/12/22		08/05/23

Figura 72: Filtro do Cronograma das Obras de Regrade da Barragem do Germano – Obras Etapa 1 Concluídas

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442-2023_03_19.4.4.3 EXECUÇÕES DAS OBRAS - ANO 1 (2020)		100%	100%	74	18/09/20 A	30/12/20 A	18/09/20	30/12/20	18/09/20	30/12/20
5442-2023_03_19.4.4.3.1 FREITE 1 - REGRADE ETAPA 1 (SUBÁREA 5442-24-02) - PACOTE G-C		100%	100%	74	18/09/20 A	30/12/20 A	18/09/20	30/12/20	18/09/20	30/12/20
5442-2023_03_19.4.4.4 EXECUÇÕES DAS OBRAS - ANO 2 (2021)		100%	100%	503	01/01/21 A	18/05/22 A	01/01/21	18/05/22	01/01/21	18/05/22
5442-2023_03_19.4.4.4.1 FREITE 1 - REGRADE ETAPA 1 (SUBÁREA 5442-24-02) - PACOTE G-C		100%	100%	503	01/01/21 A	18/05/22 A	01/01/21	18/05/22	01/01/21	18/05/22
5442-2023_03_19.4.4.4.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES		0%	0%	324	01/01/21 A	31/03/22 A	01/01/21	31/03/22	01/01/21	31/03/22
5442-2023_03_19.4.4.4.1.2 PREENCHIMENTO LAGO 1		100%	100%	200	02/01/21 A	11/08/21 A	02/01/21	11/08/21	02/01/21	11/08/21
5442-2023_03_19.4.4.4.1.3 PREENCHIMENTO DO LAGO 3		100%	100%	39	01/06/21 A	07/07/21 A	01/06/21	07/07/21	01/06/21	07/07/21
5442-2023_03_19.4.4.4.1.4 PREPARAÇÃO PARA PERÍODO CHUVOSO		100%	100%	61	01/09/21 A	07/12/21 A	01/09/21	07/12/21	01/09/21	07/12/21
5442-2023_03_19.4.4.4.1.5 INSTRUMENTAÇÃO		100%	100%	108	30/11/21 A	18/05/22 A	30/11/21	18/05/22	30/11/21	18/05/22
5442-2023_03_19.4.4.5 EXECUÇÕES DAS OBRAS - ANO 3 (2022)		100%	100%	256	09/06/21 A	08/04/22 A	09/06/21	08/04/22	09/06/21	08/04/22
5442-2023_03_19.4.4.5.1 FREITE 1 - REGRADE ETAPA 1 (SUBÁREA 5442-24-02) - PACOTE G-C		100%	100%	256	09/06/21 A	08/04/22 A	09/06/21	08/04/22	09/06/21	08/04/22
5442-2023_03_19.4.4.5.1.1 PREENCHIMENTO LAGO 2		100%	100%	23	07/03/22 A	08/04/22 A	07/03/22	08/04/22	07/03/22	08/04/22
5442-2023_03_19.4.4.5.1.2 PREENCHIMENTO DO LAGO 4		100%	100%	253	09/06/21 A	05/04/22 A	09/06/21	05/04/22	09/06/21	05/04/22

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 73: Filtro do Cronograma das Obras de Regrade da Barragem do Germano – Obras Etapa 2 Concluídas

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1	REGRADE ETAPA 2 (GCT010)	100%	100%	672	29/04/22 A	29/02/24 A	29/04/22	29/02/24	29/04/22	11/01/24
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.1	G1000 - GERAL	100%	100%	672	29/04/22 A	29/02/24 A	29/04/22	29/02/24	29/04/22	11/01/24
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.1.1	G100000 - MARCOS DO PROJETO	0%	0%	672	29/04/22 A	29/02/24 A	29/04/22	29/02/24	29/04/22	11/01/24
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.1.1.1	G1000 - GERAL	0%	0%	672	29/04/22 A	29/02/24 A	29/04/22	29/02/24	29/04/22	11/01/24
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.1.2	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100%	100%	668	02/05/22 A	29/02/24 A	02/05/22	29/02/24	02/05/22	11/01/24
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.2	ESCAVAÇÃO DO PÁTIO DE PILHAS	100%	100%	543	22/06/22 A	16/12/23 A	22/06/22	16/12/23	22/06/22	12/12/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.2.1	GERAL	100%	100%	290	22/06/22 A	29/05/23 A	22/06/22	29/05/23	22/06/22	09/09/22
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.2.2	TERRAPLENAGEM	100%	100%	515	19/07/22 A	16/12/23 A	19/07/22	16/12/23	19/07/22	14/10/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.2.3	DRENAGEM	100%	100%	130	12/06/23 A	16/12/23 A	12/06/23	16/12/23	12/06/23	02/12/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.2.4	PROTEÇÃO VEGETAL	100%	100%	116	25/04/23 A	19/08/23 A	25/04/23	19/08/23	31/05/23	12/12/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3	REGRADE - ETAPA 2	100%	100%	635	09/05/22 A	03/02/24 A	09/05/22	03/02/24	09/05/22	07/10/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.1	DIQUE AUXILIAR	100%	100%	368	23/08/22 A	26/08/23 A	23/08/22	26/08/23	17/08/22	17/08/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.1.1	GERAL	100%	100%	368	23/08/22 A	26/08/23 A	23/08/22	26/08/23	17/08/22	20/12/22
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.1.2	LAGO 2	100%	100%	320	04/10/22 A	20/08/23 A	04/10/22	20/08/23	15/09/22	17/08/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.2	BAIA 3	100%	100%	437	06/07/22 A	16/09/23 A	06/07/22	16/09/23	06/07/22	08/08/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.2.1	GERAL	100%	100%	387	15/08/22 A	16/09/23 A	15/08/22	16/09/23	23/08/22	17/12/22
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.2.2	LAGO 3	100%	100%	131	25/04/23 A	27/08/23 A	25/04/23	27/08/23	22/04/23	11/06/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.2.3	LAGO 4A & 4B	100%	100%	348	06/07/22 A	05/08/23 A	06/07/22	05/08/23	06/07/22	22/04/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.2.4	MONTANTE DA CRISTA DO DIQUE DA BAIA 3	100%	100%	237	02/01/23 A	26/08/23 A	02/01/23	26/08/23	26/03/23	08/08/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.3	SELA & TULIPA	100%	100%	635	09/05/22 A	03/02/24 A	09/05/22	03/02/24	09/05/22	07/10/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.3.1	GERAL	100%	100%	550	02/08/22 A	03/02/24 A	02/08/22	03/02/24	19/08/22	03/01/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.3.2	CANAL DE APROXIMAÇÃO	100%	100%	45	09/05/22 A	22/06/22 A	09/05/22	22/06/22	08/05/22	22/06/22
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.3.3	JUSANTE DIQUE AUXILIAR	100%	100%	67	02/08/22 A	07/10/22 A	02/08/22	07/10/22	28/03/23	07/10/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.3.4	CRISTA DO DIQUE DE SELA	100%	100%	183	05/12/22 A	16/09/23 A	06/12/22	16/09/23	23/06/23	26/09/23
5442_17-03-2024-LB-1.4.6.1.3.3.6	EMBOQUE CANAL DE APROXIMAÇÃO	100%	100%	154	28/03/23 A	27/08/23 A	28/03/23	27/08/23	07/04/23	01/05/23

Para as outras regiões da Barragem do Germano, a execução da etapa 3 de implantação dos demais aterros de reconformação (*regrade*) do reservatório encontra-se em andamento, avançadamente em relação ao planejamento executivo, conforme apresentado na figura 74.

Figura 74: Filtro do Cronograma do Estágio Atual das Obras do Regrade da Barragem – Etapa 3 (Obras Em andamento)

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442_22_06_2025.4.6.2	REGRADE ETAPA 3 (GCT011)	16,27%	54,01%	2438,754	14/02/22 A	18/10/28 A	14/02/22		14/02/22	08/05/28
5442_22_06_2025.4.6.2.1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100%	100%	1301,826	15/10/24 A	08/05/28 A	15/10/24		11/11/24	08/05/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2	REGRADE ETAPA 3	13,12%	52,38%	2438,754	14/02/22 A	18/10/28 A	14/02/22		14/02/22	09/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1	DIQUE AUXILIAR	23,52%	54,13%	2203,378	14/02/22 A	26/02/28 A	14/02/22		14/02/22	21/08/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.1	GERAL	0%	19,32%	1575,578	02/05/23 A	25/08/27 A	02/05/23		05/02/26	25/08/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.2	FERROVIA	30,35%	80,06%	1738,508	14/02/22 A	19/11/26 A	14/02/22		14/02/22	19/11/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.3	PINHEIRINHO	47,2%	64,49%	2004,204	23/05/22 A	17/11/27 A	23/05/22		23/05/22	12/06/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.4	LAGO 3	20,3%	26,46%	752,768	05/02/25 A	27/02/27 A	05/02/25		08/05/25	03/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.5	LAGO 1A	0%	100%	5,138	04/09/23 A	08/09/23 A	04/09/23	08/09/23	13/03/27	13/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.6	MONTANTE DA CRISTA DO DIQUE AUXILIAR	0%	43,1%	1150,378	02/01/25 A	26/02/28 A	02/01/25		02/04/27	21/08/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2	BAIA 3	8,87%	50,32%	2151,294	28/11/22 A	18/10/28 A	28/11/22		09/02/25	09/03/29
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.1	GERAL	0%	10,55%	1617,948	01/02/23 A	08/07/27 A	01/02/23		12/07/26	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.2	LAGO 3	40,38%	83,71%	2151,294	28/11/22 A	18/10/28 A	28/11/22		09/02/25	18/10/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.3	LAGO 4A & 4B	0%	76,08%	1593,074	11/07/23 A	20/11/27 A	11/07/23		25/06/25	20/11/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.4	BOMBAS	21,59%	36,47%	1965,628	01/12/22 A	18/04/28 A	01/12/22		09/02/25	23/10/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.5	MONTANTE DA CRISTA DO DIQUE DA BAIA 3	0%	24,61%	397,854	02/04/25 A	05/05/26 A	02/04/25		28/08/25	30/01/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.6	BAIA 3	0%	24,84%	1102,694	03/03/25 A	09/03/28 A	03/03/25		12/07/26	09/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3	JUSANTE DO DIQUE AUXILIAR (LESTE CANAL PRINCIPAL)	0%	54,01%	1207,528	08/11/22 A	28/02/26 A	08/11/22		25/06/25	03/10/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.1	GERAL	0%	80,16%	961,798	17/05/23 A	03/01/26 A	17/05/23		25/06/25	07/08/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.2	JUSANTE DIQUE AUXILIAR	0%	15,45%	184,794	20/05/25 A	28/02/26 A	20/05/25		23/07/26	03/10/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.3	CRISTA DO DIQUE AUXILIAR	0%	0%	88,744	23/09/25 A	26/02/26 A			03/06/26	01/10/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.4	ACESSO VALE DO FUNDO	0%	59,93%	1048,974	08/11/22 A	23/09/25 A	08/11/22		27/10/25	03/06/26
5442_22_06_2025.4.6.3	REGRADE ETAPAS 2 E 3 - MARCO DE TÉRMINO	0%	0%	2474,834	08/01/22 A	18/10/28 A	08/01/22		09/05/29	08/05/28

As superfícies finais dos reservatórios foram projetadas com caimentos em direção aos respectivos canais de drenagem, dispositivos que formam o sistema que conduz o fluxo das águas coletadas nas superfícies da Cava e Barragem até o Canal de Drenagem Principal da Barragem do Germano.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



O sistema de drenagem foi dimensionado para que não haja formação de lago permanente nas superfícies dos reservatórios. Importante ressaltar que as obras do sistema de drenagem da Cava do Germano foram concluídas (figura 75). Já as obras da Barragem do Germano estão em andamento (figura 76), conforme o planejamento executivo.

Figura 75: Filtro do Cronograma do CDP da Cava – Obras Concluídas

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5443_2023-06-18 RTA.1.1.2.2 G102001 - Canal de Drenagem Principal		100%	100%	365	16/11/21 A	31/05/23 A	16/11/21	31/05/23	16/11/21	24/12/22
544342480	TUNEL BALA - SOB RODOVIA MG 129	100%	100%	165	16/11/21 A	23/07/22 A	16/11/21	23/07/22	16/11/21	23/07/22
544342490	BACIA DE DISSIPAÇÃO SUPERIOR	100%	100%	65	25/04/22 A	23/07/22 A	25/04/22	23/07/22	25/04/22	23/07/22
544342490	BACIA DE DISSIPAÇÃO JAO LADO DA MG129 DISSIPADOR DE ENERGIA/BACIA DE CONTE	100%	100%	49	16/05/22 A	23/07/22 A	16/05/22	23/07/22	16/05/22	23/07/22
544342440	CANAL DE SAÍDA	100%	100%	20	15/06/22 A	23/07/22 A	15/06/22	23/07/22	15/06/22	23/07/22
544342495	REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIA TUBULAÇÕES DE GUAJAVO E BRUMAL	100%	100%	26	20/06/22 A	23/07/22 A	20/06/22	23/07/22	20/06/22	23/07/22
544342435	CANAL PERIFÉRICO INTERNO DA CAVA (CANAL SUPERIOR - SEÇÃO 4)	100%	100%	21	27/06/22 A	23/07/22 A	27/06/22	23/07/22	27/06/22	23/07/22
544342430	SERVIÇOS INICIAIS	100%	100%	0	01/07/22 A	01/07/22 A	01/07/22	01/07/22	01/07/22	01/07/22
544342455	GALERIAS SOB ACESSOS INTERNOS - JUSANTE DA BACIA DE DISSIPAÇÃO SUPERIOR E	100%	100%	8	13/07/22 A	23/07/22 A	13/07/22	23/07/22	13/07/22	23/07/22
544342430W	CANAL PERIFÉRICO INTERNO DA CAVA (CANAL SUPERIOR - SEÇÃO 4)	100%	100%	38	25/07/22 A	14/09/22 A	25/07/22	14/09/22	24/08/22	12/11/22
544342470	DRENAGEM TRAVESSIA RODOVIA - DESCIDA D'ÁGUA / DISSIPADOR (Saída conexão c-	100%	100%	173	25/07/22 A	28/04/23 A	25/07/22	28/04/23	23/08/22	03/11/22
544342490W	BACIA DE DISSIPAÇÃO SUPERIOR	100%	100%	41	28/07/22 A	23/08/22 A	28/07/22	23/08/22	28/07/22	13/10/22
544342495W	GALERIAS SOB ACESSOS INTERNOS - JUSANTE DA BACIA DE DISSIPAÇÃO SUPERIOR E	100%	100%	55	11/08/22 A	28/10/22 A	11/08/22	28/10/22	11/08/22	03/11/22
544342440W	CANAL DE SAÍDA	100%	100%	52	13/08/22 A	28/10/22 A	13/08/22	28/10/22	13/08/22	31/10/22
544342445	CANAL ATÉ O ACESSO INTERNO AO C2 (Conexão Bueiro Norte)	100%	100%	165	28/08/22 A	25/05/23 A	28/08/22	25/05/23	24/09/22	31/10/22
544342495W	REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIA TUBULAÇÕES DE GUAJAVO E BRUMAL	100%	100%	55	06/09/22 A	09/12/22 A	06/09/22	09/12/22	17/10/22	24/12/22
544342490W	BACIA DE DISSIPAÇÃO JAO LADO DA MG129 DISSIPADOR DE ENERGIA/BACIA DE CONTE	100%	100%	163	13/09/22 A	31/05/23 A	13/09/22	31/05/23	30/09/22	16/12/22
544342490W	TUNEL BALA - SOB RODOVIA MG 129	100%	100%	22	19/09/22 A	21/10/22 A	19/09/22	21/10/22	13/09/22	13/10/22
544342475	DRENAGEM TRAVESSIA RODOVIA	100%	100%	4	02/10/23 A	06/01/23 A	02/10/23	06/01/23	19/10/22	03/11/22

Figura 76: Filtro do Cronograma do CDP da Barragem (Obras Concluídas)

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442_22_12_2024.4.4 Descaracterização da Barragem do Germano (Reforço Barrage		100%	100%	1532,75d	18/09/20 A	28/11/24 A	18/09/20	28/11/24	18/09/20	30/09/23
5442_22_12_2024.4.4.3 EXECUÇÕES DAS OBRAS - ANO 1 (2020)		100%	100%	104,38d	18/09/20 A	31/12/20 A	18/09/20	31/12/20	18/09/20	31/12/20
5442_22_12_2024.4.4.3.2.2 FRETE 2 - CANAL DE DRENAGEM PRINCIPAL (SUBÁREA 5442-2)		100%	100%	104,38d	18/09/20 A	31/12/20 A	18/09/20	31/12/20	18/09/20	31/12/20
5442_22_12_2024.4.4.3.2.1 TERRAPLENAGEM - ESTACAS 8 A 30 - ETAPA 1 - (TRECHO E		100%	100%	73,69d	18/09/20 A	30/12/20 A	18/09/20	30/12/20	18/09/20	30/12/20
5442_22_12_2024.4.4.3.2.2 DRENAGEM SUPERFICIAL DAS BERMAS		100%	100%	34,13d	30/10/20 A	30/12/20 A	30/10/20	30/12/20	30/10/20	30/12/20
5442_22_12_2024.4.4.3.2.3 PROTEÇÃO VEGETAL		100%	100%	29,81d	09/11/20 A	31/12/20 A	09/11/20	31/12/20	09/11/20	31/12/20
5442_22_12_2024.4.4.4 EXECUÇÕES DAS OBRAS - ANO 2 (2021)		100%	100%	741,63d	02/01/21 A	13/01/23 A	02/01/21	13/01/23	02/01/21	16/12/22
5442_22_12_2024.4.4.4.2 FRETE 2 - CANAL DE DRENAGEM PRINCIPAL (SUBÁREA 5442-2)		100%	100%	741,63d	02/01/21 A	13/01/23 A	02/01/21	13/01/23	02/01/21	16/12/22
5442_22_12_2024.4.4.4.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	34,31d	03/04/21 A	25/05/21 A	03/04/21	25/05/21	03/04/21	25/05/21
5442_22_12_2024.4.4.4.2.2 TERRAPLENAGEM - TRECHO 1 - ENTRE EST. 8 E EST. 32 - ET		100%	100%	107,94d	02/01/21 A	16/05/21 A	02/01/21	16/05/21	02/01/21	16/05/21
5442_22_12_2024.4.4.4.2.3 TERRAPLENAGEM - TRECHO 2 - ENTRE EST. 32 E EST. 40		100%	100%	214,94d	16/04/21 A	29/11/21 A	16/04/21	29/11/21	16/04/21	29/11/21
5442_22_12_2024.4.4.4.2.4 TERRAPLENAGEM - TRECHO 3 - ENTRE EST. 40 E EST. 50		100%	100%	190,78d	13/05/21 A	01/12/21 A	13/05/21	01/12/21	13/05/21	01/12/21
5442_22_12_2024.4.4.4.2.5 ESTRUTURA DE CONCRETO DO EXTRAVASOR NORTE - TREC		100%	100%	253,69d	20/03/21 A	08/04/22 A	20/03/21	08/04/22	20/03/21	08/04/22
5442_22_12_2024.4.4.4.2.6 ESTRUTURA DE CONCRETO DO EXTRAVASOR NORTE - TREC		100%	100%	393,63d	01/06/21 A	13/01/23 A	01/06/21	13/01/23	01/06/21	17/10/22
5442_22_12_2024.4.4.4.2.7 DRENAGEM SUPERFICIAL DAS BERMAS		100%	100%	305,06d	25/01/21 A	05/05/22 A	25/01/21	05/05/22	25/01/21	05/05/22
5442_22_12_2024.4.4.4.2.8 PROTEÇÃO VEGETAL		100%	100%	379,13d	13/05/21 A	29/11/22 A	13/05/21	29/11/22	13/05/21	16/12/22
5442_22_12_2024.4.4.5 EXECUÇÕES DAS OBRAS - ANO 3 (2022)		100%	100%	919,13d	25/10/21 A	02/05/24 A	25/10/21	02/05/24	25/10/21	31/12/22
5442_22_12_2024.4.4.5.2 FRETE 2 - CANAL DE DRENAGEM PRINCIPAL (SUBÁREA 5442-2)		100%	100%	919,13d	25/10/21 A	02/05/24 A	25/10/21	02/05/24	25/10/21	31/12/22
5442_22_12_2024.4.4.5.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	113,19d	14/03/22 A	12/07/22 A	14/03/22	12/07/22	14/03/22	12/07/22
5442_22_12_2024.4.4.5.2.2 TERRAPLENAGEM - TRECHO 4 - ENTRE EST. 50 E EST. 59		100%	100%	324,25d	25/10/21 A	07/11/22 A	25/10/21	07/11/22	25/10/21	06/12/22
5442_22_12_2024.4.4.5.2.3 TERRAPLENAGEM TRECHO 5 - ENTRE EST. 0 E EST. 8		100%	100%	405,46d	11/07/22 A	20/08/23 A	11/07/22	20/08/23	11/07/22	05/10/22
5442_22_12_2024.4.4.5.2.4 ESTRUTURA DE CONCRETO DO CANAL PRINCIPAL DE DREN		100%	100%	613,55d	14/03/22 A	18/11/23 A	14/03/22	18/11/23	14/03/22	19/12/22
5442_22_12_2024.4.4.5.2.5 ESTRUTURA DE CONCRETO DO EXTRAVASOR NORTE - TREC		100%	100%	459,06d	07/06/22 A	09/09/23 A	07/06/22	09/09/23	07/06/22	30/12/22
5442_22_12_2024.4.4.5.2.6 ESTRUTURA DE CONCRETO DO EXTRAVASOR NORTE - TREC		100%	100%	389,06d	23/08/22 A	16/09/23 A	23/08/22	16/09/23	15/09/22	26/12/22
5442_22_12_2024.4.4.5.2.7 ESTRUTURA DE CONCRETO DO EXTRAVASOR NORTE - BACI		100%	100%	294,78d	21/11/22 A	02/09/23 A	21/11/22	02/09/23	15/10/22	31/12/22
5442_22_12_2024.4.4.5.2.8 DRENAGEM SUPERFICIAL DAS BERMAS		100%	100%	205,56d	05/06/22 A	17/04/23 A	06/06/22	17/04/23	06/06/22	30/12/22
5442_22_12_2024.4.4.5.2.9 PROTEÇÃO VEGETAL		100%	100%	68,38d	10/01/24 A	02/05/24 A	10/01/24	02/05/24	16/09/22	16/12/22
5442_22_12_2024.4.4.6 EXECUÇÕES DAS OBRAS - ANO 4 (2023)		100%	100%	738,69d	21/11/22 A	28/11/24 A	21/11/22	28/11/24	31/03/23	30/09/23
5442_22_12_2024.4.4.6.2 FRETE 2 - EXTRAVASOR NORTE (SUBÁREA 5442-24-03)		100%	100%	738,69d	21/11/22 A	28/11/24 A	21/11/22	28/11/24	31/03/23	30/09/23
5442_22_12_2024.4.4.6.2.1 ESTRUTURA DE CONCRETO DO EXTRAVASOR NORTE - BACI		100%	100%	237,50d	19/09/23 A	16/09/24 A	19/09/23	16/09/24	12/04/23	30/09/23
5442_22_12_2024.4.4.6.2.2 ESTRUTURA DE CONCRETO DO CANAL PRINCIPAL DE DREN		100%	100%	310,36d	21/11/22 A	20/03/24 A	21/11/22	20/03/24	10/04/23	30/05/23
5442_22_12_2024.4.4.6.2.3 TERRAPLENAGEM - TRECHO 4 - ENTRE EST. 50 E EST. 59		100%	100%	185,50d	11/04/23 A	20/08/23 A	11/04/23	20/08/23	21/03/23	30/04/23
5442_22_12_2024.4.4.6.2.4 ESTRUTURA DE CONCRETO DO EXTRAVASOR NORTE - TREC		100%	100%	405,31d	02/03/23 A	10/04/24 A	02/03/23	10/04/24	05/04/23	19/09/23
5442_22_12_2024.4.4.6.2.5 ESTRUTURA DE CONCRETO DO EXTRAVASOR NORTE - TREC		100%	100%	164,54d	28/11/22 A	05/09/23 A	28/11/22	05/09/23	19/05/23	23/06/23
5442_22_12_2024.4.4.6.2.8 DRENAGEM SUPERFICIAL DAS BERMAS		100%	100%	398,37d	17/04/23 A	28/11/24 A	17/04/23	28/11/24	02/05/23	30/09/23

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Nota: Devido às condições geológicas no local onde foi implantada a bacia final do canal de drenagem principal, houve a necessidade de obras adicionais para a estabilização dos taludes no entorno da bacia. Em função disso, as obras adicionais em questão foram executadas em 2023 e as obras da bacia final e drenagem superficial das bermas implantadas em 2024.

Na Barragem do Germano, sob os canais de drenagem do reservatório, foi concebido um sistema de drenagem de subsuperfície composto de materiais granulares naturais (areia e britas), dispostos conforme sua granulometria, de modo a captar eventuais saturações sob os canais, além de eliminar subpressões. Esse sistema de drenagem interna conduzirá o efluente coletado até o canal principal da barragem.

A figura 77 apresenta o atual estágio das obras na superfície do reservatório da Barragem do Germano (em andamento) e no Vale do Fundão (concluídas).

Figura 77: Filtro do Cronograma do Estágio Atual das Obras de Drenagem – Regrade da Barragem e Vale do Fundão

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442_22_06_2025.4.5	Descaracterização do Dique de Solinha, Solia/Tulipa e Preenchimento	100%	100%	995,75d	11/04/22 A	31/12/24 A	11/04/22	31/12/24	11/04/22	03/06/25
5442_22_06_2025.4.5.1	G1000 - GERAL	100%	100%	7,81d	11/07/22 A	16/07/22 A	11/07/22	16/07/22	11/07/22	16/07/22
5442_22_06_2025.4.5.1.3	ADME	100%	100%	7,81d	11/07/22 A	16/07/22 A	11/07/22	16/07/22	11/07/22	16/07/22
5442_22_06_2025.4.5.2	ÁREA 5442-24 - BARRAGEM DO GERMANO	100%	100%	892,75d	23/07/22 A	31/12/24 A	23/07/22	31/12/24	13/08/22	10/04/25
5442_22_06_2025.4.5.2.1	SUBÁREA 5442-24-05 - BERMA DE REFORÇO SELINHA	100%	100%	784,50d	08/11/22 A	31/12/24 A	08/11/22	31/12/24	20/05/23	10/04/25
5442_22_06_2025.4.5.2.1.1	GERAL	100%	100%	150,68d	22/02/23 A	30/09/23 A	22/02/23	30/09/23	20/05/23	27/08/23
5442_22_06_2025.4.5.2.1.5	DRENAGEM	100%	100%	784,50d	08/11/22 A	31/12/24 A	08/11/22	31/12/24	18/08/23	10/04/25
5442_22_06_2025.4.5.2.2	SUBÁREA 5442-24-04 - BERMA DE REFORÇO SELA E TULIPA	100%	100%	89,75d	23/07/22 A	15/12/22 A	23/07/22	15/12/22	13/08/22	30/10/22
5442_22_06_2025.4.5.2.2.2	BERMA DE PROTEÇÃO	100%	100%	89,75d	23/07/22 A	15/12/22 A	23/07/22	15/12/22	13/08/22	30/10/22
5442_22_06_2025.4.5.3	ÁREA 5442-30 - EIXO 1	100%	100%	995,75d	11/04/22 A	31/12/24 A	11/04/22	31/12/24	11/04/22	03/06/25
5442_22_06_2025.4.5.3.1	SUBÁREA 5442-30-01 - EIXO 1 E REGIÃO A MONTANTE	100%	100%	995,75d	11/04/22 A	31/12/24 A	11/04/22	31/12/24	11/04/22	03/06/25
5442_22_06_2025.4.5.3.1.1	GERAL	100%	100%	77,60d	30/05/22 A	22/07/22 A	30/05/22	22/07/22	30/05/22	22/07/22
5442_22_06_2025.4.5.3.1.2	MONTANTE DO COLCHÃO DRENANTE	100%	100%	385,13d	11/04/22 A	11/04/23 A	11/04/22	11/04/23	11/04/22	29/10/22
5442_22_06_2025.4.5.3.1.3	EIXO 1 (DIQUE E REGIÃO DO COLCHÃO DRENANTE)	100%	100%	121,12d	15/08/23 A	24/11/23 A	15/08/23	24/11/23	14/05/23	10/10/23
5442_22_06_2025.4.5.3.1.4	DRENAGEM	100%	100%	826,75d	27/09/22 A	31/12/24 A	27/09/22	31/12/24	04/04/23	03/06/25
5442_22_06_2025.4.5.3.1.5	CANAL OMBREIRA DIREITA E ESQUERDA	100%	100%	210,36d	29/05/23 A	16/04/24 A	29/05/23	16/04/24	16/05/23	10/10/23
5442_22_06_2025.4.6	Regrade - Etapas 2 E 3	95,16%	01,67%	1534,50d	09/05/22 A	25/08/27	09/05/22	09/05/22	09/05/22	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.1	REGRADE ETAPA 2 (GCT01D)	100%	100%	635,50d	09/05/22 A	03/02/24 A	09/05/22	03/02/24	09/05/22	02/12/23
5442_22_06_2025.4.6.1.2	ESCAVAÇÃO DO PATIO DE PILHAS	100%	100%	133,44d	12/06/23 A	22/12/23 A	12/06/23	22/12/23	13/03/23	02/12/23
5442_22_06_2025.4.6.1.3	REGRADE - ETAPA 2	100%	100%	635,50d	09/05/22 A	03/02/24 A	09/05/22	03/02/24	09/05/22	01/05/23
5442_22_06_2025.4.6.1.3.3	SELA E TULIPA	100%	100%	635,50d	09/05/22 A	03/02/24 A	09/05/22	03/02/24	09/05/22	01/05/23
5442_22_06_2025.4.6.1.3.3.1	GERAL	100%	100%	550,50d	02/08/22 A	03/02/24 A	02/08/22	03/02/24	24/08/22	03/01/23
5442A6590	IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA - CANAL DE APROXIMAÇÃO	100%	100%	266,63d	15/08/22 A	16/09/23 A	15/08/22	16/09/23	29/08/22	30/11/22
5442_22_06_2025.4.6.1.3.3.1.4	DRENAGEM	100%	100%	550,50d	02/08/22 A	03/02/24 A	02/08/22	03/02/24	24/08/22	03/01/23
5442_22_06_2025.4.6.1.3.3.1.4.1	CANAL DE APROXIMAÇÃO	100%	100%	550,50d	02/08/22 A	03/02/24 A	02/08/22	03/02/24	24/08/22	30/12/22
5442_22_06_2025.4.6.1.3.3.1.4.2	CANAL SECUNDÁRIO	100%	100%	222,01d	17/05/23 A	22/01/24 A	17/05/23	22/01/24	26/09/22	03/01/23
5442_22_06_2025.4.6.1.3.3.2	CANAL DE APROXIMAÇÃO	100%	100%	45,31d	09/05/22 A	22/06/22 A	09/05/22	22/06/22	09/05/22	22/06/22
5442_22_06_2025.4.6.1.3.3.6	EMBOQUE CANAL DE APROXIMAÇÃO	100%	100%	754,13d	28/03/23 A	27/08/23 A	28/03/23	27/08/23	07/04/23	01/05/23
5442_22_06_2025.4.6.2	REGRADE ETAPA 3 (GCT01F)	0%	59,13%	1665,89d	01/02/23 A	25/08/27	01/02/23		25/06/25	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2	REGRADE ETAPA 3	0%	59,13%	1665,89d	01/02/23 A	25/08/27	01/02/23		25/06/25	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1	DIQUE AUXILIAR	0%	21,79%	865,25d	05/03/25 A	25/08/27	05/03/25		02/04/27	25/08/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.1	GERAL	0%	21,79%	865,25d	05/03/25 A	25/08/27	05/03/25		02/04/27	25/08/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.1.3	DRENAGEM	0%	21,79%	865,25d	05/03/25 A	25/08/27	05/03/25		02/04/27	25/08/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.1.3.1	CANAL PRINCIPAL	0%	35,16%	447,26d	04/04/25 A	14/07/26	04/04/25		02/04/27	14/07/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.1.3.2	CANAL SECUNDÁRIO	0%	12,25%	865,25d	05/03/25 A	25/08/27	05/03/25		02/04/27	25/08/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2	BAISA 3	0%	10,55%	1617,34d	01/02/23 A	08/07/27	01/02/23		12/07/26	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.1	GERAL	0%	10,55%	1617,34d	01/02/23 A	08/07/27	01/02/23		12/07/26	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.1.1	DRENAGEM	0%	10,55%	1617,34d	01/02/23 A	08/07/27	01/02/23		12/07/26	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.1.1.1	CANAL PRINCIPAL	0%	26,99%	1409,56d	01/02/23 A	12/12/26	01/02/23		12/07/26	13/12/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.1.1.2	CANAL SECUNDÁRIO	0%	0%	196,88d	12/12/26	08/07/27			13/12/27	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3	JUSANTE DO DIQUE AUXILIAR (LESTE CANAL PRINCIPAL)	0%	97,87%	779,38d	17/05/23 A	05/07/25	17/05/23		25/06/25	12/04/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.1	GERAL	0%	97,87%	779,38d	17/05/23 A	05/07/25	17/05/23		25/06/25	12/04/26
5442A7030	CANAL DE APROXIMAÇÃO - TOP SOIL E PROTEÇÃO VEGETAL	0%	100%	172,60d	17/05/23 A	27/10/23 A	17/05/23	27/10/23	25/06/25	05/02/26
5442A7130	EMBOQUE CANAL DE APROXIMAÇÃO - TOP SOIL E PROTEÇÃO	0%	100%	127,57d	12/06/23 A	07/10/23 A	12/06/23	07/10/23	05/02/26	17/03/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.1.2	DRENAGEM	0%	84,08%	99,84d	31/03/25 A	05/07/25	31/03/25		12/01/26	12/04/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.3.1.2.1	CANAL SECUNDÁRIO	0%	84,08%	99,84d	31/03/25 A	05/07/25	31/03/25		12/01/26	12/04/26

Para implantação dos aterros nas diferentes regiões da superfície da Barragem do Germano foi necessário estabelecer setorização para o reservatório, em função das condições de capacidade de suporte das superfícies dos rejeitos depositados. Conforme apresentado na figura 78 a seguir, a setorização considerou a capacidade de suporte frente

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




à trafegabilidade dos equipamentos e à elevação do nível de água local. De modo geral, a capacidade de suporte pode ser favorável ou desfavorável, com nível de água abaixo da superfície, ou acima do terreno.

Finalmente, destaca-se a execução de aterros experimentais (concluídos), de modo a avaliar os diferentes comportamentos dos rejeitos dispostos no reservatório, em função dos equipamentos previstos na obra, bem como a geração de poro-pressões e as vibrações induzidas pelos equipamentos de transporte e terraplenagem.

A projetista formalizou orientações construtivas a partir dos resultados obtidos nos testes e recomendou a instalação de diferentes instrumentos para acompanhamento da obra e monitoramento geotécnico durante o período construtivo, a saber: piezômetros elétricos (excesso de poro-pressões); indicadores de nível de água (variação do nível); e, finalmente, placas de recalque (possível desenvolvimento de recalques).

Figura 78: Mapeamento das Áreas Setorizadas em Função da Capacidade de Suporte da Fundação



Legenda:

- Área Tipo 1 (polígono azul): Fundação com capacidade de suporte favorável para início de preparação da praça para compactação;
- Área Tipo 2 (polígono laranja): Fundação com capacidade de suporte desfavorável para início de preparação da praça para compactação;
- Área Tipo 3 (polígono magenta): Fundação com capacidade de suporte desfavorável para início de preparação da praça para compactação, com espessura do aterro de reconformação abaixo do aterro de conquista;
- Área Tipo 4 (polígono amarelo): Escavação no rejeito arenoso no canal de aproximação, ou travessias com variação de 50cm até 200cm, com preenchimento dos materiais de transição.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5.2.8 Apresentar Análises de Estabilidade nas Condições Drenada e Não-Drenada, e Levando em Consideração as Solicitações Sísmicas Que Possam Atuar Sobre a Estrutura, Avaliando as Resistências de Pico e Residual Para a Geometria da Barragem na Atual Etapa da Obra (Item 1.3 – Subitem V do TR)

Nota: Os Fatores de Segurança mínimos a serem atendidos são de 1,5 para rupturas drenadas; 1,5 para rupturas não-drenadas na situação de pico, e 1,1 na situação residual. Ressalta-se que estes valores poderão ser revisados conforme as diretrizes técnicas emanadas de órgãos regulamentadores competentes.

As análises de estabilidade no período estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

Barramento Principal da Barragem do Germano:

- ✓ G102400-O-2RT513_R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT514_R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT515_R00_Jun_25.

Cava do Germano:

- ✓ G102600-O-2RT098-R00_Abr_25;
- ✓ G102600-O-2RT099-R00_Mai_25;
- ✓ G102600-O-2RT100-R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 4 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 79: Recomendação 4 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

04	Apresentar os relatórios contemplando os estudos de análises de estabilidade relativos à Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), à Barragem do Eixo 1, e à Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios contemplando os estudos de análises de estabilidade referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

Barramento Principal da Barragem do Germano:

- ✓ G102400-O-2RT457_R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT458_R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT459_R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT510_R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT511_R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT512_R00_Mar_25.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Cava do Germano:

- ✓ G102600-O-2RT091-R00_Out_24;
- ✓ G102600-O-2RT092-R00_Nov_24;
- ✓ G102600-O-2RT093-R00_Dez_24;
- ✓ G102600-O-2RT095-R00_Jan_25;
- ✓ G102600-O-2RT096-R00_Fev_25;
- ✓ G102600-O-2RT097-R00_Mar_25.

5.2.9 Apresentar o Andamento das Medidas de Estabilização e/ou Reforço Para Atingir no Mínimo os Fatores de Segurança Estabelecidos no item V, Bem Como das Medidas de Contingências Adotadas Caso a Estabilidade da Estrutura Durante as Obras Não Possa Ser Garantida (Item 1.3 – Subitem VI do TR)

Para as referidas medidas, visando a atingir 1,5 para condição drenada; 1,5 para condição não-drenada de pico; e 1,1 para a condição residual, informa-se:

- Todas as estruturas que integram o Programa Descaracterização do Germano possuem declaração de estabilidade, a saber: Barragem do Germano, incluindo as estruturas auxiliares Dique Sela Tulipa e Dique Selinha; e Cava do Germano. As declarações são apresentadas na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório.

Andamento das medidas de reforço/estabilização:

- Cava do Germano: a berma de reforço prevista no projeto de descaracterização foi concluída em abril de 2023;
- Barragem do Germano: a berma de reforço prevista no projeto de descaracterização foi concluída em agosto de 2022.

5.2.10 Apresentar o Andamento das Obras (Item 1.3 – Subitem VII)

a) Remoção das infraestruturas associadas à Barragem, exceto aquelas destinadas à garantia da segurança da estrutura (Item 1.3 – Subitem VII-a)

5.2.10.1 Obras da Cava do Germano (Concluídas – Histórico)

Após a paralisação das operações em novembro de 2015, a Samarco realizou as obras para remoção da infraestrutura associada ao recebimento de rejeitos, tais como espigotes e tubulações, que alimentavam a Cava do Germano.

Na sequência, em atendimento ao projeto técnico aprovado para a descaracterização da Cava do Germano, foram executadas as obras de plugagem da galeria, remoções de interferências (incluindo parte da correia transportadora, edifícios, galerias, vias de acesso interno e linhas de energia interna que estavam instaladas dentro da projeção da

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



construção da berma de reforço) e supressão vegetal. As figuras 80, 81 e 82 apresentam os respectivos cronogramas das obras e dos serviços concluídos.

Figura 80: Cava do Germano – Plugagem da Galeria – Obras Concluídas

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5443_2023-06-18_RT.4.1.1_GCB01 - Plugagem da galeria da Cava do Germano		100%	100%	255	05/03/20 A	16/11/20 A	05/03/20	16/11/20	05/03/20	16/11/20
5443_2023-06-18_RT.4.1.1.1 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO		100%	100%	103	05/03/20 A	16/06/20 A	05/03/20	16/06/20	05/03/20	16/06/20
5443A2235 MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO - PLUGAGEM DA GALERIA DA CAVA		100%	100%	103	05/03/20 A	16/06/20 A	05/03/20	16/06/20	05/03/20	16/06/20
5443A2240 AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETOMADA DA MOBILIZAÇÃO		100%	100%	1	27/04/20 A	27/04/20 A	27/04/20	27/04/20	27/04/20	27/04/20
5443_2023-06-18_RT.4.1.1.2 SUBÁREA 5443-26-04 - PLUGAGEM DA GALERIA		100%	100%	116	03/05/20 A	16/11/20 A	03/05/20	16/11/20	03/05/20	16/11/20
5443A2245 EXECUÇÃO DA PLUGAGEM		100%	100%	116	03/05/20 A	16/11/20 A	03/05/20	16/11/20	03/05/20	16/11/20

Figura 81: Cava do Germano – Remoção de Interferências – Obras Concluídas

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5443_2023-06-18_RT.4.1.2_GCB1 - Remoção de Interferências da Cava do Germano		100%	100%	312	14/07/20 A	22/05/21 A	14/07/20	22/05/21	14/07/20	21/05/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.2.1 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO		100%	100%	33	14/07/20 A	16/08/20 A	14/07/20	16/08/20	14/07/20	16/08/20
5443A2160 AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INÍCIO DA MOBILIZAÇÃO		100%	100%	0	14/07/20 A		14/07/20		14/07/20	
5443A2165 MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO - REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS DA CAVA		100%	100%	23	14/07/20 A	16/08/20 A	14/07/20	16/08/20	14/07/20	16/08/20
5443_2023-06-18_RT.4.1.2.2 SUBÁREA 5443-26-01 - REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS		100%	100%	267	28/08/20 A	22/05/21 A	28/08/20	22/05/21	28/08/20	21/05/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.2.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	13	08/09/20 A	25/09/20 A	08/09/20	25/09/20	08/09/20	25/09/20
5443A2170 EXECUÇÃO DE ACESSOS DE OBRA E ÁREAS DE DESCARGA		100%	100%	13	08/09/20 A	25/09/20 A	08/09/20	25/09/20	08/09/20	25/09/20
5443_2023-06-18_RT.4.1.2.2.2 DESMONTAGEM		100%	100%	156	28/08/20 A	21/05/21 A	28/08/20	21/05/21	28/08/20	21/05/21
5443A2175 EXECUÇÃO DA REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E DESTINAÇÃO DE MATERIAIS		100%	100%	156	28/08/20 A	21/05/21 A	28/08/20	21/05/21	28/08/20	21/05/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.2.2.3 OBRAS CIVIS E TERRAPLENAGEM		100%	100%	60	07/12/20 A	17/03/21 A	07/12/20	17/03/21	07/12/20	17/03/21
5443A2180 OBRAS CIVIS - BASES E FUNDACÕES NOVAS		100%	100%	60	07/12/20 A	17/03/21 A	07/12/20	17/03/21	07/12/20	17/03/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.2.2.4 MONTAGEM ELETROMECÂNICA		100%	100%	206	28/10/20 A	22/05/21 A	28/10/20	22/05/21	28/10/20	21/05/21
5443A2190 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO		100%	100%	113	28/10/20 A	05/05/21 A	28/10/20	05/05/21	28/10/20	05/05/21
5443A2195 IMPLANTAÇÃO TRECHO NOVO DA ADUTORA GUALAND		100%	100%	70	05/01/21 A	27/04/21 A	05/01/21	27/04/21	05/01/21	27/04/21
5443A2200 MONTAGEM DE FIBRA ÓPTICA PARA RELOCAÇÃO DE LINHA EXISTENTE		100%	100%	71	05/01/21 A	28/04/21 A	05/01/21	28/04/21	05/01/21	28/04/21
5443A2185 MONTAGEM DO NOVO PAINEL DE COMUNICAÇÃO		100%	100%	22	01/02/21 A	09/03/21 A	01/02/21	09/03/21	01/02/21	09/03/21
5443A2205 MONTAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA 13,8KV		100%	100%	30	18/02/21 A	06/04/21 A	18/02/21	06/04/21	18/02/21	06/04/21
5443A2210 CONCLUSÃO DA REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS DA CAVA DO GERMANO		100%	100%	0		22/05/21 A		22/05/21		21/05/21

Figura 82: Cava do Germano – Supressão Vegetal – Serviços Concluídos

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5443_2023-06-18_RT.4.1.3_GCB2 - Supressão vegetal da Cava do Germano		100%	100%	432	17/12/20 A	22/04/22 A	17/12/20	22/04/22	17/12/20	22/04/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.3.1 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO		0%	0%	49	17/12/20 A	03/02/21 A	17/12/20	03/02/21	17/12/20	03/02/21
5443A2215 MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO PARA INÍCIO DA SUPRESSÃO VEGETAL		100%	100%	49	17/12/20 A	03/02/21 A	17/12/20	03/02/21	17/12/20	03/02/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.3.2 SUBÁREA 5443-26-02 - BERMA DE REFORÇO DA CAVA		100%	100%	71	18/01/21 A	22/01/21 A	18/01/21	22/01/21	18/01/21	22/01/21
5443A2220 SUPRESSÃO VEGETAL PARA IMPLANTAÇÃO ADUTORA - GUALAND		100%	100%	2	18/01/21 A	22/01/21 A	18/01/21	22/01/21	18/01/21	22/01/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.3.3 SUBÁREA 5443-26-03 - EXTRAVASO DEFINITIVO DA CAVA		100%	100%	239	26/04/21 A	22/04/22 A	26/04/21	22/04/22	26/04/21	22/04/22
5443A2225 EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO - BACIA CHICO		100%	100%	239	26/04/21 A	22/04/22 A	26/04/21	22/04/22	26/04/21	22/04/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.3.4 SUPRESSÃO VEGETAL (GCB2) - MARCO DE TÉRMINO		0%	0%	0	22/04/22 A	22/04/22 A	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22
5443A2230 Término de Supressão Vegetal		100%	100%	0		22/04/22 A		22/04/22		22/04/22

5.2.10.2 Obras da Barragem do Germano

A Barragem do Germano e suas estruturas associadas, Dique Sela Tulipa e Dique Selinha, não recebem disposição de rejeitos desde 2013. Após a paralisação das operações em novembro de 2015, a Samarco realizou as obras de remoção da infraestrutura associada ao recebimento de rejeitos (espigotes e tubulações), que alimentavam a Barragem do Germano.

Em atendimento ao projeto técnico aprovado para a descaracterização da Barragem do Germano, foram executadas as obras de remoção de interferências e os serviços de supressão vegetal para implantação do Canal de Drenagem Principal (CDP) e execução das obras do *regrade* da Barragem (incluindo a região do Pinheirinho). As figuras 83 e 84 apresentam os respectivos cronogramas das obras e serviços concluídos.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 83: Barragem do Germano – Remoção de Interferências – Obras Concluídas

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442-2023_03_19.4.2	Remoção de Interferências da Barragem do Germano (SC01A) (Eq)	100%	100%	04	27/04/20 A	21/08/20 A	27/04/20	21/08/20	27/04/20	21/08/20
5442-2023_03_19.4.2.1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	100%	100%	14	27/04/20 A	16/05/20 A	27/04/20	16/05/20	27/04/20	16/05/20
5442A2030	MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO - REMOÇÃO INTERFER	100%	100%	14	27/04/20 A	16/05/20 A	27/04/20	16/05/20	27/04/20	16/05/20
5442-2023_03_19.4.2.2	SUBÁREA 5442-24-03 - CANAL DE DRENAGEM DEFINITIVO	100%	100%	65	26/05/20 A	21/08/20 A	26/05/20	21/08/20	26/05/20	21/08/20
5442A1910	REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS NO EXTRAVASOR (ÁREA INFLUENCI	100%	100%	65	26/05/20 A	21/08/20 A	26/05/20	21/08/20	26/05/20	21/08/20
5442-2023_03_19.4.2.3	SUBÁREA 5442-24-02 - REGRADE ETAPA 1	100%	100%	19	27/07/20 A	21/08/20 A	27/07/20	21/08/20	27/07/20	21/08/20
5442A1990	REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS REGRADE - PINHEIRINHO	100%	100%	19	27/07/20 A	21/08/20 A	27/07/20	21/08/20	27/07/20	21/08/20

Figura 84: Barragem do Germano – Supressão Vegetal – Serviços Concluídos

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442-2023_03_19.4.1	Supressão vegetal (GCT02)	100%	100%	177	22/02/21 A	06/11/21 A	22/02/21	06/11/21	22/02/21	06/11/21
5442-2023_03_19.4.1.1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	100%	100%	31	22/02/21 A	10/04/21 A	22/02/21	10/04/21	22/02/21	10/04/21
5442A2370	MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO PARA INICIO DA SUPRI	100%	100%	31	22/02/21 A	10/04/21 A	22/02/21	10/04/21	22/02/21	10/04/21
5442-2023_03_19.4.1.2	SUBÁREA 5442-24-03 - CANAL DE DRENAGEM DEFINITIVO	100%	100%	79	23/02/21 A	21/06/21 A	23/02/21	21/06/21	23/02/21	21/06/21
5442A2360	SUPRESSÃO VEGETAL - EXTRAVASOR	100%	100%	79	23/02/21 A	21/06/21 A	23/02/21	21/06/21	23/02/21	21/06/21
5442-2023_03_19.4.1.3	SUBÁREA 5442-49-01 - TOLD / PÁTIO - ETAPA 1 (Contrato da Cava - JM)	100%	100%	135	26/04/21 A	05/11/21 A	26/04/21	05/11/21	26/04/21	05/11/21
5442A2380	EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO VEGETAL - TOLD/PÁTIO	100%	100%	135	26/04/21 A	05/11/21 A	26/04/21	05/11/21	26/04/21	05/11/21
5442-2023_03_19.4.1.4	SUPRESSÃO VEGETAL (JM) - MARCO DE TÉRMINO	0%	0%	0	06/11/21 A	06/11/21 A	06/11/21	06/11/21	06/11/21	06/11/21
5442A8870	Tam. Supressão Vegetal	100%	100%	0	06/11/21 A	06/11/21 A	06/11/21	06/11/21	06/11/21	06/11/21

b) Reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais e subterrâneas para o reservatório (Item 1.3 – Subitem VII-b)

As medidas para redução e/ou eliminação do aporte de águas superficiais e subterrâneas na Cava e Barragem do Germano são apresentadas no subitem 5.2.7 do presente relatório.

As obras para cada estrutura podem ser resumidas da seguinte forma:

5.2.10.3 Cava do Germano (Histórico)

- Reconformação (*regrade*) do reservatório: Obras concluídas;
- Canal de drenagem principal: Obras concluídas;
- Drenagem subsuperficial da berma de reforço: Obras concluídas;
- Sistema de drenagem superficial – canais periféricos e de superfície do reservatório; canaletas e canais das ombreiras esquerda e direita do barramento principal; canaletas e canais da berma de reforço; e bueiro sob a rodovia MG-129: Obras concluídas.

5.2.10.4 Barragem do Germano

- Reconformação (*regrade*) do reservatório: Obras das etapas 1 e 2 concluídas; obras da etapa 3 em andamento (lagos preenchidos);
- Canal de drenagem principal: Setores 1, 2, 3 e 4, bem como a bacia final, concluídos;
- Drenagem passiva do barramento principal: Obras concluídas;
- Drenagens subsuperficiais (ramais principais e secundários): Obras concluídas;
- Sistema de drenagem superficial: Canais de aproximação do CDP, Vale do Fundão e das ombreiras esquerda e direita do Eixo 1 concluídos. Canais superficiais do *regrade* e canais das ombreiras do barramento principal com obras em andamento.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5.2.10.5 Plano de chuvas e dispositivos provisórios:

A Samarco utiliza sistemas de drenagem (definitivo e provisório) para manejo das águas superficiais. O manejo é apresentado nos Anexos 4.2 (Manejo das Águas) e 4.3 (Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024-2025) na pasta “Anexo IV – Execução” do presente relatório.

Figura 85: Anexos 4.2 (Manejo das Águas) e 4.3 (Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024-2025)



c) Garantir a estabilidade física e química de longo prazo das estruturas que permanecerem no local (Item 1.3 – Subitem VII-c)

5.2.10.6 Cava do Germano (Histórico)

As obras para garantir a estabilidade física e química de longo prazo da Cava do Germano foram concluídas no início de junho de 2023, e são apresentadas na figura 86.

Figura 86: Filtro Cronograma das Obras Necessárias para Descaracterização da Cava (Serviços e Obras Concluídos)

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5443_2023-06-18_RT.4.1DESCARACTERIZAÇÃO DA CAVA DO GERMANO (GCT01A)		100%	100%	1184	06/03/20 A	02/06/23 A	06/03/20	02/06/23	06/03/20	08/05/23
5443_2023-06-18_RT.4.1.1 GCB01 - Plugagem da galeria da Cava do Germano		100%	100%	255	06/03/20 A	16/11/20 A	06/03/20	16/11/20	06/03/20	16/11/20
5443_2023-06-18_RT.4.1.1.1 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO		100%	100%	103	06/03/20 A	16/06/20 A	06/03/20	16/06/20	06/03/20	16/06/20
5443_2023-06-18_RT.4.1.1.2 SUBÁREA 5443-26-04 - PLUGAGEM DA GALERIA		100%	100%	116	03/06/20 A	16/11/20 A	03/06/20	16/11/20	03/06/20	16/11/20
5443_2023-06-18_RT.4.1.2 GCB1 - Remoção de interferências da Cava do Germano		100%	100%	312	14/07/20 A	22/05/21 A	14/07/20	22/05/21	14/07/20	21/05/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.2.1 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO		100%	100%	33	14/07/20 A	16/08/20 A	14/07/20	16/08/20	14/07/20	16/08/20
5443_2023-06-18_RT.4.1.2.2 SUBÁREA 5443-26-01 - REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS		100%	100%	267	28/08/20 A	22/05/21 A	28/08/20	22/05/21	28/08/20	21/05/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.3 GCB2 - Supressão vegetal da Cava do Germano		100%	100%	492	17/12/20 A	22/04/22 A	17/12/20	22/04/22	17/12/20	22/04/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.3.1 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO		0%	0%	49	17/12/20 A	03/02/21 A	17/12/20	03/02/21	17/12/20	03/02/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.3.2 SUBÁREA 5443-26-02 - BERMAS DE REFORÇO DA CAVA		100%	100%	2	18/01/21 A	22/01/21 A	18/01/21	22/01/21	18/01/21	22/01/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.3.3 SUBÁREA 5443-26-03 - EXTRAVASOR DEFINITIVO DA CAVA		100%	100%	236	26/04/21 A	22/04/22 A	26/04/21	22/04/22	26/04/21	22/04/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.3.4 SUPRESSÃO VEGETAL (GCT02) - MARCO DE TÉRMINO		0%	0%	0	22/04/22 A	22/04/22 A	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.4 G1000 - Geral - Mobilizações		100%	100%	684	23/06/21 A	08/05/23 A	23/06/21	08/05/23	23/06/21	25/07/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.4.1 G10000 - MARCOS DO PROJETO		0%	0%	0	23/06/21 A	23/06/21 A	23/06/21	23/06/21	23/06/21	23/06/21
5443_2023-06-18_RT.4.1.4.2 INSPEÇÃO, LIBERAÇÃO E TRANSPORTE		0%	0%	0	16/01/23 A	16/01/23 A	16/01/23	16/01/23	25/07/22	25/07/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.4.3 G10000 - MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E DESMOBILIZAÇÃO		100%	100%	572	23/06/21 A	16/01/23 A	23/06/21	16/01/23	23/06/21	25/07/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.4.4 G1000 - GERAL - MARCO DE TÉRMINO		0%	0%	0	08/05/23 A	08/05/23 A	08/05/23	08/05/23	25/07/22	25/07/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.5 Túnel Bala - Sob Ferrovia		100%	100%	340	25/10/21 A	29/09/22 A	25/10/21	29/09/22	25/10/21	31/10/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.6 Tamponamento Túnel Bala - Existente		100%	100%	27	08/08/22 A	14/09/22 A	08/08/22	14/09/22	01/10/22	13/11/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.7 GCT01D - Reforma da Cava do Germano		100%	100%	276	08/03/22 A	09/12/22 A	08/03/22	09/12/22	08/03/22	08/05/23
5443_2023-06-18_RT.4.1.8 G1026 - Barramento da Cava do Germano		100%	100%	627	13/09/21 A	02/06/23 A	13/09/21	02/06/23	13/09/21	23/12/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.8.1 G102602 - Berra de reforço da Cava		100%	100%	627	13/09/21 A	02/06/23 A	13/09/21	02/06/23	13/09/21	23/12/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.8.2 G102601 - Canal de Drenagem Principal		100%	100%	365	16/11/21 A	31/05/23 A	16/11/21	31/05/23	16/11/21	24/12/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.8.3 G1026 - Cava do Germano - Marco de Término		100%	100%	4	23/05/23 A	02/06/23 A	23/05/23	02/06/23	17/12/22	23/12/22
5443_2023-06-18_RT.4.1.9 GCT01A - Marco de Término da Descaracterização da Cava do Germano		0%	0%	0	02/06/23 A	02/06/23 A	02/06/23	02/06/23	23/12/22	23/12/22

5.2.10.7 Barragem do Germano

As obras para garantir a estabilidade física e química de longo prazo estão em curso.

A Barragem do Germano é composta de barramento principal, estruturas associadas (diques Sela Tulipa e Selinha), seu próprio reservatório e o novo Canal de Drenagem Principal (CDP).

Dentre os componentes da Barragem do Germano descaracterizados ao longo de 2024 se destacam as estruturas associadas Dique Sela Tulipa (Apêndice I) e Dique Selinha

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

(Apêndice II), situados na região nordeste do reservatório da Barragem do Germano, no flanco voltado para o Vale do Fundão. Estes diques limitam o reservatório do Germano nas selas topográficas na região posterior do vale.

Estabilidade Física

As obras referentes à implantação da berma de reforço em enrocamento do barramento principal foram concluídas em agosto de 2022, conforme apresentado na figura 87.

Figura 87: Berma de Reforço e Retaludamento do Barramento Principal – Etapas Concluídas



Berma de Reforço do Barramento Principal

O cronograma das obras de descaracterização do Barramento Principal da Barragem do Germano é apresentado na figura 88.

Figura 88: Cronograma das Obras da Berma de Reforço do Barramento Principal (Obras Concluídas)

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442_17-03-2024-TACA.4.4.4.4-FRONT 4 - BERMA DE REFORÇO DA BARRAGEM PRINCIPAL (SUBÁREA 1)		100%	100%	152.13d	10/01/22 A	10/06/22 A	10/01/22	10/06/22	10/01/22	10/06/22
5442_17-03-2024-TACA.4.4.4.4.1 EXECUÇÃO DO ACESSO AO PÉ DE GERMANO		100%	100%	16.00d	10/01/22 A	02/02/22 A	10/01/22	02/02/22	10/01/22	02/02/22
5442A5190 EXECUÇÃO DE ACESSO AO PÉ DE GERMANO		100%	100%	16.00d	10/01/22 A	02/02/22 A	10/01/22	02/02/22	10/01/22	02/02/22
5442_17-03-2024-TACA.4.4.4.4.2 BERMA DE FECHAMENTO		100%	100%	191.26d	11/01/22 A	10/06/22 A	11/01/22	10/06/22	11/01/22	10/06/22
5442A5200 LIMPEZA DE SOLO SUPERFICIAL		100%	100%	9.88d	11/01/22 A	24/01/22 A	11/01/22	24/01/22	11/01/22	24/01/22
5442A5210 APLICAÇÃO DE CAMADA DE TRANSIÇÃO EM AREIA		100%	100%	111.31d	31/01/22 A	22/06/22 A	31/01/22	22/06/22	31/01/22	22/06/22
5442A5220 APLICAÇÃO DE CAMADA DE TRANSIÇÃO EM BRITA		100%	100%	110.31d	31/01/22 A	22/06/22 A	31/01/22	22/06/22	31/01/22	22/06/22
5442A5230 EXECUÇÃO DE BERMA EM BLOCO ROCHOSO		100%	100%	150.63d	07/02/22 A	22/07/22 A	07/02/22	22/07/22	07/02/22	22/07/22
5442A5230W EXECUÇÃO DE BERMA EM BLOCO ROCHOSO		100%	100%	17.00d	25/07/22 A	10/08/22 A	25/07/22	10/08/22	25/07/22	10/08/22
5442_17-03-2024-TACA.4.4.4.4.3 INSTRUMENTAÇÃO		100%	100%	53.36d	02/05/22 A	23/06/22 A	02/05/22	23/06/22	02/05/22	23/06/22
5442A5240 INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO		100%	100%	53.36d	02/05/22 A	23/06/22 A	02/05/22	23/06/22	02/05/22	23/06/22

Controle Hidráulico

Nas áreas do *Regrade*, indicadas nas figuras 89 e 90, o projeto de descaracterização estabelece a implantação de superfícies suavemente inclinadas voltadas para um sistema de canais de drenagem superficial especificamente concebido para coletar e transportar o fluxo decorrente da precipitação máxima provável (PMP) até o canal de aproximação do

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Regrade e, em seguida, até o emboque do Canal de Drenagem Principal (CDP) da descaracterização da Barragem do Germano.

Como referência, a área total do reservatório da Barragem do Germano é de 2.963.806 m².

Figura 89: Vista Geral do Reservatório da Barragem do Germano (Obras Etapa 3 Em Andamento)



Figura 90: Visão do Regrade nas Regiões do Dique Auxiliar e Baía 3 (Obras Em Andamento)



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Obras do Regrade

Figura 91: Cronograma das Obras do Regrade do Reservatório da Barragem do Germano

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442_22_06_2025	Descaracterização Barragem Germano - 22-06-2025	51.61%	72.46%	2952.754	18/05/20 A	18/10/20	18/05/20		18/05/20	08/05/25
5442_22_06_2025.4	CONSTRUÇÃO	51.61%	72.46%	2952.754	18/05/20 A	18/10/20	18/05/20		18/05/20	08/05/25
5442_22_06_2025.4.4	Descaracterização da Barragem do Germano (Reforço Barragem)	100%	100%	607.696	18/05/20 A	18/05/22 A	18/05/20	18/05/22	18/05/20	18/05/22
5442_22_06_2025.4.4.1	EXECUÇÃO DAS OBRAS - ANO 1 (2020)	100%	100%	73.636	18/05/20 A	30/12/20 A	18/05/20	30/12/20	18/05/20	30/12/20
5442_22_06_2025.4.4.1.1	FRENTE 1 - REGRADE ETAPA 1 (SUBÁREA 5442-24-02) - PACOTE G-1	100%	100%	73.636	18/05/20 A	30/12/20 A	18/05/20	30/12/20	18/05/20	30/12/20
5442_22_06_2025.4.4.1.1.1	PRELIMINARES	0%	0%	324.000	01/01/21 A	31/03/22 A	01/01/21	31/03/22	01/01/21	31/03/22
5442_22_06_2025.4.4.1.1.2	PREENCHIMENTO LAGO 1	100%	100%	199.696	02/01/21 A	11/08/21 A	02/01/21	11/08/21	02/01/21	11/08/21
5442_22_06_2025.4.4.1.1.3	PREENCHIMENTO DO LAGO 3	100%	100%	38.814	01/06/21 A	07/07/21 A	01/06/21	07/07/21	01/06/21	07/07/21
5442_22_06_2025.4.4.1.1.4	PREPARAÇÃO PARA PERÍODO CHUVOSO	100%	100%	61.304	01/09/21 A	07/12/21 A	01/09/21	07/12/21	01/09/21	07/12/21
5442_22_06_2025.4.4.1.1.5	INSTRUMENTAÇÃO	100%	100%	108.384	30/11/21 A	18/05/22 A	30/11/21	18/05/22	30/11/21	18/05/22
5442_22_06_2025.4.4.5	EXECUÇÃO DAS OBRAS - ANO 3 (2022)	100%	100%	255.944	09/06/21 A	08/04/22 A	09/06/21	08/04/22	09/06/21	08/04/22
5442_22_06_2025.4.4.5.1	FRENTE 1 - REGRADE ETAPA 1 (SUBÁREA 5442-24-02) - PACOTE G-1	100%	100%	255.944	09/06/21 A	08/04/22 A	09/06/21	08/04/22	09/06/21	08/04/22
5442_22_06_2025.4.4.5.1.1	PREENCHIMENTO LAGO 2	100%	100%	23.234	07/03/22 A	08/04/22 A	07/03/22	08/04/22	07/03/22	08/04/22
5442_22_06_2025.4.4.5.1.2	PREENCHIMENTO DO LAGO 4	100%	100%	253.254	09/06/21 A	05/04/22 A	09/06/21	05/04/22	09/06/21	05/04/22
5442_22_06_2025.4.5	Descaracterização do Dique de Selinha, Seta/Tulpa e Preenchimento	100%	79.04%	1063.394	26/11/22 A	26/10/25	26/11/22		14/10/23	05/01/25
5442_22_06_2025.4.5.1	SUBÁREA 5442-36-01 - REGRADE ETAPA 1D - TERRAPLENAGEM	100%	79.04%	1063.394	26/11/22 A	26/10/25	26/11/22		14/10/23	05/01/25
5442_22_06_2025.4.5.1.1	REGRADE ETAPA 2 (GCT01D)	100%	100%	671.294	29/04/22 A	29/02/24 A	29/04/22	29/02/24	29/04/22	11/01/24
5442_22_06_2025.4.5.1.1.1	GERAL	100%	100%	671.294	29/04/22 A	29/02/24 A	29/04/22	29/02/24	29/04/22	11/01/24
5442_22_06_2025.4.5.1.1.2	ESCAVAÇÃO DO PÁTIO DE FILAS	100%	100%	548.506	22/06/22 A	22/12/23 A	22/06/22	22/12/23	22/06/22	12/12/23
5442_22_06_2025.4.5.1.1.2.1	GERAL	100%	100%	250.314	22/06/22 A	29/05/23 A	22/06/22	29/05/23	22/06/22	09/09/22
5442_22_06_2025.4.5.1.1.2.2	TERRAPLENAGEM	100%	100%	915.254	19/07/22 A	16/12/23 A	19/07/22	16/12/23	19/07/22	14/10/23
5442_22_06_2025.4.5.1.1.2.3	DRENAGEM	100%	100%	133.444	12/06/23 A	22/12/23 A	12/06/23	22/12/23	13/03/23	02/12/23
5442_22_06_2025.4.5.1.1.2.4	PROTEÇÃO VEGETAL	100%	100%	116.506	25/04/23 A	19/06/23 A	25/04/23	19/06/23	31/05/23	12/12/23
5442_22_06_2025.4.5.1.2	REGRADE - ETAPA 2	100%	100%	636.506	09/05/22 A	03/02/24 A	09/05/22	03/02/24	09/05/22	07/10/23
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1	DIQUE AUXILIAR	100%	100%	368.314	23/08/22 A	26/08/23 A	23/08/22	26/08/23	17/08/22	17/08/23
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.1	GERAL	100%	100%	368.314	23/08/22 A	26/08/23 A	23/08/22	26/08/23	17/08/22	20/12/22
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.2	LAGO 2	100%	100%	320.006	04/10/22 A	20/08/23 A	04/10/22	20/08/23	15/09/22	17/08/23
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.3	BAIA 3	100%	100%	437.064	06/07/22 A	16/09/23 A	06/07/22	16/09/23	06/07/22	08/08/23
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.3.1	GERAL	100%	100%	397.064	15/08/22 A	16/09/23 A	15/08/22	16/09/23	25/09/22	17/12/22
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.3.2	LAGO 3	100%	100%	130.814	25/04/23 A	27/08/23 A	25/04/23	27/08/23	22/04/23	11/06/23
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.3.3	LAGO 4A & 4B	100%	100%	347.506	06/07/22 A	05/08/23 A	06/07/22	05/08/23	06/07/22	22/04/23
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.3.4	MONTANTE DA CRISTA DO DIQUE DA BAIA 3	100%	100%	236.564	02/01/23 A	26/08/23 A	02/01/23	26/08/23	26/03/23	09/08/23
5442_22_06_2025.4.5.1.3.1	SELA & TULPA	100%	100%	636.506	09/05/22 A	03/02/24 A	09/05/22	03/02/24	09/05/22	07/10/23
5442_22_06_2025.4.5.1.3.1.1	GERAL	100%	100%	590.506	02/08/22 A	02/08/22 A	02/08/22	03/02/24	19/08/22	03/01/23
5442_22_06_2025.4.5.1.3.1.2	CANAL DE APROXIMAÇÃO	100%	100%	45.314	09/05/22 A	22/06/22 A	09/05/22	22/06/22	09/05/22	22/06/22
5442_22_06_2025.4.5.1.3.1.3	JUSANTE DIQUE AUXILIAR	100%	100%	66.754	02/08/22 A	07/10/22 A	02/08/22	07/10/22	26/03/23	07/10/23
5442_22_06_2025.4.5.1.3.1.4	CRISTA DO DIQUE DE SELA	100%	100%	182.506	06/12/22 A	16/09/23 A	06/12/22	16/09/23	23/06/23	26/09/23
5442_22_06_2025.4.5.1.3.1.5	EMBOQUE CANAL DE APROXIMAÇÃO	100%	100%	154.134	20/03/23 A	27/08/23 A	20/03/23	27/08/23	07/04/23	01/05/23
5442_22_06_2025.4.6.2	REGRADE ETAPA 3 (GCT01F)	16.27%	54.01%	2438.754	14/02/22 A	18/10/20	14/02/22		14/02/22	06/05/25
5442_22_06_2025.4.6.2.1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100%	100%	1.801.808	15/10/24 A	08/05/26	15/10/24		11/11/24	08/05/25
5442_22_06_2025.4.6.2.2	REGRADE ETAPA 3	13.12%	52.28%	2438.754	14/02/22 A	18/10/20	14/02/22		14/02/22	08/05/25
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1	DIQUE AUXILIAR	23.82%	54.13%	2503.374	14/02/22 A	26/02/20	14/02/22		14/02/22	21/06/20
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.1	GERAL	0%	19.32%	1575.574	02/05/23 A	25/08/27	02/05/23		05/02/26	25/08/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.2	FERROVIA	30.35%	90.06%	1739.506	14/02/22 A	19/11/26	14/02/22		14/02/22	19/11/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.3	PINHEIRINHO	47.2%	64.48%	2004.294	23/05/22 A	17/11/27	23/05/22		23/05/22	12/06/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.4	LAGO 2	20.3%	26.46%	752.764	05/02/25 A	27/03/27	05/02/25		08/05/26	03/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.5	LAGO 1A	0%	100%	5.134	04/09/23 A	09/09/23 A	04/09/23	09/09/23	13/03/27	13/03/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.1.6	MONTANTE DA CRISTA DO DIQUE AUXILIAR	0%	43.1%	1150.374	02/01/25 A	25/02/28	02/01/25		02/04/27	21/08/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2	BAIA 3	8.07%	50.32%	2151.294	28/11/22 A	18/10/20	28/11/22		09/02/25	09/03/25
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.1	GERAL	0%	10.25%	1617.944	01/02/23 A	08/07/27	01/02/23		12/07/26	12/07/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.2	LAGO 3	40.38%	63.71%	2151.294	28/11/22 A	18/10/20	28/11/22		09/02/25	16/06/26
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.3	LAGO 4A & 4B	0%	76.0%	1993.074	11/07/23 A	20/11/27	11/07/23		25/06/26	20/11/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.4	BOMBIA	21.59%	36.47%	1965.624	01/12/22 A	18/04/29	01/12/22		09/02/26	23/10/28
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.5	MONTANTE DA CRISTA DO DIQUE DA BAIA 3	0%	24.61%	397.954	02/04/25 A	05/05/26	02/04/25		28/09/26	30/01/27
5442_22_06_2025.4.6.2.2.2.6	BAIA 3	0%	24.84%	1102.694	03/03/25 A	09/03/28	03/03/25		12/07/26	08/03/29
5442_22_06_2025.4.6.2.3	JUSANTE DO DIQUE AUXILIAR (LESTE CANAL PRINCIPAL)	0%	54.01%	1207.524	09/11/22 A	28/02/26	09/11/22		25/06/25	03/10/26
5442_22_06_2025.4.6.2.3.1	GERAL	0%	80.16%	961.794	17/05/23 A	03/01/26	17/05/23		25/06/25	07/08/26
5442_22_06_2025.4.6.2.3.2	JUSANTE DIQUE AUXILIAR	0%	15.49%	184.794	20/05/25 A	28/02/26	20/05/25		23/07/26	03/10/26
5442_22_06_2025.4.6.2.3.3	CRISTA DO DIQUE AUXILIAR	0%	0%	88.744	23/09/25	26/02/26			03/06/26	01/10/26
5442_22_06_2025.4.6.2.3.4	ACESSO VALE DO FUNDÃO	0%	59.53%	1049.974	08/11/22 A	23/09/25	08/11/22		27/10/25	03/06/26
5442_22_06_2025.4.6.3	REGRADE ETAPAS 2 E 3 - MARCO DE TÉRMINO	0%	0%	0.000	18/10/20	18/10/20			08/05/29	08/05/29

5.2.11 Apresentar a Análise dos Resultados das Inspeções Visuais Realizadas na Estrutura no Período Avaliado em Relação às Obras de Descaracterização, Informando a Periodicidade das Inspeções (Item 1.3 – Subitem VIII do TR)

Nota: Deverão ser apresentadas as medidas adotadas para corrigir as anomalias registradas durante as inspeções visuais, inclusive aquelas iniciadas em períodos anteriores ao do relatório apresentado, até sua efetiva conclusão.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



As análises dos resultados das inspeções visuais realizadas no período estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

Barramento Principal da Barragem do Germano:

- ✓ G102400-O-2RT513_R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT514_R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT515_R00_Jun_25.

Cava do Germano:

- ✓ G102600-O-2RT098-R00_Abr_25;
- ✓ G102600-O-2RT099-R00_Mai_25;
- ✓ G102600-O-2RT100-R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 5 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 92: Recomendação 5 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

05	Apresentar os relatórios de inspeção mensais relativos à Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), à Barragem do Eixo 1, e à Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	---	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios contemplando as inspeções visuais referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

Barramento Principal da Barragem do Germano:

- ✓ G102400-O-2RT457_R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT458_R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT459_R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT510_R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT511_R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT512_R00_Mar_25.

Cava do Germano:

- ✓ G102600-O-2RT091-R00_Out_24;
- ✓ G102600-O-2RT092-R00_Nov_24;
- ✓ G102600-O-2RT093-R00_Dez_24;
- ✓ G102600-O-2RT095-R00_Jan_25;
- ✓ G102600-O-2RT096-R00_Fev_25;
- ✓ G102600-O-2RT097-R00_Mar_25.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5.2.12 Apresentar as Leituras da Instrumentação Instalada na Barragem, Informando a Periodicidade Adotada Para as Leituras e a Relação dos Níveis Registrados Pelos Instrumentos Com os Níveis de Controle de Segurança Estabelecidos Para a Estrutura (Item 1.3 – Subitem IX do TR)

As leituras da instrumentação no período instaladas estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

Barramento Principal da Barragem do Germano:

- ✓ G102400-O-2RT513_R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT514_R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT515_R00_Jun_25.

Cava do Germano:

- ✓ G102600-O-2RT098-R00_Abr_25;
- ✓ G102600-O-2RT099-R00_Mai_25;
- ✓ G102600-O-2RT100-R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 6 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 93: Recomendação 6 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

06	Apresentar os relatórios técnicos contendo as leituras da instrumentação instalada na Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), na Barragem do Eixo 1, e na Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios técnicos contemplando as leituras da instrumentação instalada, referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

Barramento Principal da Barragem do Germano:

- ✓ G102400-O-2RT457_R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT458_R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT459_R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT510_R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT511_R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT512_R00_Mar_25.

Cava do Germano:

- ✓ G102600-O-2RT091-R00_Out_24;
- ✓ G102600-O-2RT092-R00_Nov_24;
- ✓ G102600-O-2RT093-R00_Dez_24;
- ✓ G102600-O-2RT095-R00_Jan_25;
- ✓ G102600-O-2RT096-R00_Fev_25;
- ✓ G102600-O-2RT097-R00_Mar_25.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5.2.13 Apresentar as Leituras e a Avaliação de Desempenho da Instrumentação Empregada Especificamente, Caso Houver, para o Período das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem X)

As leituras e análises de desempenho da instrumentação empregada para o período das obras de descaracterização estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

Barramento Principal da Barragem do Germano:

- ✓ G102400-O-2RT513_R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT514_R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT515_R00_Jun_25.

Cava do Germano:

- ✓ G102600-O-2RT098-R00_Abr_25;
- ✓ G102600-O-2RT099-R00_Mai_25;
- ✓ G102600-O-2RT100-R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 7 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 94: Recomendação 7 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

07	Apresentar os relatórios técnicos contendo as leituras da instrumentação empregada especificamente para o período das obras de descaracterização na Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), na Barragem do Eixo 1, e na Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios técnicos contemplando as leituras de instrumentação empregada especificamente para o período das obras de descaracterização referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

Barramento Principal da Barragem do Germano:

- ✓ G102400-O-2RT457_R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT458_R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT459_R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT510_R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT511_R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT512_R00_Mar_25.

Cava do Germano:

- ✓ G102600-O-2RT091-R00_Out_24;
- ✓ G102600-O-2RT092-R00_Nov_24;
- ✓ G102600-O-2RT093-R00_Dez_24;
- ✓ G102600-O-2RT095-R00_Jan_25;
- ✓ G102600-O-2RT096-R00_Fev_25;
- ✓ G102600-O-2RT097-R00_Mar_25.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5.2.14 Informar os Períodos de Interrupção dos Trabalhos, Devidamente Justificados (Ex.: Período Chuvoso), se Pertinente (Item 1.3 – Subitem XI)

Os calendários e a quantidade de horas praticáveis para as atividades mais impactadas (terraplenagem e obras civis) consideram a média pluviométrica histórica da região, incluindo os dias chuvosos, a intensidade das chuvas, assim como os respectivos tempos de retomada dos trabalhos, de acordo com as características dos serviços.

Na tabela 28 são apresentados os resultados dos estudos de precipitação pluviométrica realizados pelo Centro de Monitoramento Integrado (CMI) da Samarco, bem como os impactos na retomada das atividades dos projetos no Complexo do Germano.

Tabela 28: Precipitação Real – Fonte: Centro de Monitoramento & Inspeção (CMI) Samarco

REAL ABR/2023 - DEZ/2024						
MÊS	DADOS PRATICABILIDADE				DIAS DE CHUVA	PRECIP. [mm]
	0,01 a 5	5 a 10	10 a 15	>15		
OUT/23	9	2	2	5	18	245
NOV/23	6	1	0	5	12	187
DEZ/23	9	4	1	8	22	251
JAN/24	10	2	1	11	24	400
FEV/24	11	2	3	6	22	257
MAR/24	11	3	1	9	24	308
ABR/24	6	0	0	2	8	53
MAI/24	2	0	0	0	2	3
JUN/24	0	0	0	0	0	0
JUL/24	0	0	0	0	0	0
AGO/24	4	0	0	0	4	4,5
SET/24	0	0	0	0	0	0
OUT/24	6	4	2	6	18	317
NOV/24	10	2	2	6	20	204
DEZ/24	7	4	5	9	25	321
JAN/25	11	8	4	4	27	218
FEV/25	5	2	0	1	8	49
MAR/25	11	2	2	3	18	137
ABR/25	15	2	0	3	20	114
MAI/25	4	0	0	0	4	7
JUN/25	0	0	0	0	0	0
TOTAL	137	38	23	78	276	3075,5

Os principais impactos da precipitação pluviométrica nas frentes de serviço são descritos na sequência, incluindo as medidas para retomada das atividades.

Cava do Germano (Histórico da Obra)

➤ Berma de reforço da Cava (obras concluídas)

Formada por aterro compactado controlado, que não pode ser executado com chuva e/ou umidade elevada (fora da faixa que caracteriza a umidade ótima). Portanto, a partir de setembro de 2022, quando as chuvas iniciaram, os serviços passaram a ser executados conforme praticabilidade (ocorrência de estiagem). O turno noturno foi

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



inevitavelmente suspenso, pois cada retomada das atividades exigia retrabalhos de limpeza e substituição da última camada de aterro executada, gerando improdutividade na execução dos serviços e a consequente extensão do prazo de execução.

Considerando somente o período chuvoso 2022–2023, a partir de setembro de 2022, foram 121 dias com chuva que causaram impacto de 165 dias no prazo de execução da obra da berma de reforço, conforme evidenciado na tabela 29.

Tabela 29: Memória de Cálculo do Impacto das Chuvas na Berma de Reforço da Cava

CÁLCULO DO IMPACTO DAS CHUVAS						
	0,01 a 5mm	5 a 10mm	10 a 15mm	>15mm	DIAS DE CHUVA	PRECIP. [mm]
Índice Fator Retomada (A)	0,7	1,25	1,7	2		
Dias de Chuva (B)	44	21	15	41	121	1678
Dias de Impacto (AxB)	31	26	26	82	165	1678

O replanejamento da obra resultou em plano de ação para a execução dos serviços. Este plano foi implantado em fevereiro de 2023 com a retomada das atividades, incrementando recursos e reestabelecendo o turno noturno de trabalho.

Desta forma, o término de execução da berma de reforço da Cava do Germano foi antecipado de maio de 2023 para abril de 2023, atendendo ao Termo de Compromisso assinado em 25/02/2022.

➤ Canal de Drenagem Principal da Cava (obras concluídas)

Os serviços foram paralisados durante o período chuvoso 2022–2023, de forma a permitir a implantação das ações mitigatórias do plano de chuvas. Isto foi necessário em decorrência da antecipação do início da temporada de chuvas, que em 2022 ocorreu a partir da segunda quinzena de setembro. Esta ação buscou, prioritariamente, garantir o escoamento das águas superficiais provenientes das intervenções do *regrade* da Cava e região.

A paralisação dos serviços no período chuvoso (15/09/22 a 31/03/23) causou impacto de 197 dias corridos no prazo.

Em decorrência do plano de ação para fabricação de pré-moldados de concreto implementado em 2022 para mitigar atrasos, o projeto da estrutura de concreto do canal “*in loco*” foi revisado, possibilitando a fabricação das peças durante os períodos chuvosos e a montagem nos períodos secos.

Conforme o plano de ação de execução, as obras do canal de drenagem principal da Cava foram retomadas em fevereiro de 2023, dando continuidade à construção da bacia de dissipação inferior, e concluídas em maio de 2023 com a execução do emboque do canal.

Portanto, o término da execução do canal de drenagem principal da Cava do Germano atendeu ao Termo de Compromisso assinado em 25/02/2022.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



➤ Bacia do Chico (obras concluídas)

É importante citar que as obras da Bacia do Chico, localizadas entre a rodovia MG-129 e a ferrovia da Vale, não impactaram e não fazem parte da descaracterização da Cava do Germano.

O canal de transposição da Bacia do Chico recebe toda a água superficial proveniente da Cava do Germano e a conduz até o canal do Lago 1A.

O impacto no prazo foi de 242 dias corridos (01/09/22 a 30/04/23), considerando o término das obras em setembro de 2023.

O saldo dos serviços remanescentes é formado pelo aterro da bacia e pelo canal de transposição. Em função da inviabilidade de execução do aterro da bacia no período chuvoso, e da necessidade de garantir o escoamento das águas das chuvas através do canal de transposição, os serviços foram suspensos no início de setembro de 2022 para implantação dos dispositivos provisórios de drenagem e das obras do plano de chuvas 2022–2023. As atividades foram reiniciadas no período seco seguinte e concluídas em setembro de 2023. A *Punch List* das obras foi interrompida para a execução do Plano de Chuvas 2023–2024 e reprogramada para o período seco seguinte.

Sendo assim, o término da execução das obras da Bacia do Chico atendeu ao Termo de Compromisso assinado em 25/02/2022.

Barragem do Germano

➤ Canal de Drenagem Definitivo da Barragem (obras do canal concluídas)

Histórico

A implantação do Canal de Drenagem Principal (CDP) das obras de descaracterização da Barragem do Germano abrange extensa faixa que inicia nas imediações do Dique Selinha (região do emboque) e termina no córrego Fundão/Santarém (região do desemboque). Para a execução destas obras de grande magnitude, foi necessário estabelecer setores com diferentes frentes de serviço.

Devido à topografia acentuada do setor 4 e do local onde foi implantada a bacia final do canal, os serviços de terraplenagem foram paralisados durante o período chuvoso 2022–2023. Os recursos foram direcionados às obras do Dique Sela Tulipa e *Regrade 1D* (plano de ação A da Barragem para o período chuvoso) conforme planejamento. Para as estruturas de concreto do canal do emboque e do setor 3 (forma, armação e concretagem), os serviços foram executados conforme praticabilidade. A retomada das obras do setor 4 do CDP ocorreu em abril de 2023.

Importante registrar que, durante a execução do trecho final do CDP, a frente de obra associada à implantação da bacia de dissipação verificou-se a existência de rocha intrusiva fraturada, não-identificada pelas sondagens. A execução demandou cuidados e procedimentos específicos de ancoragem da rocha para garantia da

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



segurança, bem como proteções de taludes em trechos específicos, antes de prosseguir com os trabalhos de escavação na região da bacia de dissipação.

A associação destas atividades gerou a necessidade de revisão do planejamento inicial, resultando na conclusão das obras do CDP (setor 4 e bacia final) em 2024. Cumpre observar que o replanejamento em questão não alterou a data final de conclusão das obras de descaracterização da Barragem do Germano.

➤ Canais de Drenagem Superficiais do Barramento Principal (obras em andamento)

Histórico

O projeto do sistema de drenagem superficial desenvolvido para implantação nas ombreiras direita e esquerda da Barragem do Germano integra 4 componentes principais:

- canal de drenagem superficial da ombreira esquerda inferior (CDS-OE-I) - trecho entre o topo da berma de reforço e o lago do reservatório de Nova Santarém;
- canal de drenagem superficial da ombreira esquerda superior (CDS-OE-S-H) - trecho horizontal entre o pé do retaludamento do barramento principal e a caixa de passagem para o CDP (próximo a travessia);
- canal de drenagem superficial da ombreira esquerda superior (CDS-OE-S-V) - trecho vertical entre a crista do barramento principal e o CDS-OE-S-H;
- canal de drenagem superficial da ombreira direita (CDS-OD) - trecho entre a crista do barramento principal até o lago do reservatório de Nova Santarém.

O primeiro componente (CDS-OE-I) foi concluído, e já se encontra em operação. Este trecho conduz o lançamento dos efluentes diretamente no lago do reservatório de Nova Santarém.

O segundo componente (CDS-OE-S-H) conduz o lançamento dos efluentes no interior do canal de drenagem principal (CDP). Foi concluído e liberado para operação antes do início do período chuvoso 2024-2025. Importante ressaltar que a execução deste CDP necessitou ser reprogramada, conforme citado no item anterior, em função da identificação de rocha intrusiva fraturada.

O terceiro componente (CDS-OE-S-V) conduz o lançamento dos efluentes no interior do canal de drenagem CDS-OE-S-H. As obras foram retomadas no início do período seco de 2025 e encontram-se em andamento. A liberação para a operação está prevista para ocorrer antes do início do período chuvoso 2025–2026.

Finalmente, as obras de implantação do CDS-OD, que conduz o lançamento dos efluentes diretamente no lago do reservatório de Nova Santarém, encontram-se em andamento e continuam mantidas para serem concluídas no corrente ano, para permitir a operação do canal para o período chuvoso 2025–2026.

➤ Regrade – Etapas 2 (obras concluídas) e 3 (obras em andamento)

Sem alterações em relação ao período anterior.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Histórico

O *Regrade* corresponde ao plano C da Barragem para os períodos chuvosos. O principal objetivo do plano é possibilitar a permanência dos recursos mobilizados para continuidade da descaracterização da Barragem do Germano, evitando ao máximo possível a desmobilização e a potencial perda de recursos para outros projetos em andamento na região.


As obras da etapa 2 foram concluídas em fevereiro de 2024. As obras da etapa 3 (região a montante dos diques Sela Tulipa e Selinha) estão em andamento e adiantadas em relação ao previsto no Termo de Compromisso assinado em 25/02/2022. Diante disso, a Samarco identificou a oportunidade de antecipação da conclusão do Programa de Descaracterização do Germano.

Em síntese, a obras de descaracterização da Cava do Germano foram finalizadas em junho de 2023 e a *Punch List* em agosto de 2023; o término das obras de descaracterização da Barragem do Germano está mantido em maio de 2029 (com possibilidade de antecipação), em atendimento ao Termo de Compromisso assinado em 25/02/2022.

5.2.15 Apresentar os Protocolos Adotados Para Garantir a Segurança dos Trabalhadores Durante as Obras (Item 1.3 – Subitem XII do TR da FEAM)

Este item é apresentado no Capítulo 11 – Saúde e Segurança do Trabalho do presente relatório. Os protocolos da documentação de referência constam na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

Figura 95: Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho



5.2.16 Descrição e Registros Fotográficos de Cada Atividade já Concluída ou Em Andamento Para a Descaracterização da Barragem (Item 1.3 – Subitem XIII do TR da FEAM)

Este item é apresentado no Capítulo 13 – Relatório Fotográfico do Andamento das Obras do presente relatório.

5.2.17 Apresentar Cronograma Atualizado, Detalhando a Data de Início e Conclusão (ou Previsão) de Cada Atividade Realizada ou a Realizar Para a Descaracterização da Estrutura. Detalhar as Atividades Realizadas no Período, Percentual de Avanço da Descaracterização, Cumprimento das Ações Previstas na Respectiva Etapa do Cronograma (Item 1.3 – Subitem XIV do TR)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Atendimento à Nota Técnica 17/01/23, Item 4 – Recomendações da AECOM

Figura 96: Item 4 – Recomendações da AECOM – 17/01/23

04	Incluir no relatório o cronograma no formato de diagrama de Gantt, com as atividades previstas no escopo, bem como a indicação do caminho crítico do Programa de Descaracterização em adição e/ou substituição ao cronograma esquemático apresentado no item 4.3.	3	1	2	6	Alerta
----	---	---	---	---	---	--------

Os cronogramas detalhados das obras, contemplando todo o escopo necessário à completa execução do Programa Descaracterização do Germano, são apresentados como anexos na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

Figura 97: Anexo 2 – Cronogramas das Obras de Descaracterização

	Anexo 2.1-Cronog. Geral Programa Descaracterização_Status_2025_06_22
	Anexo 2.2-Cronog. Detalhado Cava_Germano_Status_2023_09_17 (final)
	Anexo 2.3-Cronog. Detalhado Barragem_Germano_Status_2025_06_22
	Anexo 2.4-Cronog. Detalhado Barramento Principal_Regrade_CDP_Status_2025_06_22
	Anexo 2.5-Cronog. Detalhado Dique Sela Tulipa_Status_2025_06_22 (final)
	Anexo 2.6-Cronog. Detalhado Dique Selinha_Status_2025_06_22 (final)
	Anexo 2.7-Cronog. Detalhado Barragem Eixo 1_Status_2025_06_22 (final)

Atividades Realizadas no Período

As principais atividades realizadas no período são apresentadas no Capítulo 8, item 8.3 do presente relatório. As atividades detalhadas realizadas no período também são apresentadas no filtro do cronograma da Descaracterização da Barragem do Germano, disponível como anexo na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

Figura 98: Anexo 2 – Filtro do Cronograma para Atividades Realizadas no Período

	Anexo 2.8.2-Filtro Atividades Realizadas 2º Trimestre de 2025 - Barragem Germano_Status_2025_06_22
--	--

Cumprimento das Ações Previstas na Respectiva Etapa do Cronograma

Informado no Capítulo 8, item 8.5 do presente relatório. Também são apresentados os filtros dos cronogramas da Barragem, contemplando as atividades previstas no relatório anterior para o 2º trimestre de 2025 e as atividades efetivamente realizadas no mesmo período. Os filtros estão disponibilizados na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

Figura 99: Anexo 2 – Filtros do Cronograma para Atividades Previstas e Realizadas no Período

	Anexo 2.8.1-Filtro Atividades Previstas 2º Trimestre de 2025 - Barragem Germano_Status_2025_03_23
	Anexo 2.8.2-Filtro Atividades Realizadas 2º Trimestre de 2025 - Barragem Germano_Status_2025_06_22

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



6. ESCOPO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

6.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente à Nota Técnica 17/01/23, Item 9 – Recomendações da AECOM.

As informações referentes ao escopo de execução das estruturas Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Barragem Eixo 1 estão contempladas, respectivamente, nos Apêndices I, II e III do presente relatório.

6.2 Escopo do Programa

O plano de execução do programa de descaracterização das barragens foi dividido de acordo com as duas estruturas principais: Cava do Germano e Barragem do Germano.

Na figura 100 é apresentada uma visão geral das barragens da Samarco com as principais estruturas existentes.

Figura 100: Vista Geral das Barragens da Samarco



Os próximos tópicos trazem os escopos da descaracterização da Cava (obras concluídas) e Barragem do Germano (obras em andamento), de acordo com o plano de execução e o sequenciamento propostos nos projetos de engenharia, de forma a cumprir o prazo estabelecido e garantir a segurança nas frentes de serviço das estruturas remanescentes.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



6.3 Escopo da Descaracterização da Cava do Germano

6.3.1 Engenharia (status: 100% concluída)

- Geral – Licenciamentos e Anuências – **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – *Design Review* - **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – Estudos e Levantamentos de Campo - **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – Estudos de Estabilidades Taludes Remanescentes – **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – Remoção Parcial de Rejeitos - **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – Remoção Adicional de Rejeitos - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Básico – Fechamento da Cava do Germano - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Básico – Descaracterização da Cava do Germano - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – Plugagem da Galeria - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – Retirada de Interferências - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – Sistema de Drenagens - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – Descaracterização da Cava - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – Estruturas de Concreto - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – Adequações Transp. do Sistema TCLD - **CONCLUÍDO ✓**.

6.3.2 Suprimentos (status: 100% concluído)

- Serviços (status: 100% concluído)
 - Supressão Vegetal - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Remoção de Interferências - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Plugagem da Galeria da Cava - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras Civas e Terraplenagem da Cava - **CONCLUÍDO ✓**;
 - REC/TAC e Adequações dos Transportadores - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Integração dos Transportadores - **CONCLUÍDO ✓**.
- Materiais (status: 100% concluído)
 - Elétricos e Comunicação - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Fornecimento de Agregados - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Tubulação Aço com Costura - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Tubulação e Acessórios de PEAD - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletrodutos - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Elétricos - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Fibra Óptica - **CONCLUÍDO ✓**.
- Equipamentos (status: 100% concluído)
 - Eletrocentro da Cava - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Integração de Processos - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instrumentos de Barragem - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Transportadores e Casa de Transferências - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Painel de Comunicação - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Painel de Remota - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Quadros de Distribuição (11CV026/11CV027) - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Comunicação (11CV026/11CV027) - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instrumentação (11CV026/11CV027) - **CONCLUÍDO ✓**.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



6.3.3 Construção (status: 100% concluída)

- Remoção de Interferências (pacote de obras 100% concluído)
 - Serviços Preliminares – Acessos de obras e áreas de descargas - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Remoção de tubulações, redes aéreas, equipamentos, fundações e destinação dos materiais - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras Civas e Terraplenagens – Fundações e bases novas - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Montagem Eletromecânica – Novo painel de comunicações, tubulação, implantação do novo trecho da adutora do Gualaxo, rede de fibra óptica e rede de distribuição de 13,8kV - **CONCLUÍDO ✓**.
- Supressão Vegetal (pacote de serviços 100% concluído)
 - Trecho para a implantação da adutora do Gualaxo - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Bacia do Chico - **CONCLUÍDO ✓**.
- Galeria da Cava (pacote de obras 100% concluído)
 - Plugagem da Galeria da Cava - **CONCLUÍDO ✓**.

6.3.3.1 Descaracterização da Cava do Germano (pacote de obras com 100% realizado)

- Berma de Reforço da Cava e Drenagem Superficial (status: 100% realizado):
 - Limpeza da fundação etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem interna etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem da berma – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Limpeza da fundação etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem interna etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem da berma – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem Superficial – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Conexão do colchão drenante (drenagem interna) com o sistema de drenagem da Cava – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instrumentação da berma de reforço – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção Vegetal – **CONCLUÍDO ✓**.
- Canal de Drenagem da Cava (status: 100% realizado):
 - Serviços preliminares – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Canal periférico interno superior – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Canal de saída – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Canal de acesso interno ao C2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Bacia de dissipação superior – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Bacia de dissipação ao lado da rodovia MG-129 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Galerias sob acessos internos – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem travessia rodoviária – descida d'água/dissipador – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Túnel-bala sob a rodovia MG-129 – **CONCLUÍDO ✓**.
- Reconformação da Cava do Germano (status: 100% realizado)
 - *Regrade* da Cava etapa 1 de 11 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - *Regrade* da Cava etapa 2 de 11 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - *Regrade* da Cava etapa 3 de 11 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - *Regrade* da Cava etapa 4 de 11 – **CONCLUÍDO ✓**;

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- *Regrade da Cava etapa 5 de 11* – **CONCLUÍDO ✓**;
- *Regrade da Cava etapa 6 de 11* – **CONCLUÍDO ✓**;
- *Regrade da Cava etapa 7 de 11* – **CONCLUÍDO ✓**;
- *Regrade da Cava etapa 8 de 11* – **CONCLUÍDO ✓**;
- *Regrade da Cava etapa 9 de 11* – **CONCLUÍDO ✓**;
- *Regrade da Cava etapa 10 de 11* – **CONCLUÍDO ✓**;
- *Regrade da Cava etapa 11 de 11* – **CONCLUÍDO ✓**.

6.3.3.2 TCLD 11CV027, Bacia do Chico e REC/TAC (status: 100% realizado)

- Sist. de Disposição de Estéril – TCLD 11CV027 (status: 100% realizado):
 - Eletrocentro SE071 – fundações e obras civis – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletrocentro SE071 – instalação da edificação metálica – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletrocentro SE071 – instalação dos equipamentos – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Contêntes em solo grampeado – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis – fundações e bases de equipamentos – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem das estruturas metálicas – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Montagem das estruturas metálicas – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Montagem dos equipamentos mecânicos – **CONCLUÍDO ✓**.
- Bacia do Chico (status: 100% realizado):
 - Preenchimento da Bacia do Chico Etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento da Bacia do Chico Etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Bombeamento do Lago 1ª – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem provisória – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem superficial Etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem superficial Etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Tamponamento do túnel bala existente – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Túnel-bala linha 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Túnel-bala linha 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Tamponamento do túnel bala existente sob a ferrovia EFVM – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Descida d'água a jusante do túnel sob a ferrovia EFVM – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instrumentação do aterro da Bacia do Chico – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instrumentação dos túneis bala sob a ferrovia EFVM – **CONCLUÍDO ✓**.
- Recuperação Estrutural e Tratamento Anticorrosivo (REC/TAC) dos Transportadores 11CV026/11CV027 (status: 100% realizado)
 - REC/TAC do TCLD 11CV026 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - REC/TAC do TCLD 11CV027 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Subestações SE00, SE15 e SE27 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Montagem eletromecânica (REC/TAC) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Sistemas de automação, comunicação e instrumentação – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Comissionamento – **CONCLUÍDO ✓**.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



6.4 Escopo da Descaracterização da Barragem do Germano

6.4.1 Engenharia (status: 98,11% concluída)

- Geral – Contratações - **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – Licenciamentos e Anuências - **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – *Design Review* - **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – Estudos e Levantamentos de Campo - **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – Acompanhamento ITRB /AECOM / Stantec /BVP - **EM ANDAMENTO**;
- Geral – Passagem de Nível sobre a Ferrovia - **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – Pavimentação de Acessos Existentes - **CONCLUÍDO ✓**;
- Geral – ATO e *As-Built* da Descaracterização - **EM ANDAMENTO**;
- Geral – ATO Descaracterização Stantec - **CONCLUÍDO ✓**.
- Estudos e Levant. de Campo – *Regrade* - **CONCLUÍDO ✓**;
- Estudos e Levant. de Campo – Canal Drenagem Principal - **CONCLUÍDO ✓**;
- Estudos e Levant. de Campo – Sistema de TCLDs – **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Básico – Berma da Barragem Principal - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Básico – *Regrade* - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Básico – Canal de Drenagem Principal - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Básico – Sistema de TCLDs - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – Berma da Barragem Principal - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – *Regrade* - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – Canal de Drenagem Principal - **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – Sistema de TCLDs - **CONCLUÍDO ✓**.

6.4.2 Suprimentos (status: 88,34% concluído)

- Serviços (status: 100% concluído)
 - Supressão Vegetal - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Remoção de Interferências - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Montagem de Equipamentos Mecânicos - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras Cíveis e Terraplenagem da Barragem - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras do *Regrade* Etapa 2 - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras do *Regrade* Etapa 3, Revegetação e Drenagens – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem Passiva da Berma de Reforço - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Comissionamento - **CONCLUÍDO ✓**.
- Materiais (status: 86,14% concluído)
 - Manta Geotextil *Regrade* Etapa 1 e Bacia do Chico - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Manta Geotextil *Regrade* Fechamento das Barragens - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Manta Geotextil *Regrade* Etapa 2 - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Agregados Eixo 1 - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Agregados Berma de Reforço - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Agregados *Regrade* Etapa 2 - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Agregados *Regrade* Etapa 3 - **EM ANDAMENTO**.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Equipamentos (status: 100% concluído)
 - Instrumentos de Barragem Eixo 1 e *Regrade* Etapa 1 - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Transportadores Sistema TCLD - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletrocentros dos Transportadores - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Linha de Distribuição de Alta Tensão - **CONCLUÍDO ✓**;
 - Sistema de Automação – **CONCLUÍDO ✓**.

6.4.3 Construção Geral (status: 89,18% concluída)

6.4.3.1 Serviços Preliminares (Status: 100% concluído)

- Supressão Vegetal (pacote de serviços 100% concluído)
 - Trecho do canal de drenagem principal – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Trecho do TCLD 53CV090 e pátio – **CONCLUÍDO ✓**.
- Remoção de Interferências (pacote de obras 100% concluída)
 - Trecho do canal de drenagem principal – **CONCLUÍDO ✓**;
 - *Regrade* – região do Pinheirinho – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pé da barragem principal – **CONCLUÍDO ✓**.
- Drenagem Passiva – Pé de Germano (pacote de obras 100% concluída)
 - Serviços de melhoria de acessos – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preparação da ADME – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Implantação do dique corta fluxo – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Implantação do novo canal – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Implantação dos poços de drenagem – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Reforço do solo em *jet grouting* no pé de Germano – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Escavação pós *jet grouting* e limpeza – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Berma de drenagem passiva em agregados – **CONCLUÍDO ✓**.

6.4.3.2 Descaract. Barragem – Etapa 1 (pacote de obras com 100% realizado)

- Berma de Reforço da Barragem Principal (status: 100% realizado):
 - Execução de acesso ao pé da barragem principal – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Serviços preliminares com a limpeza superficial – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Camada de transição em areia – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Camada de transição em brita – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Berma de reforço em bloco rochoso – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instalação da instrumentação – **CONCLUÍDO ✓**.
- *Regrade* Etapa 1 (status: 100% realizado):
 - Preenchimento do lago 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento do lago 1A – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento do lago 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento do lago 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento do lago 4 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras do período chuvoso 2020/2021 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras do período chuvoso 2021/2022 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instalação da instrumentação – **CONCLUÍDO ✓**.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Canal de Drenagem Principal (status: 100% realizado):
 - Terraplenagem do setor 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Estrutura de concreto armado do setor 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem superficial nos taludes/bermas do setor 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção vegetal do setor 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem do setor 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Estrutura de concreto armado do setor 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem superficial nos taludes/bermas do setor 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção vegetal do setor 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem do setor 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Estrutura de concreto armado do setor 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem superficial nos taludes/bermas do setor 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção vegetal do setor 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem do setor 4 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Estrutura de concreto armado do setor 4 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem superficial nos taludes/bermas do setor 4 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção dos taludes (vegetal/solo grampeado) do setor 4 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem do emboque – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Estrutura de concreto armado do emboque – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem da bacia final – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Estrutura de concreto armado da bacia final – **CONCLUÍDO ✓**.

6.4.3.3 Drenagem da Barragem Principal (status: 71,94% realizado):

- Canal de drenagem inferior e intermediário ombreira esquerda – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canal de drenagem superior ombreira esquerda – **EM ANDAMENTO**;
- Canal de drenagem superior ombreira direita – **EM ANDAMENTO**.

6.4.3.4 *Regrade* Etapas 2 e 3 (Obras em andamento com 69,84% realizado)

- *Regrade* Etapa 2 (status: 100% realizado):
 - Serviços preliminares na região do pátio de pilhas – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem na região do pátio de pilhas – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem superficial bermas do pátio de pilhas – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Drenagem superficial bermas do pátio de pilhas – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção vegetal na região do pátio de pilhas – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção vegetal na região do pátio de pilhas – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Serviços preliminares na região do dique auxiliar – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instalação da instrumentação na região do dique auxiliar – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem do lago 2 na região do dique auxiliar – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Serviços preliminares na região da baía 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instalação da instrumentação na região da baía 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem do lago 3 na região da baía 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem dos lagos 4A e 4B na região da baía 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem a montante da crista da baía 3 – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem a montante da crista da baía 3 – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Serviços preliminares na região Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instalação da instrumentação na região Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Travessia canal de aproximação na região Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Terraplenagem canal de aproximação - região Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;
- Escavação canal de aproximação na região Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canal de aproximação enrocamento na região Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canal secundário em enrocamento na região Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canal de aproximação – camada única – **CONCLUÍDO ✓**;
- Terraplenagem a jusante do dique auxiliar – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Terraplenagem a jusante do dique auxiliar – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Terraplenagem da crista do Dique Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;
- Terraplenagem do emboque na região Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;
- Terraplenagem do emboque do canal de aproximação – **CONCLUÍDO ✓**.
- **Regrade Etapa 3 (status: 54,01% realizado):**
 - Travessia do acesso ao mineroduto na região do dique auxiliar – **FUTURO**;
 - Travessia do acesso a portaria na região do dique auxiliar – **EM ANDAMENTO**;
 - Implantação do canal principal na região do dique auxiliar – **EM ANDAMENTO**;
 - Implantação do canal secundário na região do dique auxiliar – **EM ANDAMENTO**;
 - Terraplenagem na região da ferrovia – dique auxiliar 2/3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem na região da ferrovia – dique auxiliar 3/3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - *Top soil* e proteção vegetal - região da ferrovia – dique auxiliar – **EM ANDAMENTO**;
 - Terraplenagem região do Pinheirinho – dique auxiliar 2/3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem região do Pinheirinho – dique auxiliar 3/3 – **EM ANDAMENTO**;
 - *Top soil* e proteção vegetal - região do Pinheirinho – dique auxiliar – **FUTURO**;
 - Terraplenagem na região do lago 2 – dique auxiliar – **EM ANDAMENTO**;
 - *Top soil* e proteção vegetal - região do lago 2 – dique auxiliar – **FUTURO**;
 - Terraplenagem na região do lago 1A – dique auxiliar – **CONCLUÍDO ✓**;
 - *Top soil* e proteção vegetal - região do lago 1A – dique auxiliar – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Terraplenagem a montante da crista – dique auxiliar – **EM ANDAMENTO**;
 - *Top soil* e proteção vegetal a montante da crista – dique auxiliar – **FUTURO**;
 - Implantação do canal principal na região da baia 3 – **EM ANDAMENTO**;
 - Implantação do canal secundário na região da baia 3 – **FUTURO**;
 - Terraplenagem no lago 3 – região da baia 3 – **EM ANDAMENTO**;
 - *Top soil* e proteção vegetal no lago 3 – região da baia 3 – **EM ANDAMENTO**;
 - Terraplenagem nos lagos 4A e 4B – região da baia 3 – **EM ANDAMENTO**;
 - *Top soil* e proteção vegetal nos lagos 4A e 4B – região da baia 3 – **FUTURO**;
 - Terraplenagem na região das bombas – baia 3 – **EM ANDAMENTO**;
 - *Top soil* e proteção vegetal na região das bombas – baia 3 – **FUTURO**;
 - Terraplenagem a montante da crista – baia 3 – **EM ANDAMENTO**;
 - *Top soil* e proteção vegetal a montante da crista – baia 3 – **FUTURO**;
 - Terraplenagem na região da baia 3 – **EM ANDAMENTO**;
 - *Top soil* e proteção vegetal na região da baia 3 – **FUTURO**;
 - Travessia do acesso ao mineroduto na crista do Dique Auxiliar – **FUTURO**;
 - Implantação do canal secundário na região Dique Auxiliar – **FUTURO**;
 - *Top soil* e proteção vegetal - região a jusante do Dique Auxiliar – **FUTURO**;
 - *Top soil* e proteção vegetal – região a montante do Dique Auxiliar – **FUTURO**;
 - Terraplenagem - região do emboque de Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;
 - *Top soil* e proteção vegetal - região do emboque de Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



6.4.3.5 Sist. de Disposição de Rejeito e Estéril da Barragem – TCLD 53CV090
 (pacote de obras em andamento com 100% realizado)

- Sistema de Disposição de Estéril (status: 100% realizado):
 - Obras civis dos transportadores G11-49CV115 e 116 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G11-49CV115 e 116 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica dos transportadores G11-49CV115 e 116 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis do eletrocentro G13-49SE073 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Fabricação do eletrocentro G12-49SE073 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Montagem eletromecânica do eletrocentro G12-49SE073 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis dos transportadores G12-49CV115 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G12-49CV115 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica dos transportadores G12-49CV115 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G20-52CV116 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica dos transportadores G20-52CV116 – **CONCLUÍDO ✓**.
- Sistema de Disposição de Estéril (status: 100% realizado):
 - Obras civis dos transportadores G20-53CV81 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G20-53CV81 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica dos transportadores G20-53CV81 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis dos transportadores G20-53CV82 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G20-53CV82 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica dos transportadores G20-53CV82 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis dos transportadores G12-53CV88 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G12-53CV88 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica dos transportadores G12-53CV88 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis dos transportadores G12-53CV89 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G12-53CV89 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica dos transportadores G12-53CV89 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis da Casa Transferência G12-53CV90 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis dos transportadores G12-53CV90 trecho 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis dos transportadores G12-53CV90 trecho 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis dos transportadores G12-53CV90 trecho 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem da Casa Transferência G12-53CV90 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G12-53CV90 trecho 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G12-53CV90 trecho 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G12-53CV90 trecho 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica da Casa Transferência G12-53CV90 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica transportadores G12-53CV90 trecho 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica transportadores G12-53CV90 trecho 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica transportadores G12-53CV90 trecho 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis dos transportadores G12-53CV97 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Pré-montagem dos transportadores G12-53CV97 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Eletromecânica dos transportadores G12-53CV97 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras civis do eletrocentro G13-49SE072 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Fabricação do eletrocentro G12-49SE072 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Montagem eletromecânica do eletrocentro G12-49SE072 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Contenção 1 / 1A – trecho A – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Contenção 1 / 1A – trecho B e C – **CONCLUÍDO ✓**;

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Contenção 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Cortina 4 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Cortina 4A – **CONCLUÍDO ✓**;
- Contenção 6 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Contenção 7 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Contenção 8 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Instrumentação para as contenções – **CONCLUÍDO ✓**.
- Obras do período chuvoso (status: 100% realizado):
 - Obras do período chuvoso 2020/2021 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Obras do período chuvoso 2021/2022 – **CONCLUÍDO ✓**.
- Desvio do C2 (status: 100% realizado):
 - Obras civis – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Tubulações e acessórios – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Elétrica – **CONCLUÍDO ✓**.

6.4.3.6 Rede de Distribuição de Alta Tensão para o TCLD (status: 100% realizado)

- Engenharia rede de distribuição do TCLD 53CV090 e Pátio – **CONCLUÍDO ✓**;
- Fornecimento dos componentes do TCLD 53CV090 e Pátio – **CONCLUÍDO ✓**;
- Construção rede de distribuição do TCLD 53CV090 e Pátio – **CONCLUÍDO ✓**.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



7. DESEMPENHO DA DESCARACTERIZAÇÃO

7.1 Objetivo do Capítulo


Atender integralmente ao Item 1.3, subitem XIV do Termo de Referência da FEAM e às Recomendações 3 e 4 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/2023.

As informações referentes ao desempenho das obras das estruturas Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Barragem Eixo 1 estão contempladas, respectivamente, nos Apêndices I, II e III do presente relatório.

7.2 Avanço Físico Acumulado da Descaracterização – Previsto x Realizado

Os avanços físicos previstos x acumulados do Programa Descaracterização do Germano referentes à Cava e à Barragem do Germano são apresentados na EAP da Figura 101. A estrutura de cada projeto está dividida em Engenharia, Suprimentos e Construção.

Figura 101: Estrutura Geral das Barragens da Samarco

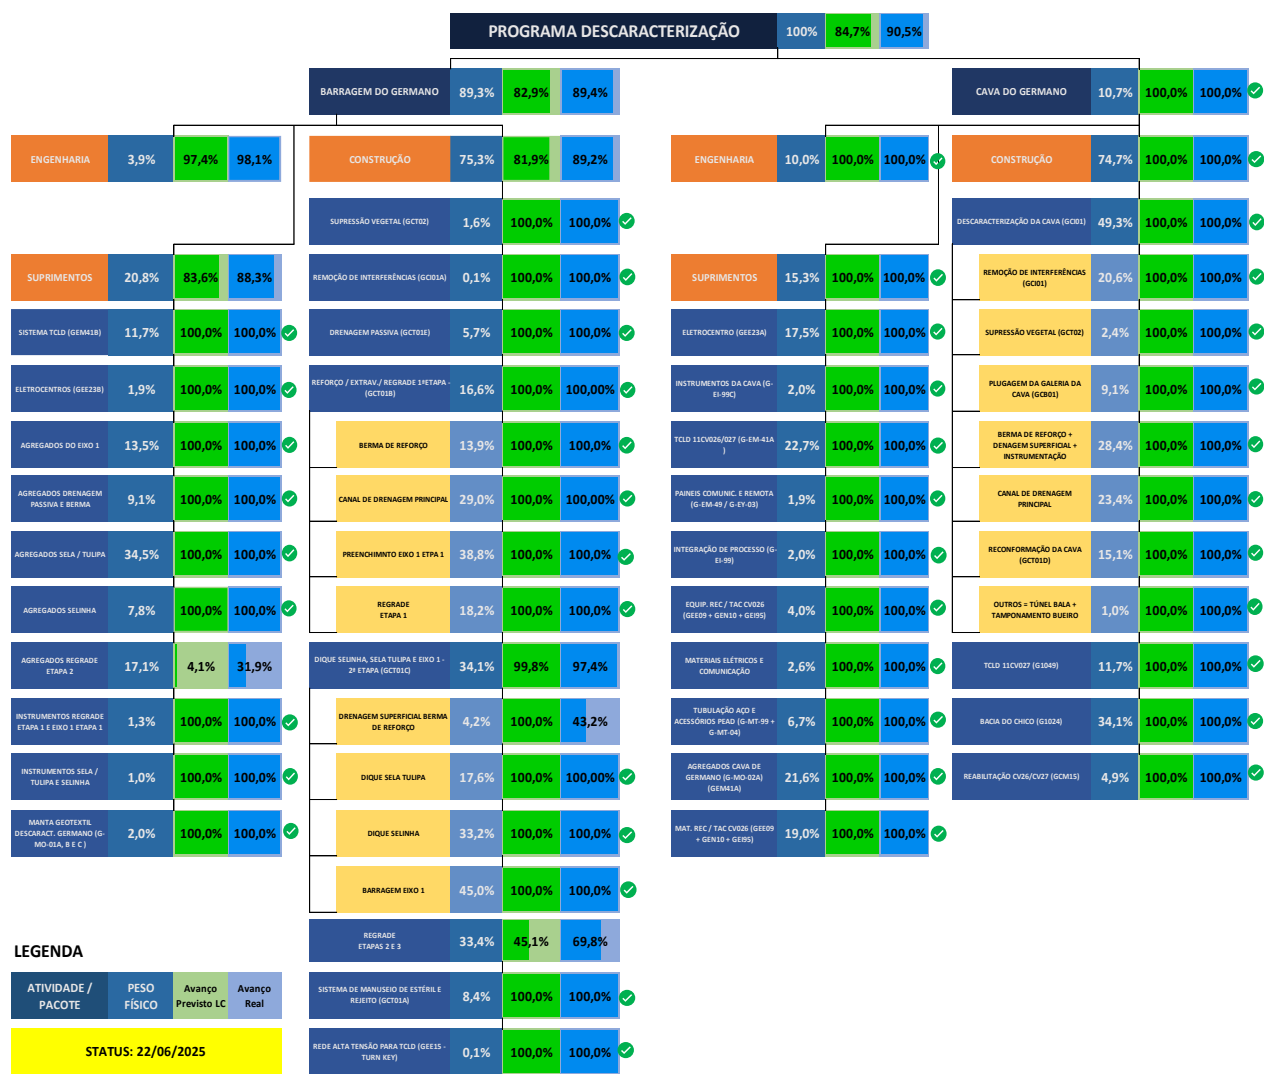

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



7.3 Tabela Resumo de Desempenho no Trimestre e Acumulado


Tabela 30: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados No Período – Programa Descaracterização

Programa Descaracterização	Etapa	Peso % (\$) IPR 2021	Peso % (\$) L. Corrente Até Ago/21	2º Trimestre 2025 %			Acumulado Geral %		
				Planejado Corrente	Real	Desvio Corrente	Planejado Corrente	Real	Desvio Corrente
Descaracterização da Barragem do Germano	Engenharia	3,90%	3,90%	0,19%	0,35%	0,16%	97,39%	98,11%	0,72%
	Suprimentos	20,83%	20,83%	0,00%	3,43%	3,43%	83,58%	88,34%	4,76%
	Construção	75,27%	75,27%	1,46%	2,13%	0,67%	81,90%	89,18%	7,29%
	Total	89,28%	89,28%	1,11%	2,33%	1,22%	82,85%	89,36%	6,50%
Descaracterização da Cava do Germano	Engenharia	9,99%	9,99%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Suprimentos	15,35%	15,35%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Construção	74,67%	74,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Total	10,72%	10,72%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Total Programa		100,00%	100,00%	0,99%	2,08%	1,09%	84,69%	90,50%	5,81%

Nota: O acumulado total do Programa Descaracterização permanece positivo com 5,81% acima do previsto.

7.4 Desempenho do Programa Descaracterização Geral

7.4.1 Curva S Geral do Programa (Cava + Barragem)

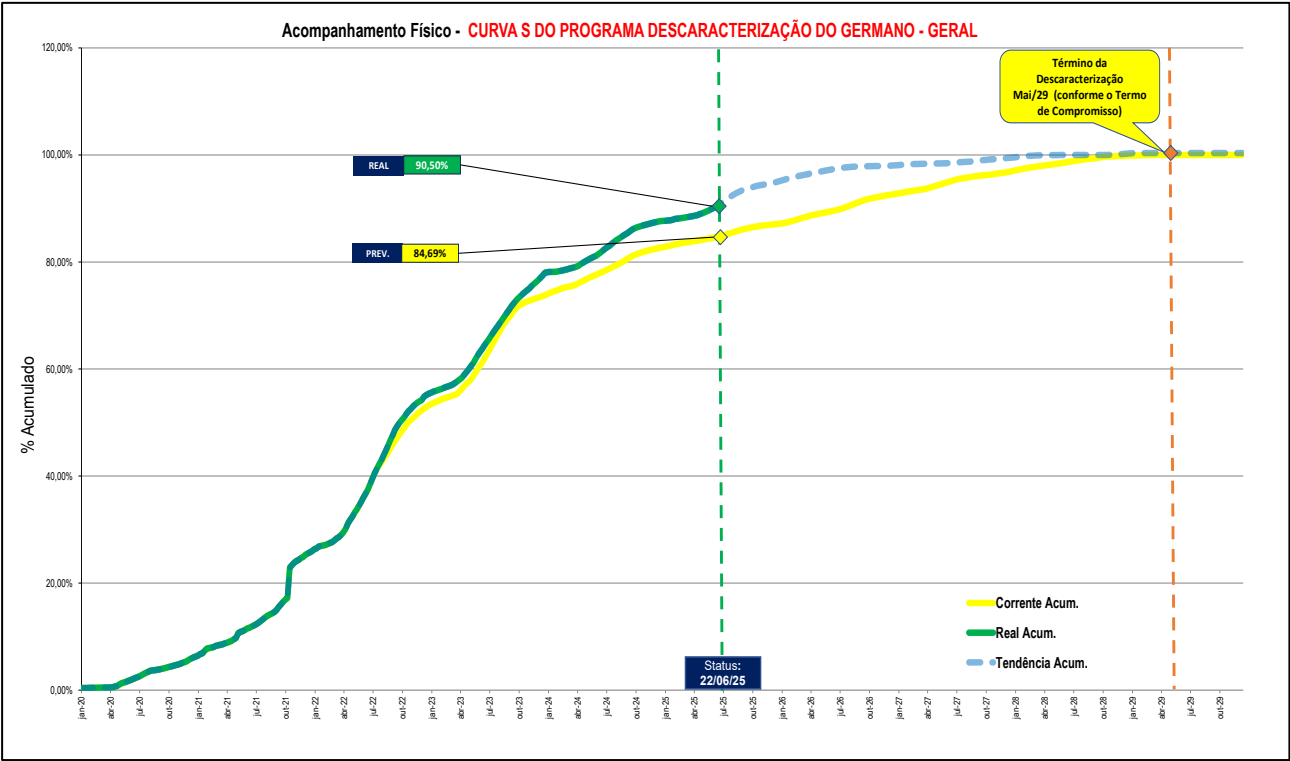


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



7.4.2 Curva S Geral da Construção do Programa (Cava + Barragem)

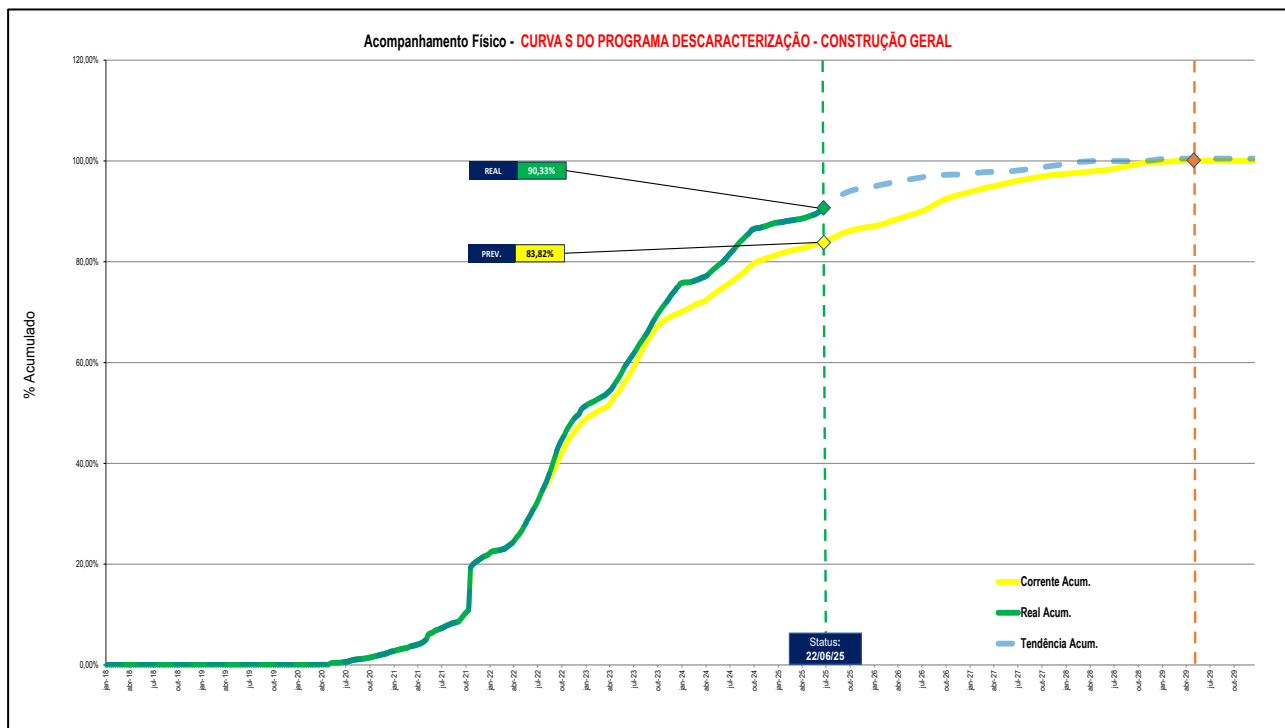

7.4.3 Curva S Geral de Suprimentos do Programa (Cava + Barragem)

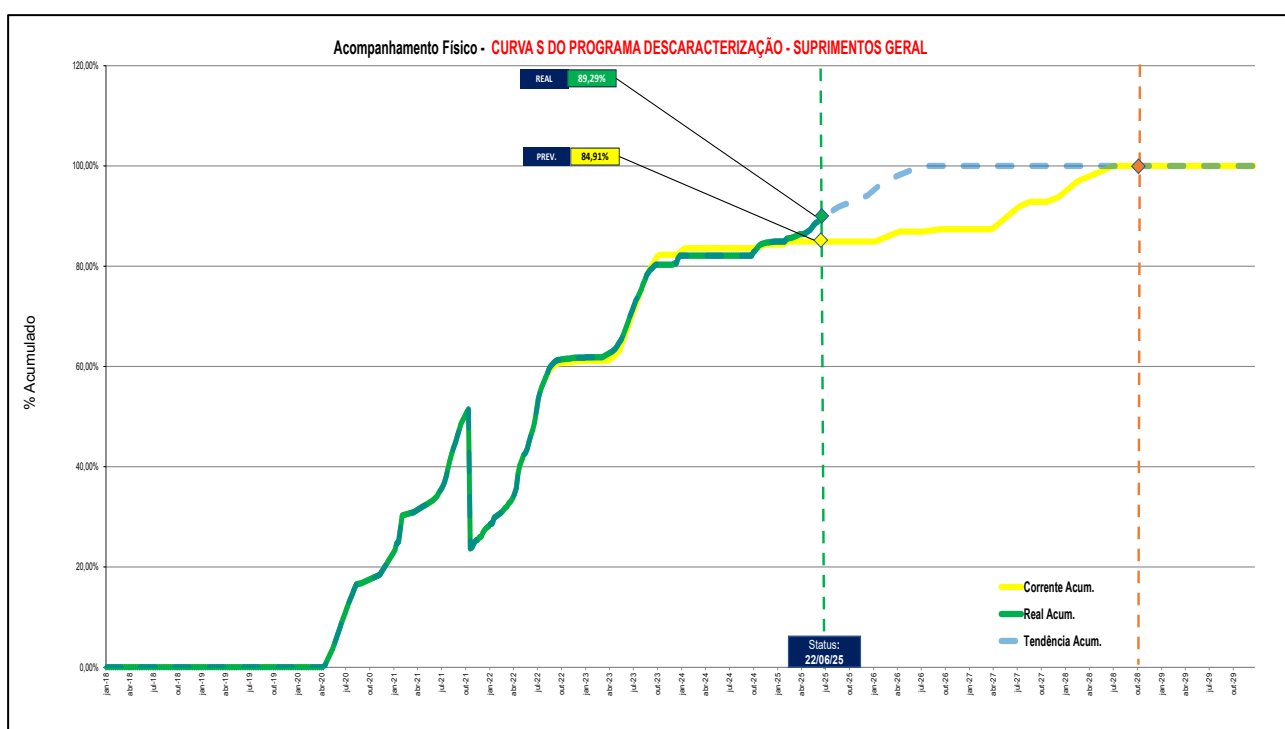


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL N°14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




7.4.4 Curva S Geral da Engenharia do Programa (Cava + Barragem)

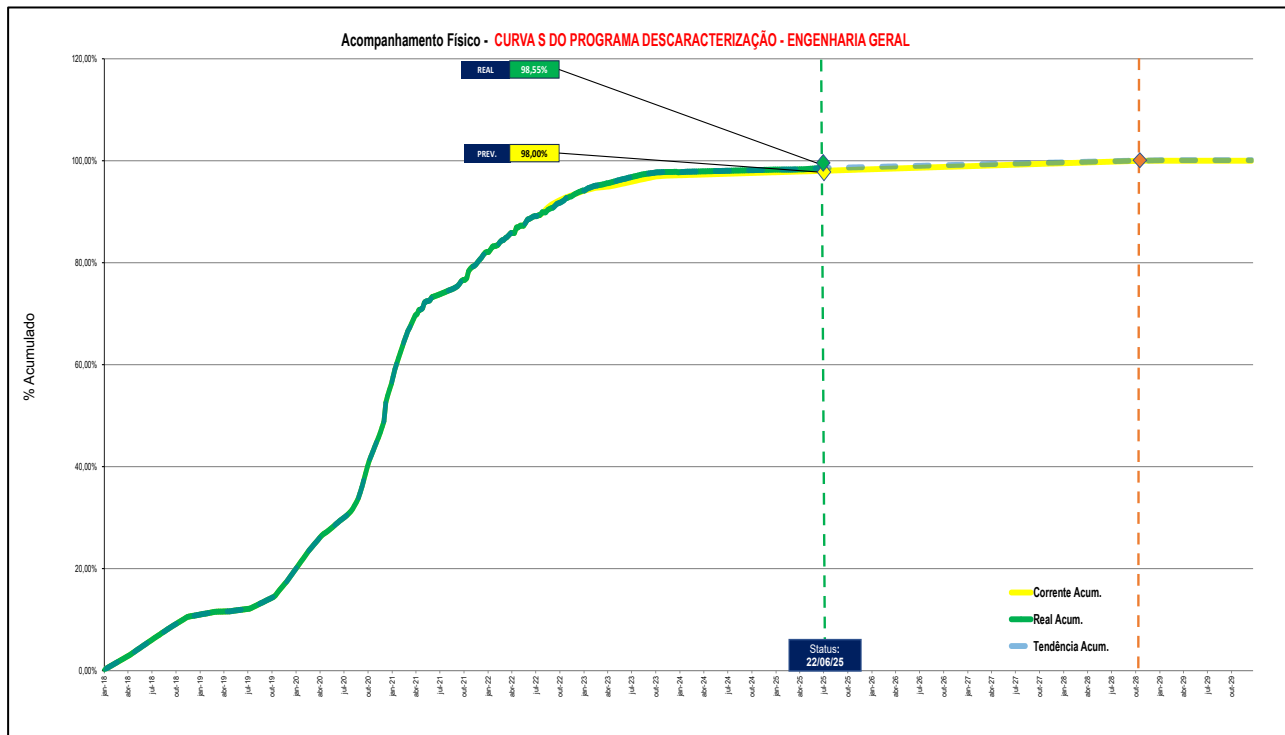

7.5 Descaracterização da Cava do Germano (Histórico)

7.5.1 Curva S Geral da Cava

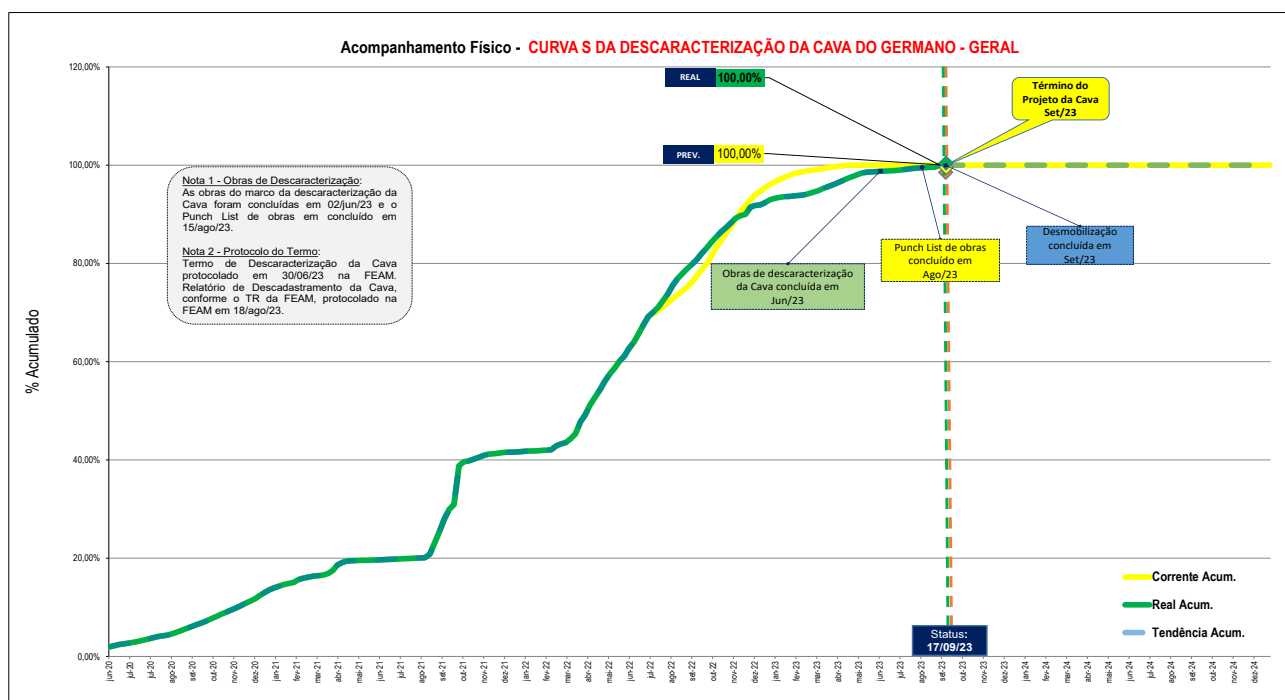


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL N°14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



7.5.2 Curva S da Construção da Cava

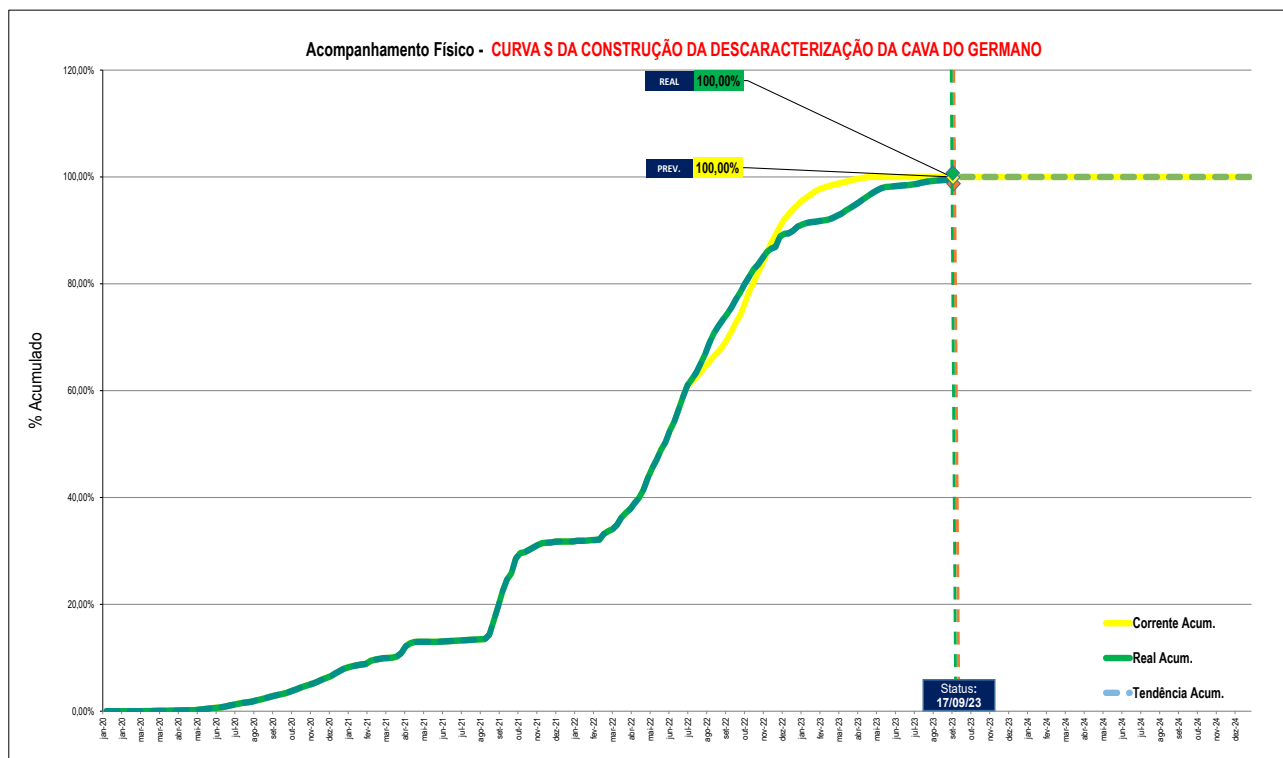

7.5.3 Curva S de Suprimentos da Cava

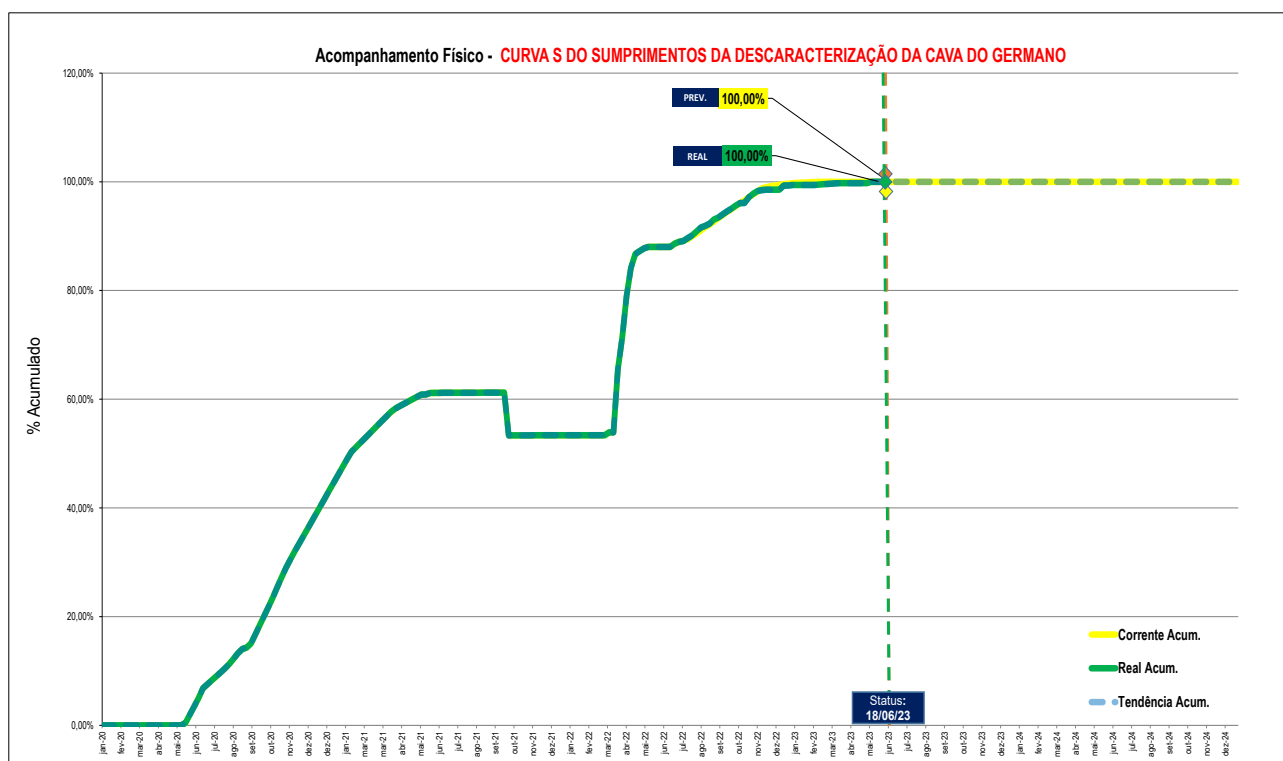


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




7.5.4 Curva S da Engenharia da Cava

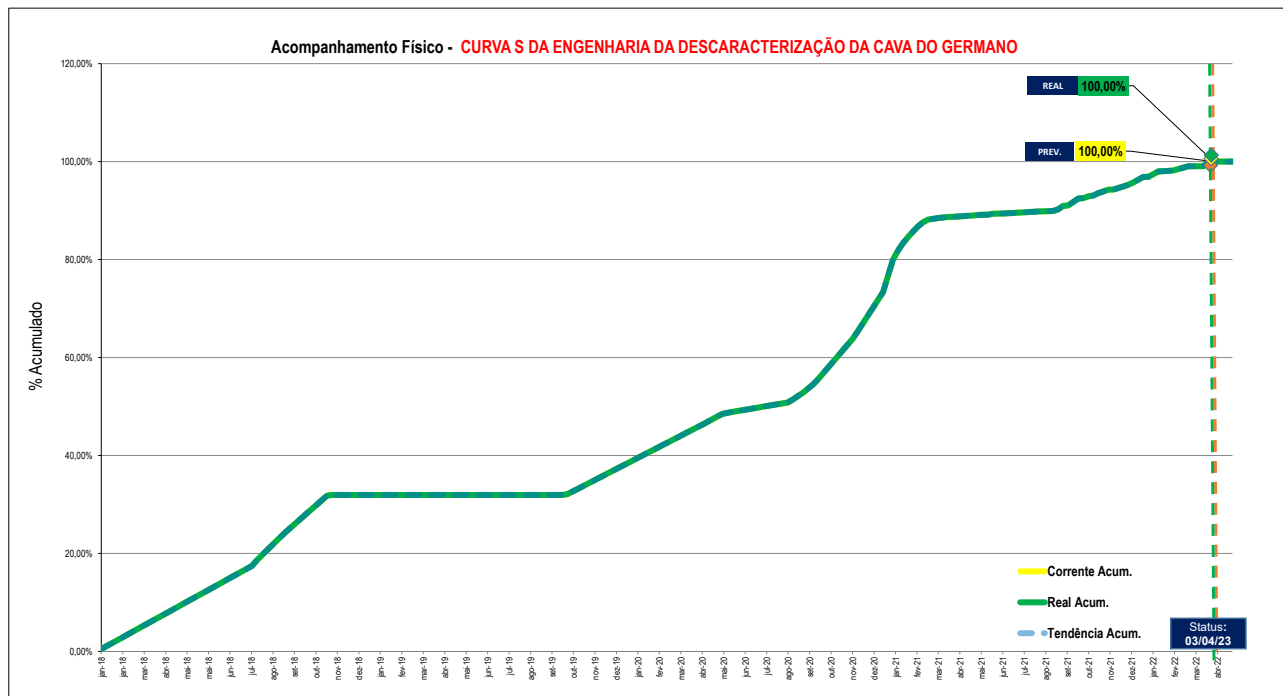

7.6 Descaracterização da Barragem do Germano

7.6.1 Curva S Geral da Barragem

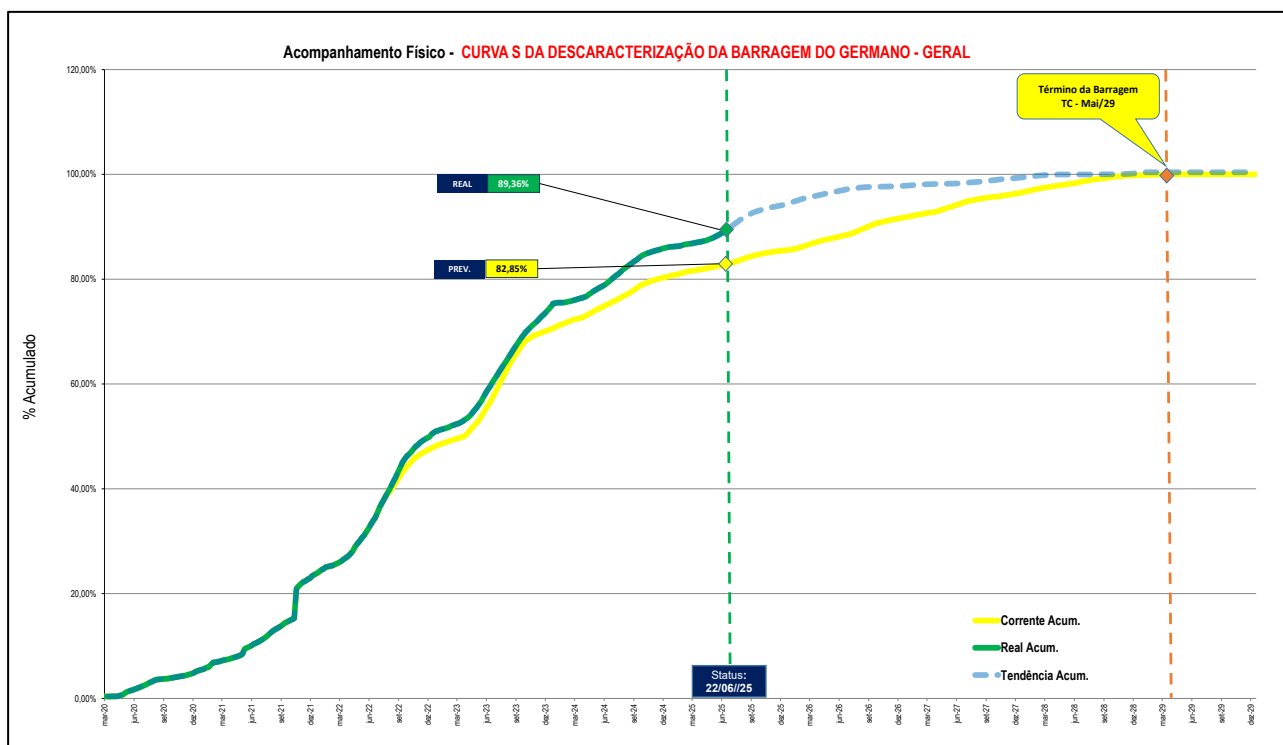


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



7.6.2 Curva S da Construção da Barragem

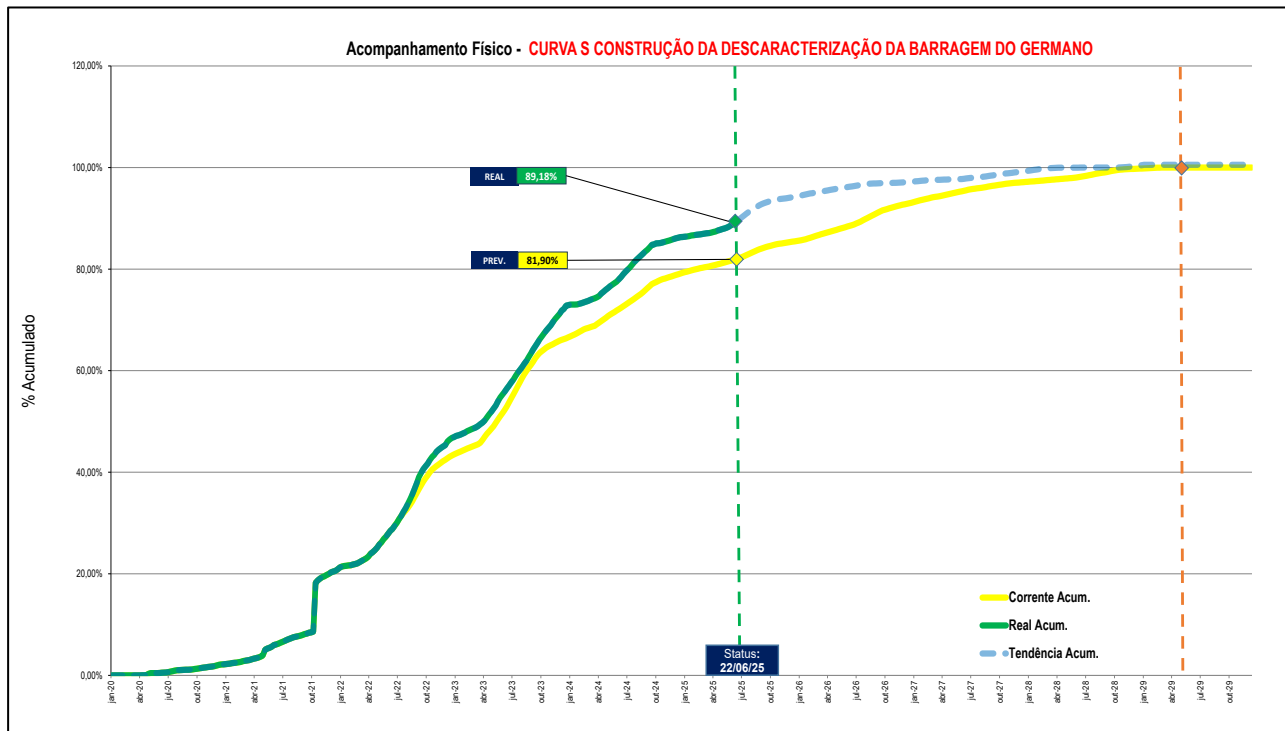

7.6.3 Curva S de Suprimentos da Barragem

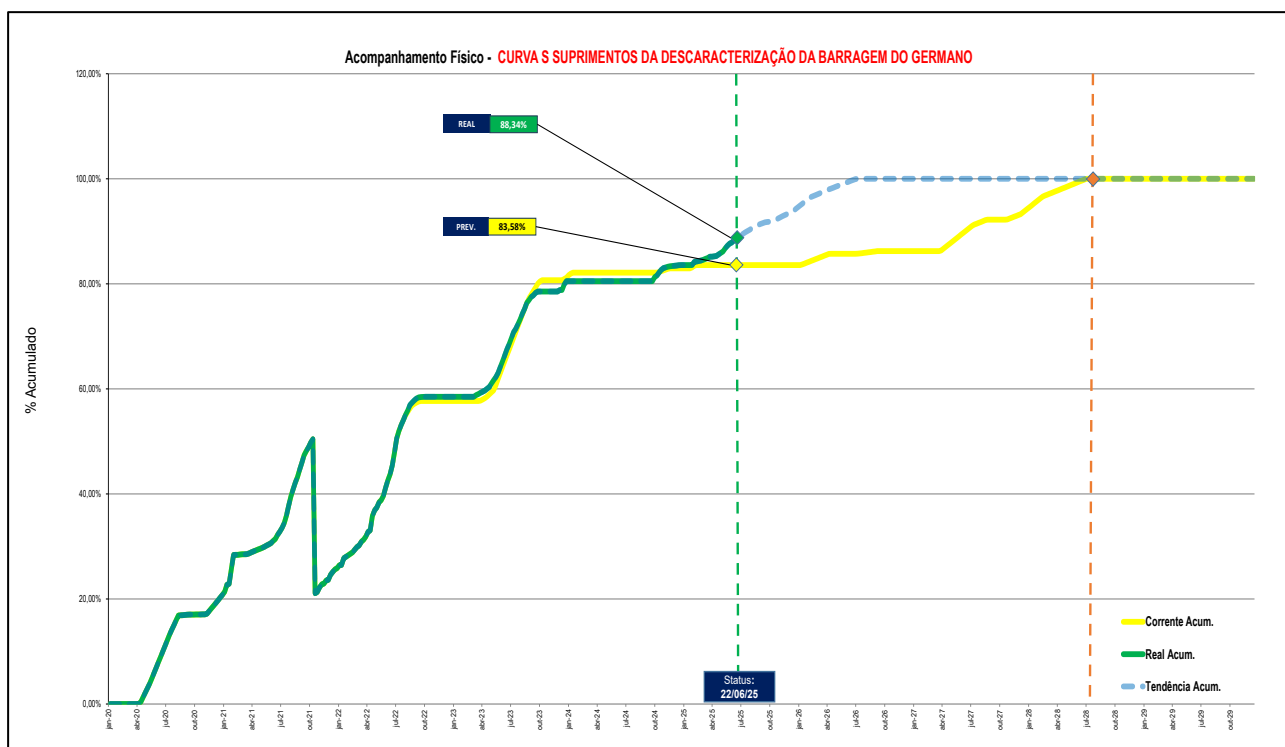


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



7.6.4 Curva S da Engenharia da Barragem

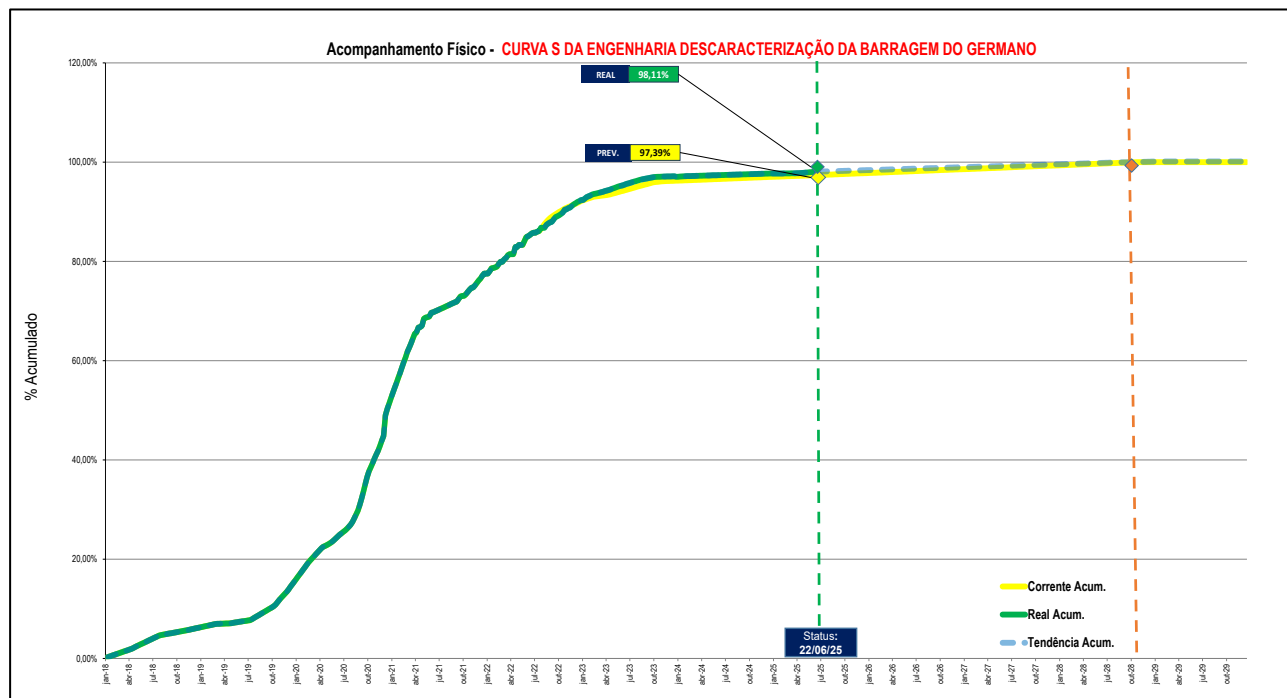

7.7 Cronograma Detalhado do Programa Descaracterização

O cronograma geral detalhado do Programa Descaracterização do Germano, bem como os cronogramas referentes à Cava e à Barragem, ao Dique Sela Tulipa, ao Dique Selinha e à Barragem Eixo 1, são disponibilizados na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

Figura 102: Cronogramas da Cava (final) e Barragem (incluindo as estruturas associadas, bem como o Eixo 1)

	Anexo 2.1-Cronog. Geral Programa Descaracterização_Status_2025_06_22
	Anexo 2.2-Cronog. Detalhado Cava_Germano_Status_2023_09_17 (final)
	Anexo 2.3-Cronog. Detalhado Barragem_Germano_Status_2025_06_22
	Anexo 2.4-Cronog. Detalhado Barramento Principal_Regrade_CDP_Status_2025_06_22
	Anexo 2.5-Cronog. Detalhado Dique Sela Tulipa_Status_2025_06_22 (final)
	Anexo 2.6-Cronog. Detalhado Dique Selinha_Status_2025_06_22 (final)
	Anexo 2.7-Cronog. Detalhado Barragem Eixo 1_Status_2025_06_22 (final)

7.8 Caminhos Críticos

7.8.1 Descaracterização da Cava do Germano

O filtro do cronograma contemplando o caminho crítico das obras da Cava e a respectiva análise não é mais aplicável, pois as obras foram concluídas em junho de 2023.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Notas: Os serviços que contemplam o escopo de descaracterização da Cava do Germano (berma de reforço, canal de drenagem principal, sistema de drenagem superficial, reconformação superficial e revegetação) foram finalizados em junho de 2023. A Punch List para atendimento de auditoria foi finalizada em agosto de 2023.


Conforme o Termo de Compromisso firmado junto à FEAM, a data final prevista para o término das obras de descaracterização da Cava do Germano é 21/10/2023. Desta forma, tanto as obras quanto a Punch List foram concluídas dentro do prazo previsto.

Os pacotes de serviços da Bacia do Chico e dos transportadores 11CV026 e 11CV027 foram concluídos em setembro de 2023. Apesar de estarem contidos no cronograma da Cava do Germano, não fazem parte do escopo de descaracterização da estrutura.

7.8.2 Descaracterização da Barragem do Germano

O filtro do cronograma contemplando o caminho crítico das obras da Barragem é disponibilizado na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

Figura 103: Atividades Críticas da Barragem do Germano



7.8.2.1 Análise do Caminho Crítico da Barragem do Germano

Tabela 31: Análise do Caminho Crítico dos Pacotes da Barragem

PROJETO	PACOTE	PREV LC	REAL	DESVIDO	TÉRMINO LC	TENDÊNCIA	JUSTIFICATIVA	PLANO DE AÇÃO	PONTOS DE ATENÇÃO
BARRAGEM	REGRADA - GERAL	45,09%	69,84%	24,75%	08/05/2029	Até 08/05/2029 Meta Julho/26	Construção: Obras de aterro, canais superficiais e proteção vegetal seguem adiantadas em relação a linha de base do TC. A Samarco considera antecipar a conclusão do regrade (escopo remanescente para a conclusão da descaracterização da Barragem do Germano).	Plano de Ação: Manter o ritmo de execução das obras visando a antecipação do término da etapa de obras de descaracterização de maio/29 para julho/26.	Construção: Manter os canais de drenagens provisórios sempre em condições de escoar as águas superficiais.

Nota: A data final da descaracterização da Barragem está mantida em 08/05/2029, conforme previsto na avaliação de planejamento “Range Analysis” e no Termo de Compromisso firmado junto à FEAM. Entretanto, a Samarco identificou potencial oportunidade de antecipação da conclusão do Programa de Descaracterização do Germano para 2026.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



8. DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO

8.1 Objetivo do Capítulo

Atendimento ao Item 1.3, subitem XIV do Termo de Referência da FEAM e às recomendações 2, 6 e 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23.

8.2 Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes da Construção

8.2.1 Barragem do Germano

A tabela 32 apresenta a composição dos desvios (positivos ou negativos) na Construção da Barragem do Germano que constam na Tabela 30: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados no Período – Programa Descaracterização, Item 7.3 do presente relatório. É importante informar que os desvios não impactam o prazo final da descaracterização da Barragem do Germano.

Tabela 32: Composição dos Desvios / Ações dos Pacotes da Construção da Barragem

BARRAGEM - PRINCIPAIS DESVIOS / AÇÕES DA CONSTRUÇÃO					
PACOTE	PESO DESVIO TC	TÉRMINO TC	TENDÊNCIA	ANÁLISE DOS DESVIOS	AÇÕES
DRENAGEM SUPERFICIAL DO BARRAMENTO PRINCIPAL	-0,5%	30/11/2023	16/09/2025	. As obras dos canais da obreira direita e obreira esquerda (trecho superior) do barramento principal seguem em andamento e têm conclusão planejada para o ano corrente. O desvio negativo não impacta o prazo final da descaracterização.	. A fabricação da estrutura em concreto pré-moldado foi concluída. As peças foram entregues no site e estão sendo instaladas. . Conclusão dos canais para operação antes do período chuvoso 25/26.
REGRADE ETAPA 1D - A MONTANTE DO DIQUE AUXILIAR	-0,35%	05/01/2025	26/10/2025	. As obras a montante do Dique Auxiliar foram totalmente retomadas após o período chuvoso 24/25. A execução do aterro e a implantação da travessia sobre o canal principal definitivo (acesso à portaria) estão em andamento. O desvio não impacta a sequência de atividades e nem a data final da execução do regrade.	. Manutenção do sistema de drenagem provisório em condições operacionais.
REGRADE (ETAPAS 3)	8,13%	08/05/2029	Até 08/05/2029 Meta Julho/26	. As obras nas regiões da Baía 3 (aterro e 2ª metade do canal principal definitivo), Dique Auxiliar (aterro), Ferrovia / Pinheirinho (1ª metade do canal principal definitivo) foram totalmente retomadas após o período chuvoso 24/25 e seguem aceleradamente em relação ao plano.	. Mobilização da nova contratada principal para as obras do regrade (etapa 3) concluída. Todos os serviços contratados estão em andamento.
Total Construção Barragem >>>	7,29%				

Nota: Obras de descaracterização da Cava foram concluídas em junho de 2023.

8.3 Atividades Principais – Obras Executadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

BARRAGEM DO GERMANO	CAVA DO GERMANO
BARRAMENTO PRINCIPAL <u>Drenagem superficial</u> - Execução do trecho superior do canal da obreira esquerda. - Início da implantação do canal da ombreira direita. DESCARACTERIZAÇÃO DO DIQUE SELA TULIPA, DIQUE SELINHA, E BARRAGEM EIXO 1 - ETAPA 2 <u>Dique Sela Tulipa</u> - Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. - Monitoramento da estrutura pós-obras de descaracterização. <u>Dique Selinha</u> - Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. - Monitoramento da estrutura pós-obras de descaracterização.	Estrutura da Cava - Continuação do monitoramento ativo (pós-obras) conforme previsto no Plano de Operação da Cava. Revegetação / Recomposição - Continuação da manutenção e acompanhamento do desenvolvimento do plantio.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Barragem Eixo 1 • Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. • Monitoramento da estrutura pós-obras de descaracterização. REGRADE ETAPA 3 • Região da Baía 3: Continuação dos aterros dos lagos 4A e 4B, bem como da área da antiga estação de bombeamento. Início da implantação da 2ª metade do canal de drenagem principal definitivo. • Região do Dique Auxiliar: Continuação dos aterros e início da implantação da travessia para o acesso à portaria. • Regiões do Pinheirinho e Ferrovia: Continuação dos aterros e implantação da 1ª metade do canal de drenagem principal definitivo. Obras do Plano de Chuvas 2024-2025 • Continuação das atividades previstas no plano.	
--	--

8.4 Atividades Principais – Obras Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

BARRAGEM DO GERMANO	CAVA DO GERMANO
BARRAMENTO PRINCIPAL <u>Drenagem superficial</u> • Conclusão do trecho superior do canal da obreira esquerda. • Conclusão da implantação do canal da ombreira direita. DESCARACTERIZAÇÃO DOS DIQUES SELA TULIPA E SELINHA, E PREENCHIMENTO DO EIXO 1 ETAPA 2 <u>Dique Sela Tulipa</u> • Continuação da manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. • Continuação do monitoramento da estrutura pós-obras de descaracterização. <u>Dique Selinha</u> • Continuação da manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. • Continuação do monitoramento da estrutura pós-obras de descaracterização. <u>Barragem Eixo 1</u> • Continuação da manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. • Continuação do monitoramento da estrutura pós-obras de descaracterização. REGRADE ETAPA 3 • Região da Baía 3: Continuação dos aterros dos lagos 4A / 4B, da área da antiga estação de bombeamento e implantação da 2ª metade do canal de drenagem principal definitivo. • Região do Dique Auxiliar: Continuação dos aterros e implantação da travessia para o acesso à portaria.	Estrutura da Cava • Continuação do monitoramento ativo (após 2 anos de obras) conforme previsto no Plano de Operação da Cava. Revegetação / Recomposição • Continuação da manutenção e acompanhamento do desenvolvimento do plantio.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Regiões do Pinheirinho e Ferrovia: Continuação dos aterros e implantação da 1ª metade do canal de drenagem principal definitivo.

Obras do Plano de Chuvas 2024-2025

Continuação das atividades previstas no plano.

Nota: O monitoramento ativo entra em sua fase específica de confirmar as premissas de projeto e sazonalidade hidrogeotécnica, uma vez que todas as configurações de obras de descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha, bem como da Barragem Eixo 1, foram atingidas no ano de 2024.

8.5 Atividades Principais Previstas para o período no Relatório Anterior x Atividades Realizadas

8.5.1 Cava do Germano

Tabela 33: Avaliação das Atividades da Descaracterização da Cava Realizadas no Trimestre x Planejadas

ATIVIDADES PREVISTAS NO RT ANTERIOR	STATUS DA ATIVIDADE	COMENTÁRIOS
Estrutura da Cava		
Continuação do monitoramento ativo (pós-obras) conforme o Plano de Operação da Cava	Rotina	Conforme planejado.
Revegetação / Recomposição		
Continuação da manutenção e acompanhamento do desenvolvimento do plantio.	Rotina	Conforme planejado.

8.5.2 Barragem do Germano

Tabela 34: Avaliação das Atividades da Barragem Realizadas no Trimestre x Planejadas

ATIVIDADES PREVISTAS NO RT ANTERIOR	STATUS DA ATIVIDADE	COMENTÁRIOS
DESCARACTERIZAÇÃO DO DIQUE SELA TULIPA, DIQUE SELINHA E BARRAGEM EIXO 1 - ETAPA 2		
Dique Sela Tulipa		
Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal.	Rotina	Conforme planejado.
Monitoramento da estrutura pós-obras de descaracterização.	Rotina	Conforme planejado.
Dique Selinha		
Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal.	Rotina	Conforme planejado.
Monitoramento da estrutura pós-obras de descaracterização.	Rotina	Conforme planejado.
Barragem Eixo 1 – Etapa 2		
Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal.	Rotina	Conforme planejado.
Monitoramento da estrutura pós-obras de descaracterização.	Rotina	Conforme planejado.
REGRADE ETAPA 3		

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Região da Baía 3		
Execução do aterro controlado na região do Dique Auxiliar – Ferrovia / Pinheirinho / Lago 2.	Em andamento	Conforme planejado.
Execução dos aterros de conquista e controlado na região da Baía 3 – Lagos 3, 4A e 4B.	Em andamento	Conforme planejado.
Execução do canal de drenagem superficial principal na região a montante do Dique Auxiliar.	Em andamento	Na região do Dique Auxiliar foi iniciada a implantação da travessia do canal. Nas regiões da Ferrovia / Pinheirinho e Baía 3 as obras do canal de drenagem principal estão em andamento.
Plano de Chuvas 2024-2025		
Continuação das atividades previstas no plano.	Em andamento	Conforme planejado.

8.6 Principais Quantidades das Obras de Descaracterização

8.6.1 Cava do Germano (Histórico)

Gráfico 1: Movimentação de Terra e Est. Metálicas – Quant. Prev. x Real. Acumuladas – Obras Concluídas



Gráfico 2: Obras Civas – Quant. Prev. x Real Acumuladas – Obras Concluídas



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



8.6.2 Barragem do Germano

Gráfico 3: Canal Principal – Quantidades Previstas x Realizadas Acumuladas – Obras Concluídas




Gráfico 4: Dique Sela Tulipa, Dique Selinha e Eixo 1 Etapa 2 – Quant. Prev. x Real. Acumuladas - Obras Concluídas





Gráfico 5: Regrade Etapas 2 e 3 – Quant. Prev. x Real. Acumuladas – Obras Concluídas




PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Gráfico 6: Regrade Etapa 3 – Quant. Prev. x Real. Acumuladas (Obras Em Andamento)



Nota: Os serviços de escavação, aplicação de agregados e concretagem dos canais de drenagem superficiais estão previstos para serem iniciados a partir de 2026 e estão sendo executados antecipadamente em 2025.

8.7 Histogramas de Força de Trabalho e Equipamentos por Contrato


8.7.1 Cava do Germano – Descaracterização da Cava

Contrato 4300000630b - Consórcio Ápia-EXE (concluído)

Execução das obras de complementação do aterro controlado das bermas de reforço da Cava do Germano, drenagens superficiais e complemento do canal de drenagem principal a montante da rodovia MG-129.

Força de Trabalho Indireta

Gráfico 7: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000630b – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)

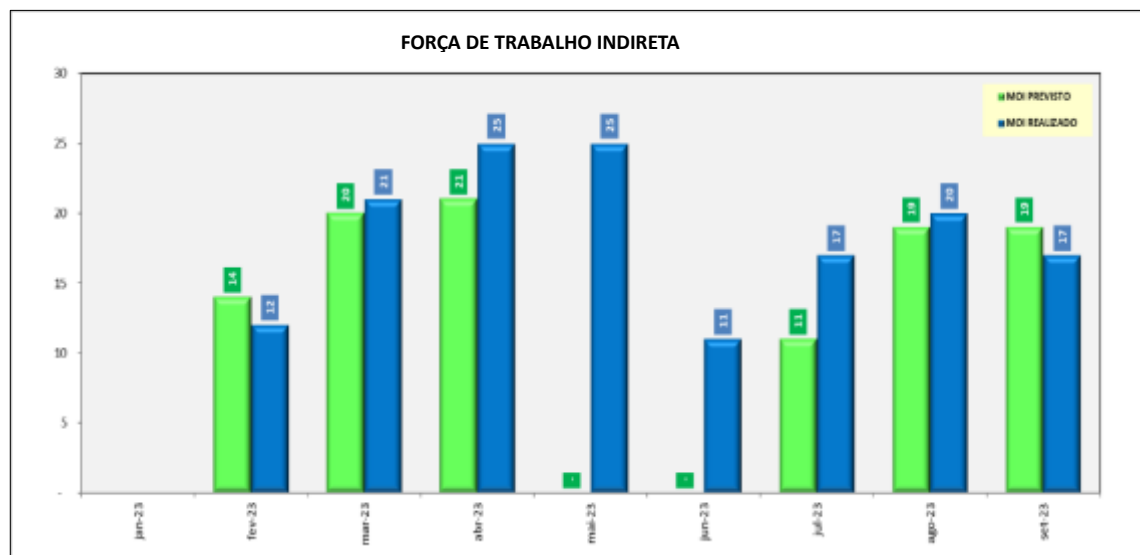


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




Força de Trabalho Direta

Gráfico 8: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000630b – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)

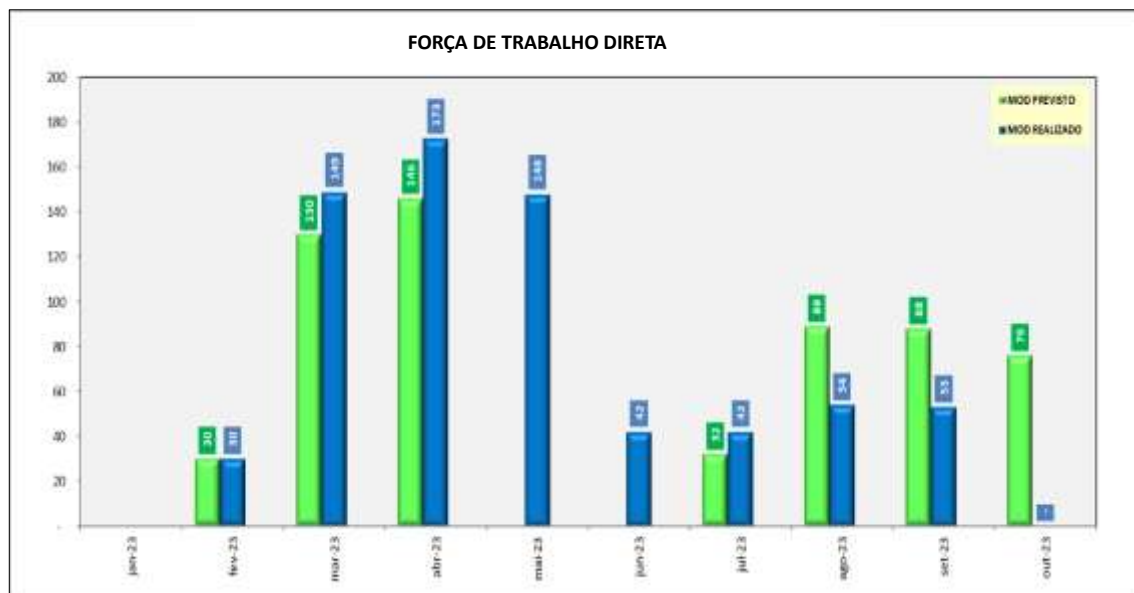

Equipamentos Principais

Gráfico 9: Equipamentos Principais (Contrato 4300000630b – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)

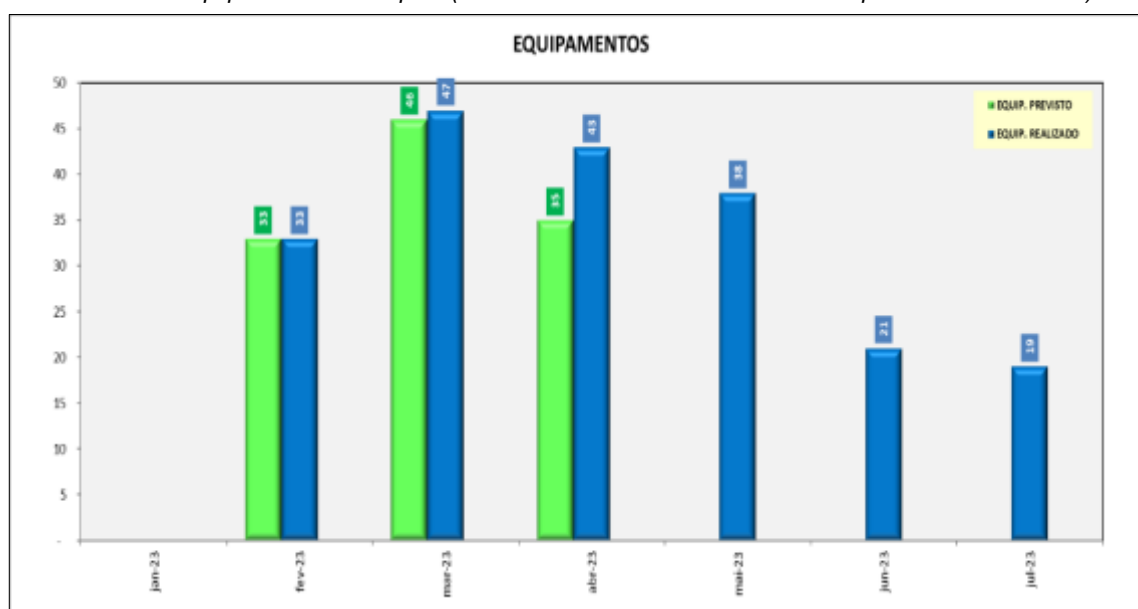

8.7.2 Cava do Germano – REC/TAC do 11CV026/027

Contrato 4300000659 - Real Estruturas (concluído)

Recuperação de estruturas metálicas, contemplando serviço de montagem e desmontagem de equipamentos e peças estruturais para recuperação estrutural

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



(REC), tratamento anticorrosivo (TAC) e serviços de montagem eletromecânica para recuperação de transportadores.


Força de Trabalho Indireta

Gráfico 10: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000659 – Real Estruturas – Finalizado)

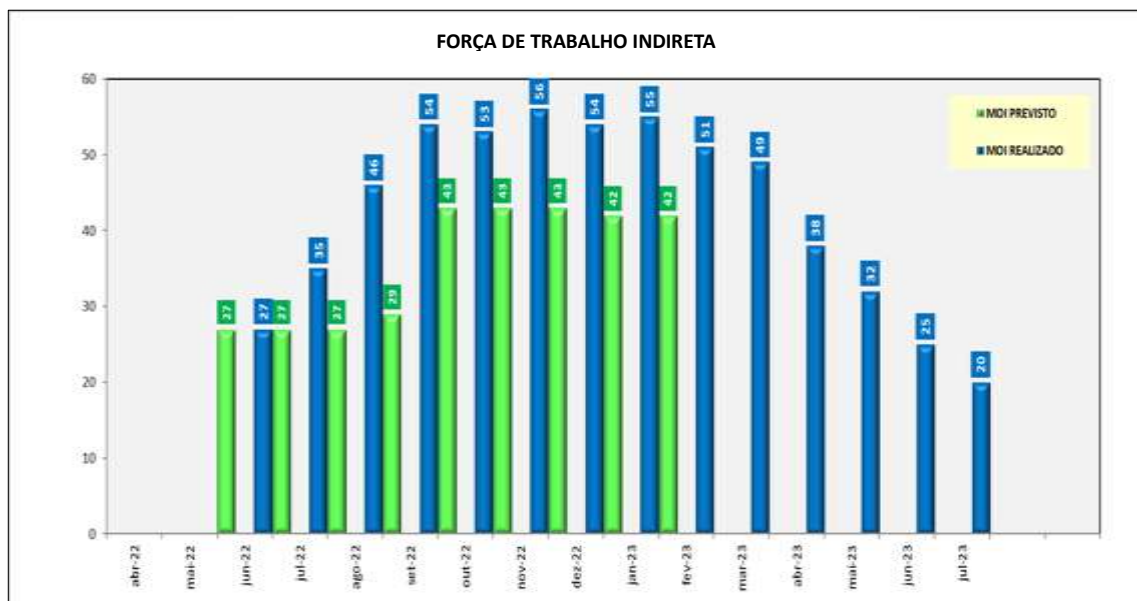

Força de Trabalho Direta

Gráfico 11: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000659 – Real Estruturas – Finalizado)

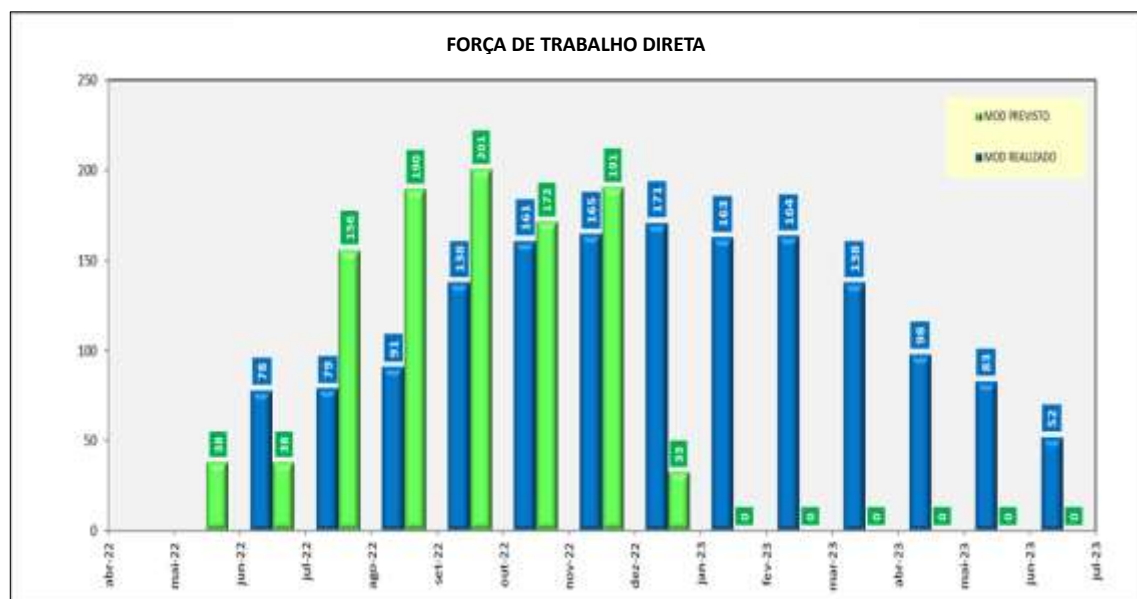


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Equipamentos Principais

Gráfico 12: Equipamentos Principais (Contrato 4300000659 – Real Estruturas – Finalizado)

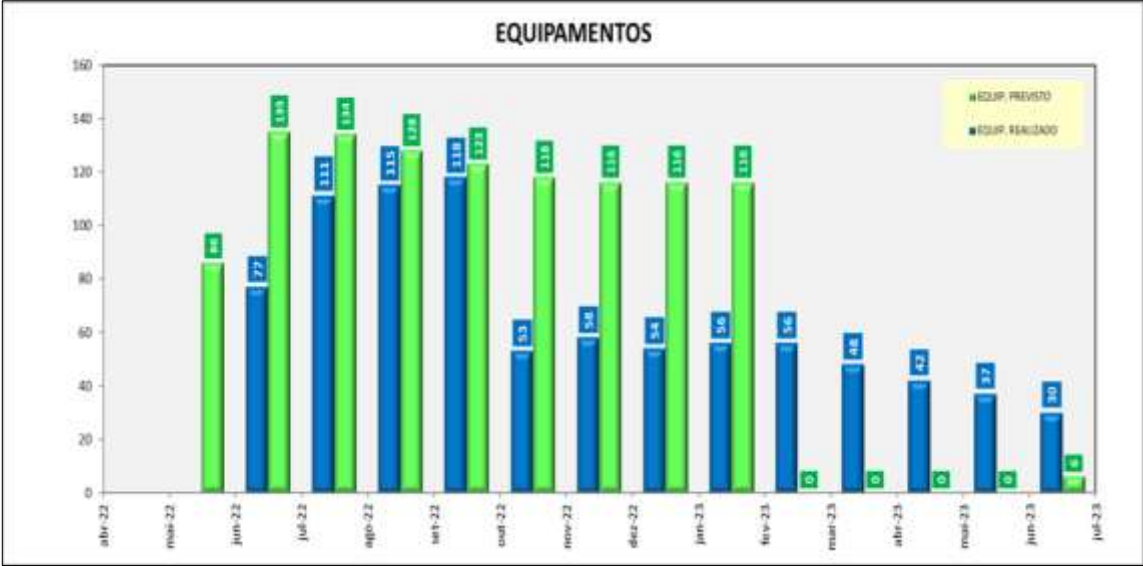


8.7.3 Cava do Germano – Bacia do Chico

Contrato 4300000595b - Consorcio MRF (serviços concluídos)
Execução das obras de terraplenagem e canal de transposição da bacia

Força de Trabalho Indireta

Gráfico 13: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000595b – Consórcio MRF – Finalizado)

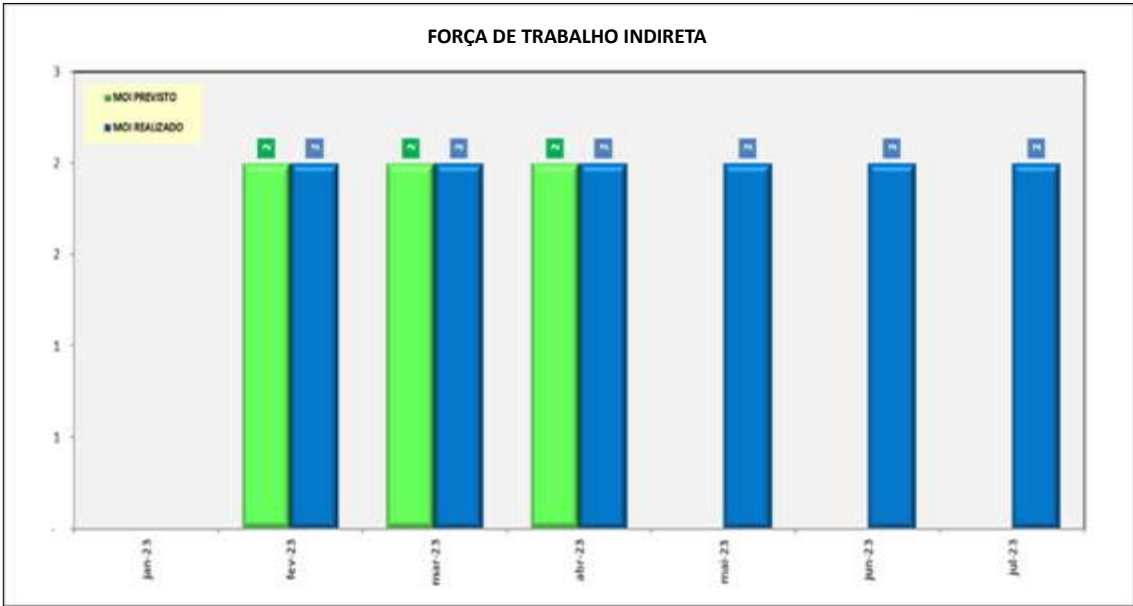


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025


Força de Trabalho Direta

Gráfico 14: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000595b – Consórcio MRF – Finalizado)

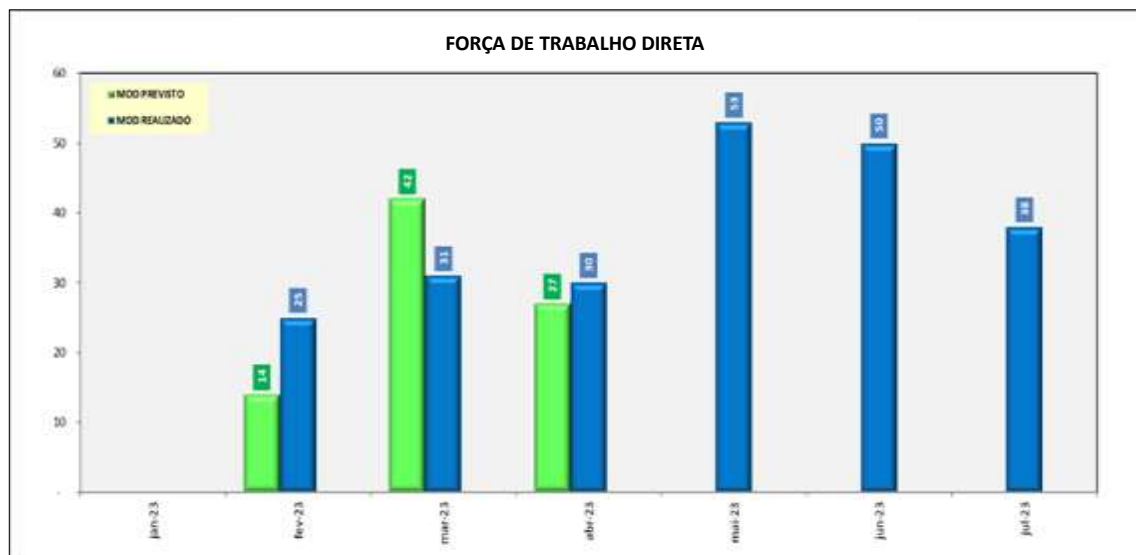

Equipamentos Principais

Gráfico 15: Equipamentos Principais (Contrato 4300000595b – Consórcio MRF – Finalizado)

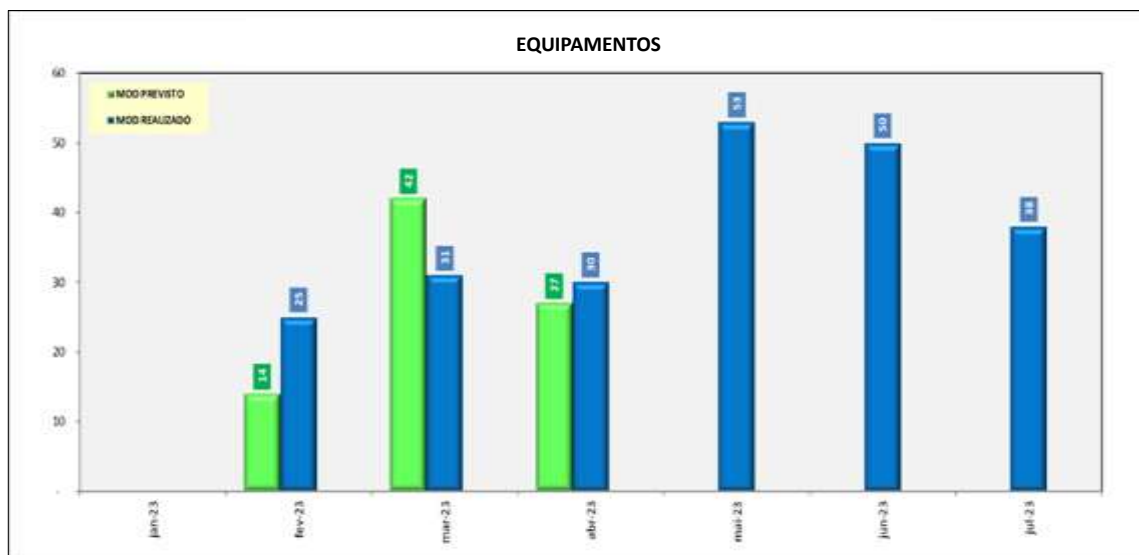

Nota: A partir de setembro de 2023, a Punch List da bacia do Chico foi realizada pelo Consórcio Ápia-EXE (Contrato 4300000630). Os recursos foram contemplados nos histogramas deste contrato.

8.7.4 Cava do Germano – TCLD 11CV027

Contrato 4300000642 - Hexágono Engenharia (concluído)

Execução das obras de complementação das bases do transportador CV-027, terraplanagem e drenagens superficiais na região da Filtragem


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Força de Trabalho Direta

Gráfico 16: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000642 – Hexágono Engenharia – Finalizado)

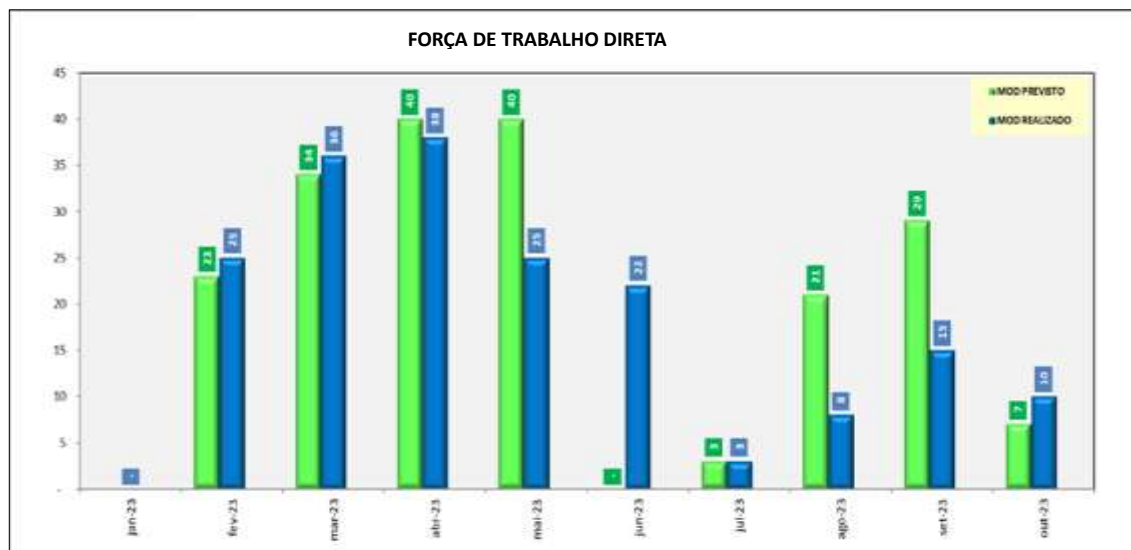


8.7.5 Barragem e Cava do Germano – Sistema de Manuseio de Estéril e Rejeitos Arenosos

Contrato 4300000794 - Milplan Engenharia (concluído)

Execução das obras de montagem eletromecânica dos transportadores CV-027, CV-081, CV-082, CV-088, CV-089, CV-090, CV-097, CV-115 e CV-116 e subestações SE-071, SE-072 e SE-073

Força de Trabalho Indireta

Gráfico 17: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000794 – Milplan Engenharia – Finalizado)

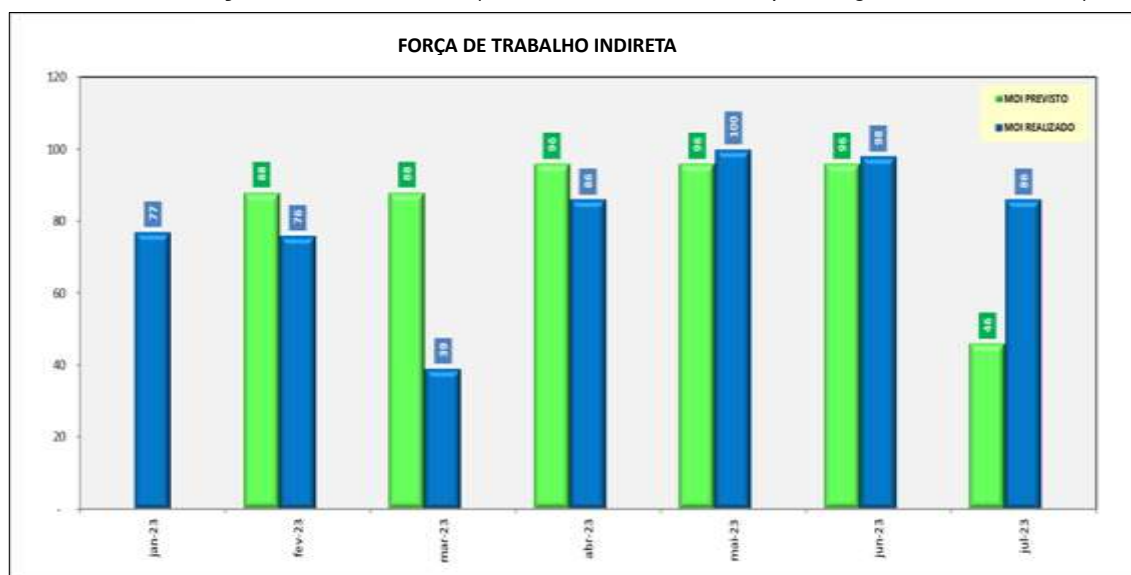


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025


Força de Trabalho Direta

Gráfico 18: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000794 – Milplan Engenharia – Finalizado)

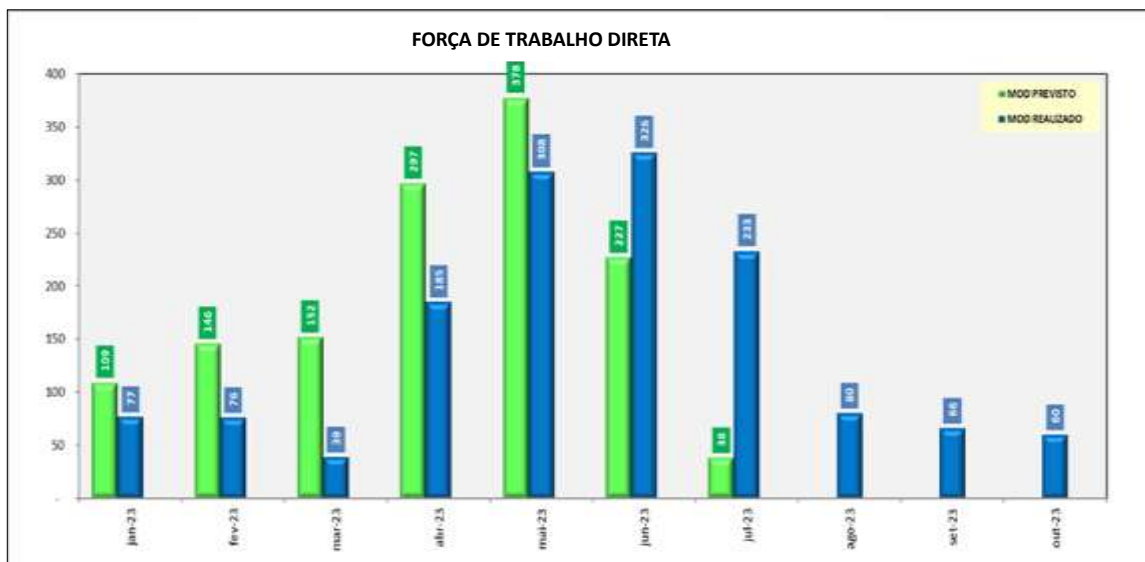

Equipamentos Principais

Gráfico 19: Equipamentos Principais (Contrato 4300000794 – Milplan Engenharia – Finalizado)

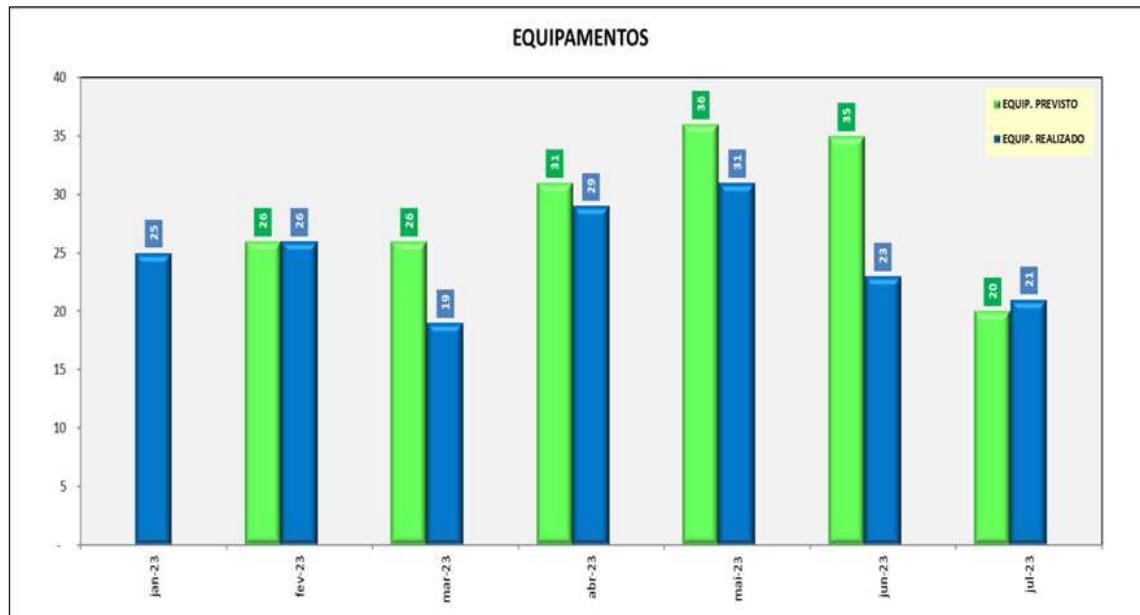

8.7.6 Cava do Germano – Contenções dos Transportadores

Contrato 4300000764 - Progeo Engenharia (concluído)

Execução das obras de contenções (contenções 4 e 4A) e bases do TCLD CV-090 (eixos 70 a 73) na região do Pinheirinho.


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025


Força de Trabalho Indireta

Gráfico 20: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000764 – Progeo Engenharia – Finalizado)

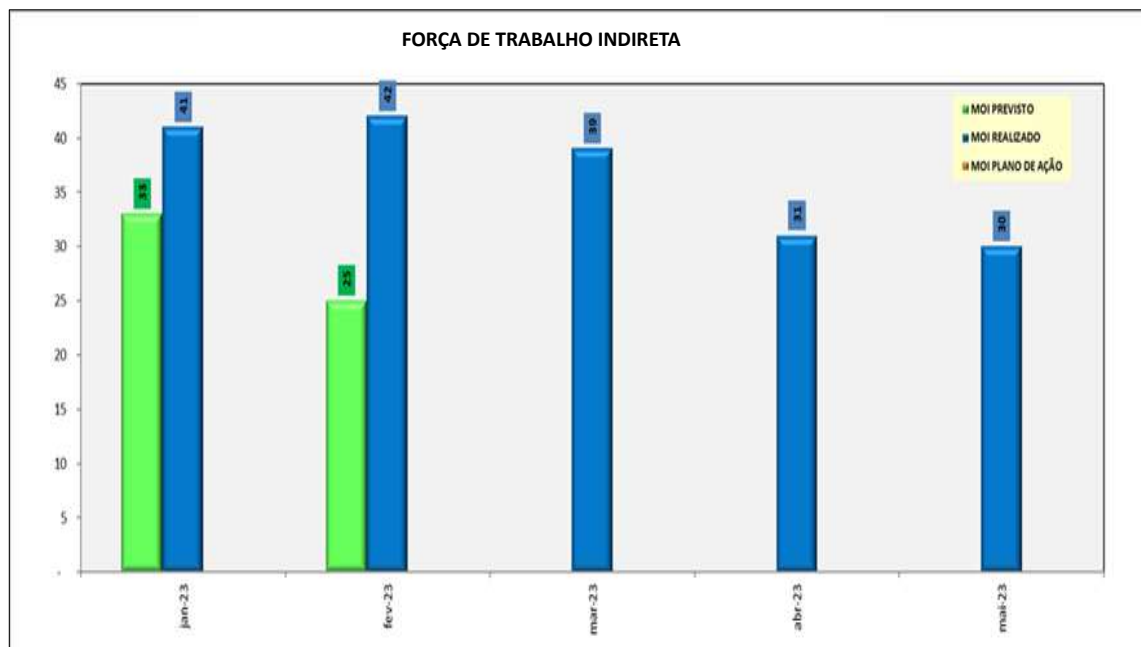

Força de Trabalho Direta

Gráfico 21: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000764 – Progeo Engenharia – Finalizado)

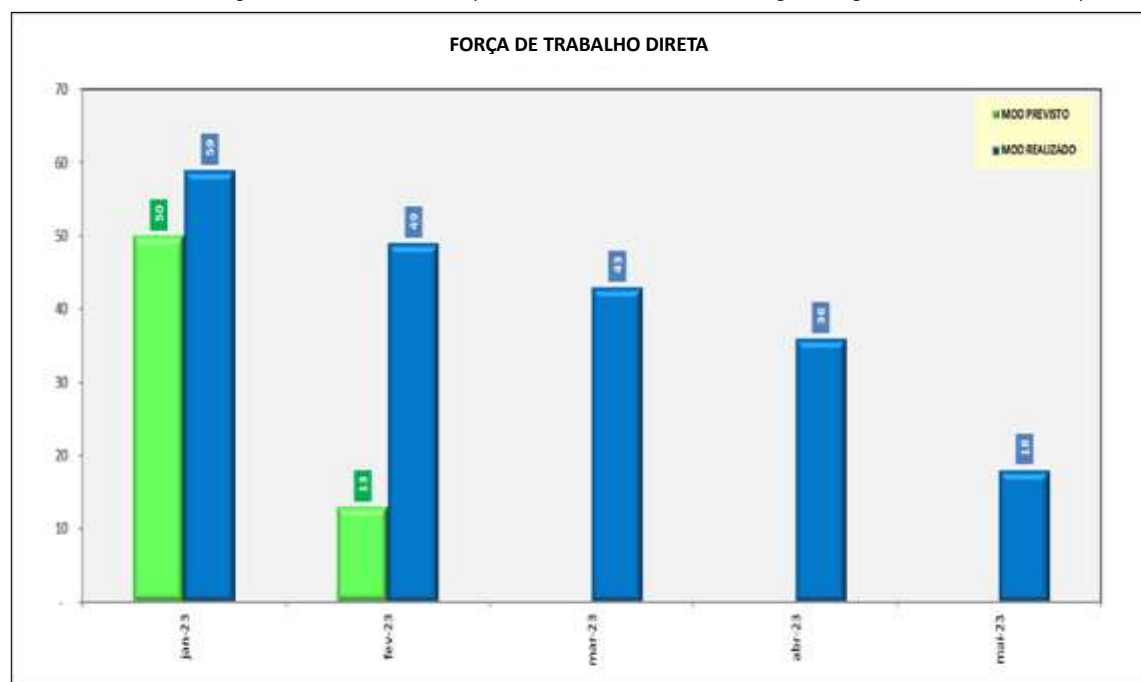


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Equipamentos Principais

Gráfico 22: Equipamentos Principais (Contrato 4300000764 – Progeo Engenharia – Finalizado)

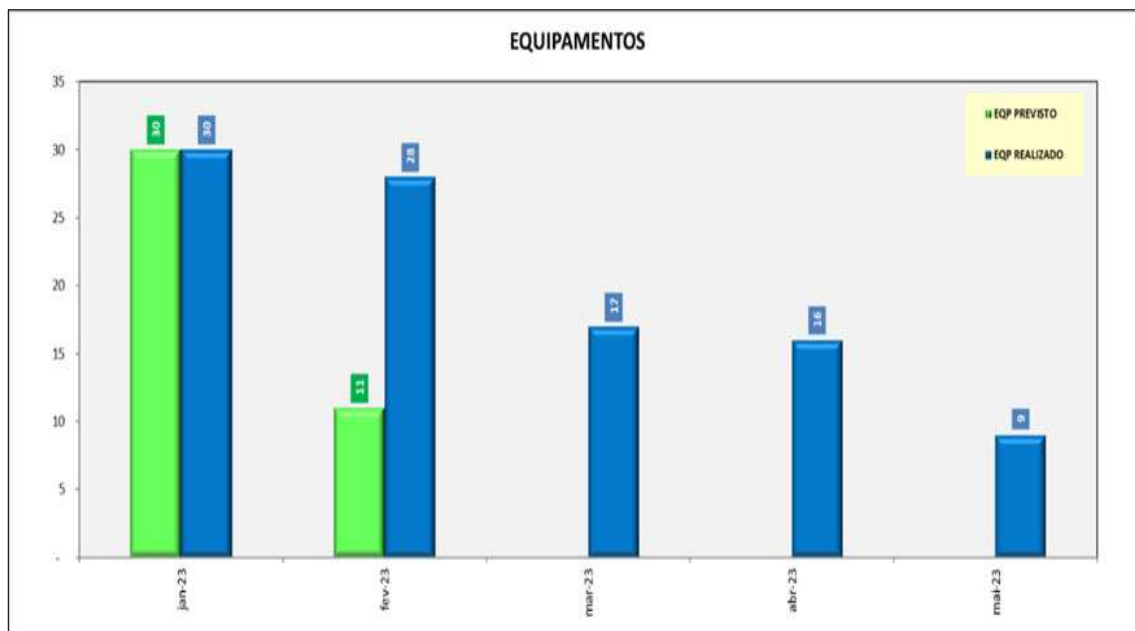


8.7.7 Barragem do Germano – Descaracterização Etapa 1

Contrato 4300000106 - Consórcio MRF (concluído)

Regrade Etapa 1, Canal Drenagem Principal, Preenchimento do Eixo 1 Etapa 1 e Berma de Reforço da Barragem Principal

Força de Trabalho Indireta

Gráfico 23: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000106 – Consórcio MRF – Finalizado)

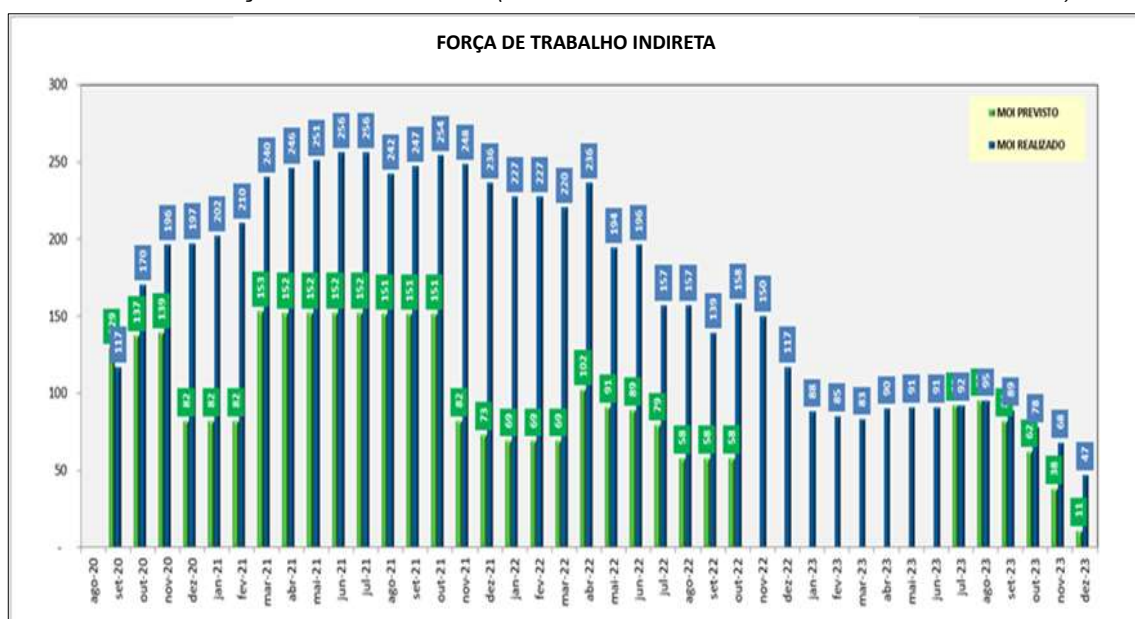


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




Força de Trabalho Direta

Gráfico 24: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000106 – Consórcio MRF – Finalizado)

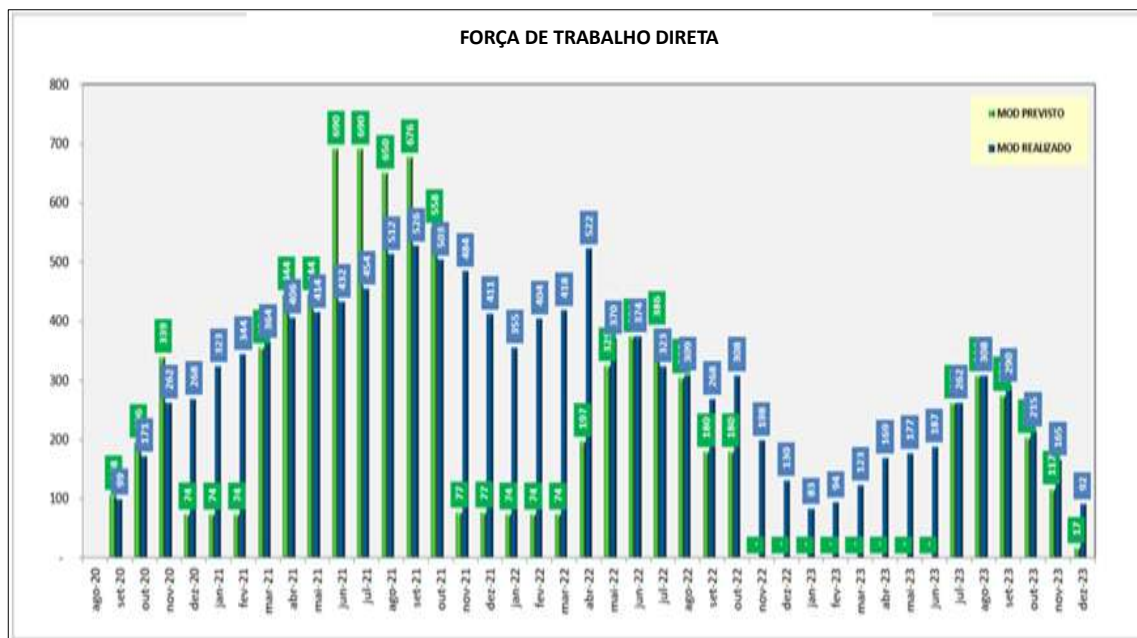

Equipamentos

Gráfico 25: Equipamentos Principais (Contrato 4300000106 – Consórcio MRF – Finalizado)

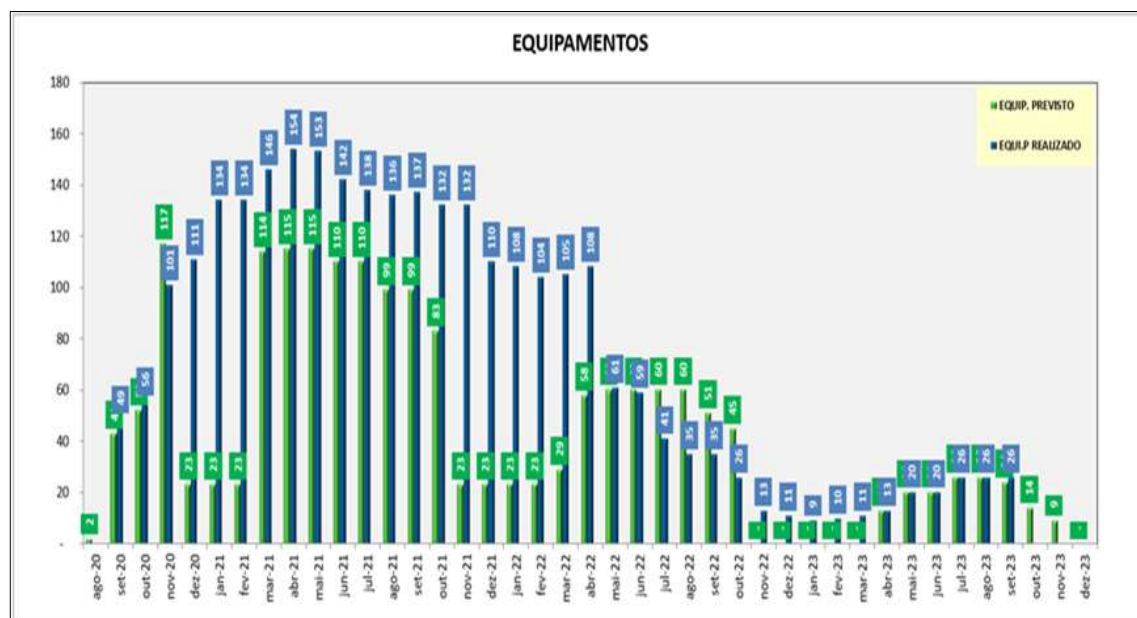

8.7.1 Barragem e Cava do Germano – Regrade Etapa 2/3

Contrato 4300000630 - Consórcio Ápia-EXE (concluído)

Regrade Etapas 2 e 3 da Barragem e da Cava

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




Força de Trabalho Indireta

Gráfico 26: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000630 – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)

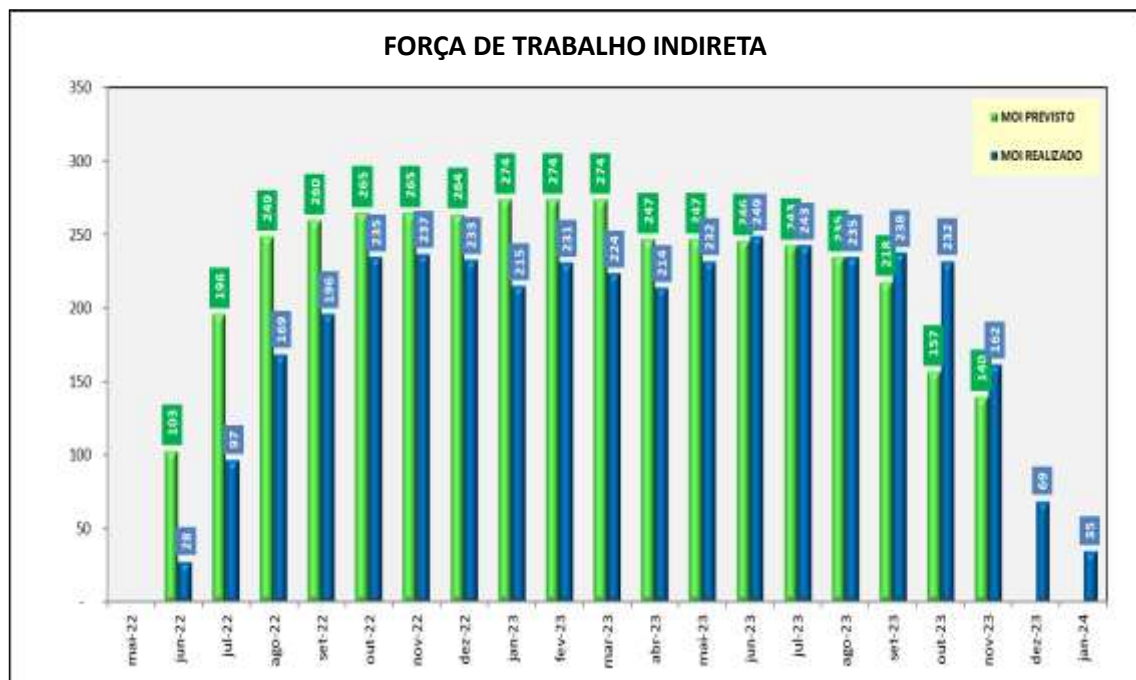

Força de Trabalho Direta

Gráfico 27: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000630 – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)

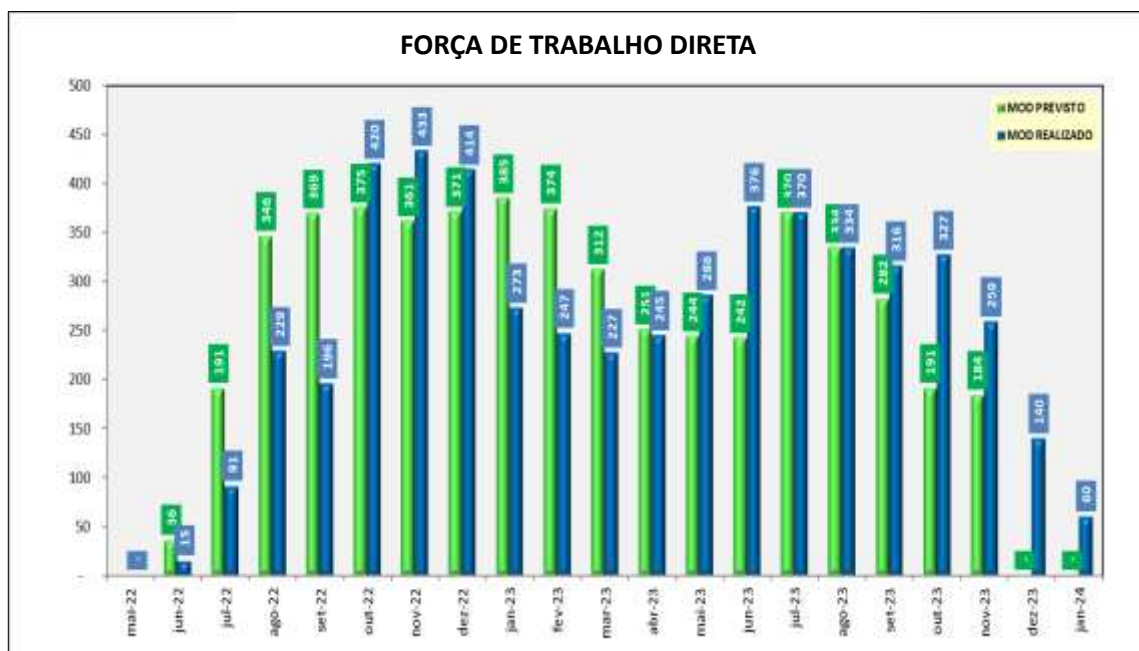


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Equipamentos Principais

Gráfico 28: Equipamentos Principais (Contrato 4300000630 – Consórcio Ápia-EXE – Finalizado)

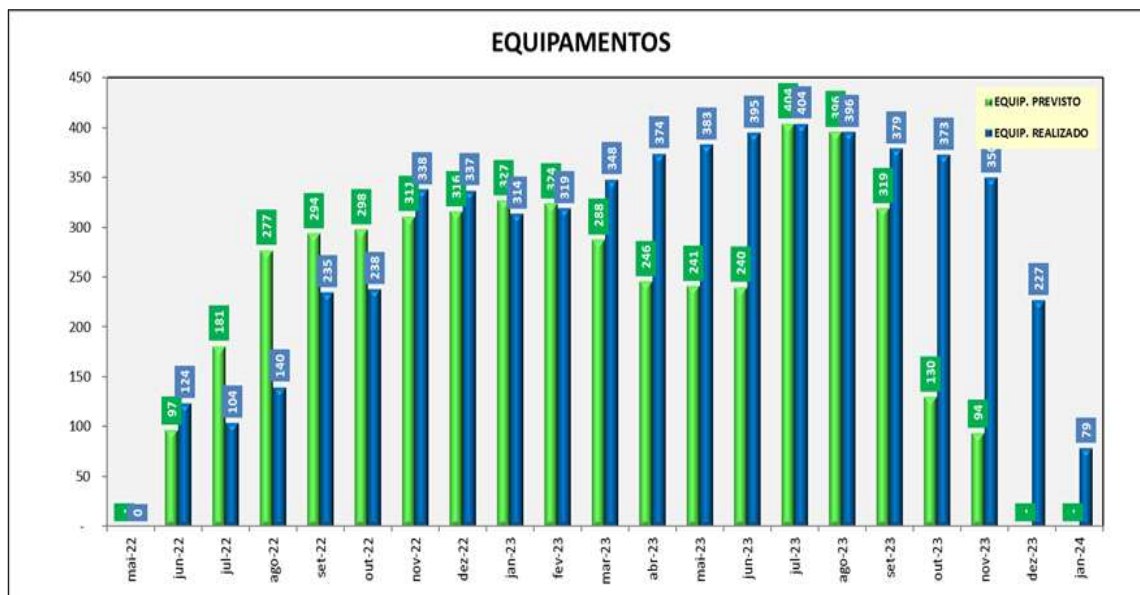


8.7.1 Barragem do Germano – Descaracterização da Barragem

Contrato 4300000868 - Progeo Engenharia (concluído)

Serviços de Sistemas de proteções e contenções nos taludes do complexo de Germano e serviços da bacia final do Canal de Drenagem Principal da Barragem de Germano.

Força de Trabalho Indireta

Gráfico 29: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000868 – Progeo - Finalizado)

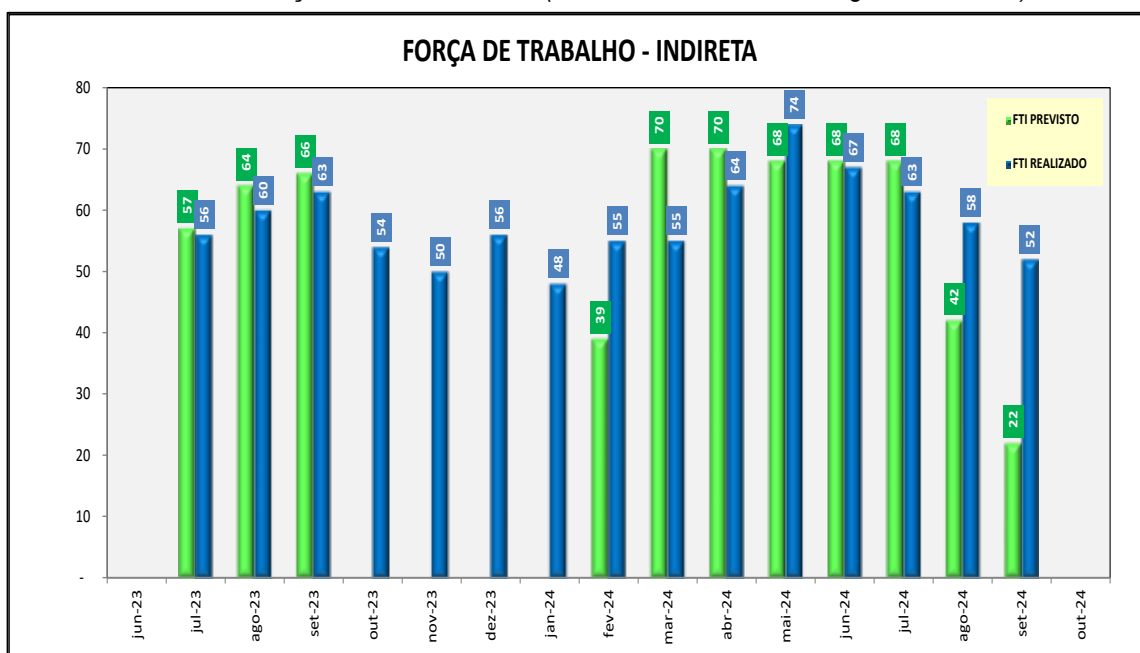


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025


Força de Trabalho Direta

Gráfico 30: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000868 – Progeo - Finalizado)

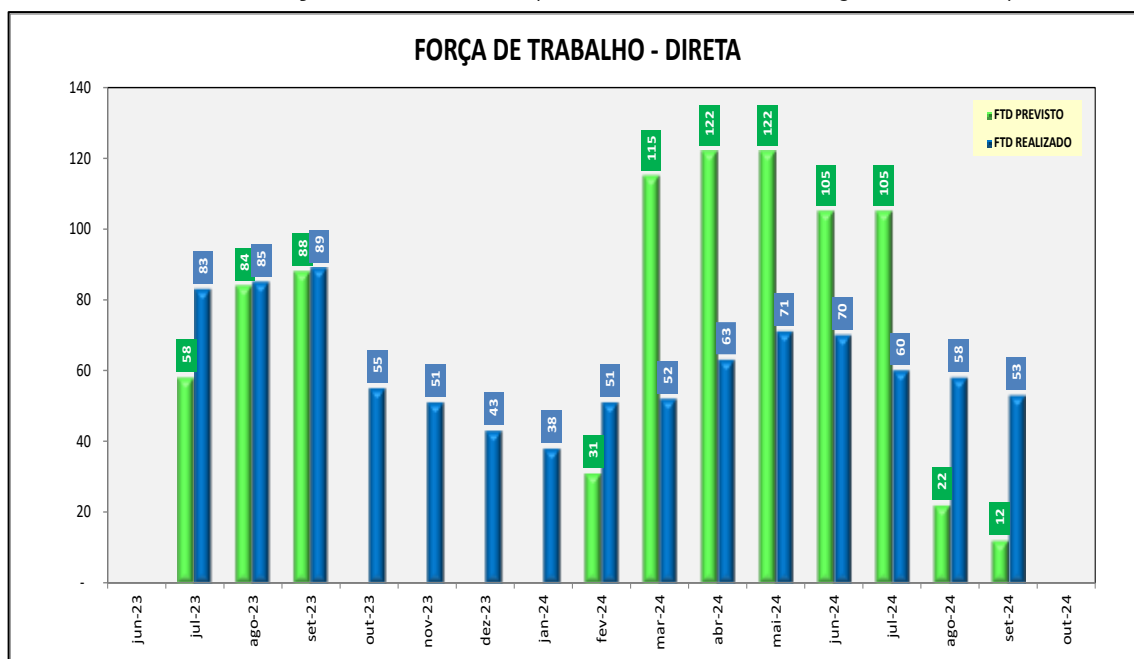

Equipamentos Principais

Gráfico 31: Equipamentos Principais (Contrato 4300000868 – Progeo - Finalizado)

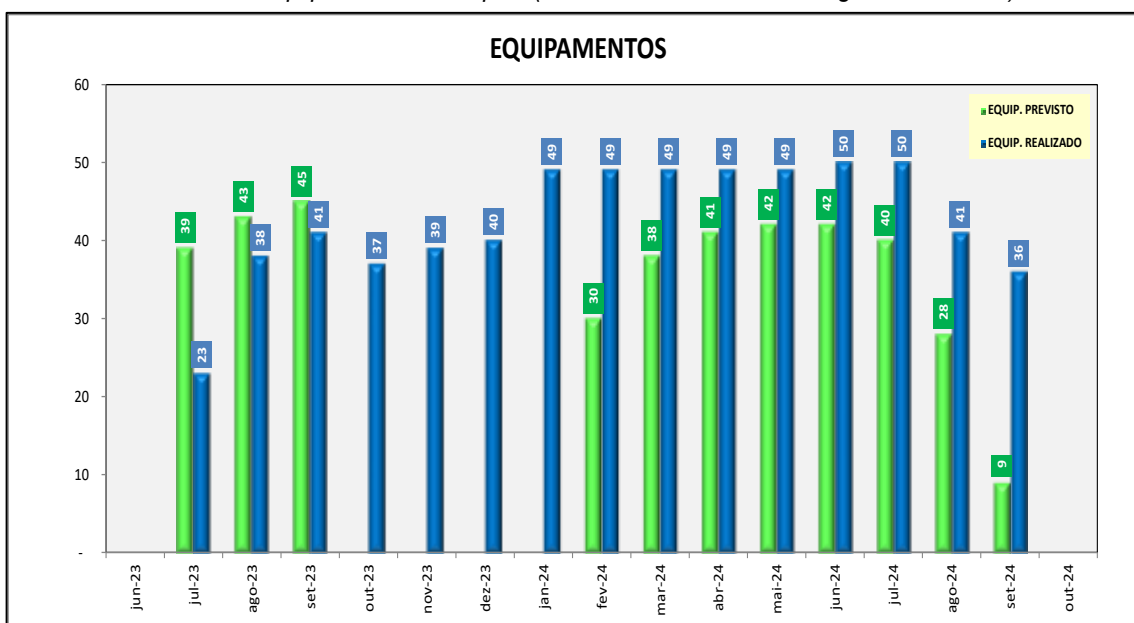

8.7.2 Barragem do Germano – Descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha

Contrato 4300000595 - Consórcio MRF (concluído)

Descaracterização dos Diques Sela Tulipa e Selinha, Preenchimento do Eixo 1
Etapa 2 e Regrade Etapa 1D

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




Força de Trabalho Indireta

Gráfico 32: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300000595 – Consórcio MRF - Finalizado)

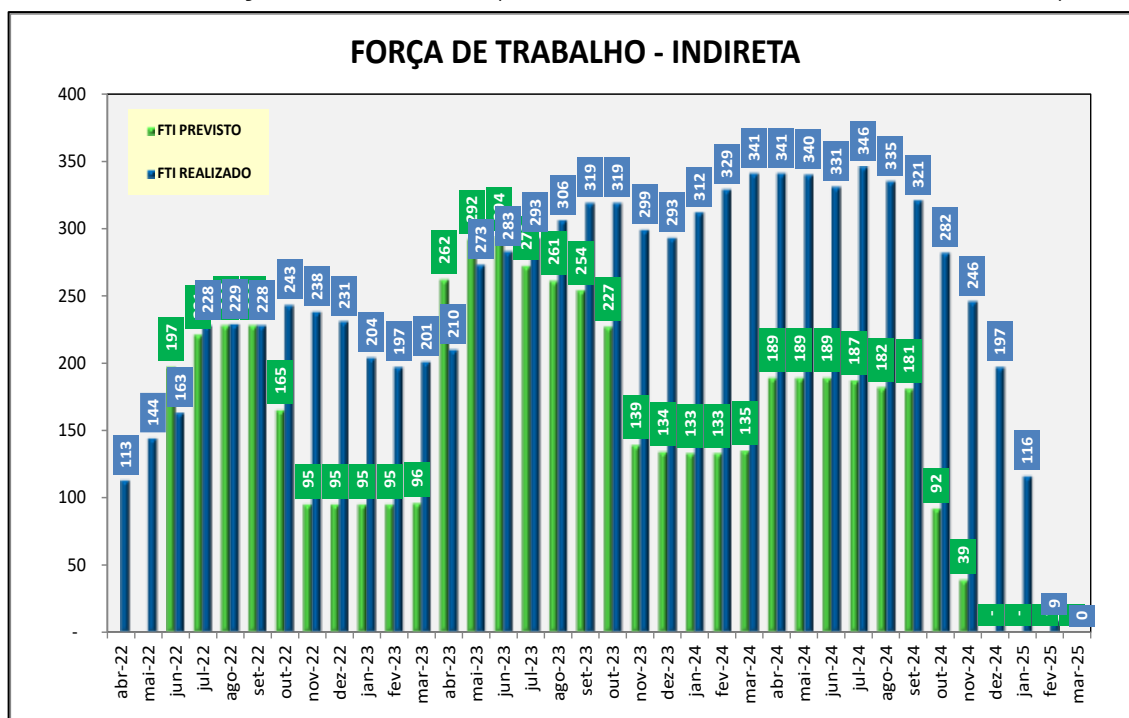

Força de Trabalho Direta

Gráfico 33: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300000595 – Consórcio MRF - Finalizado)

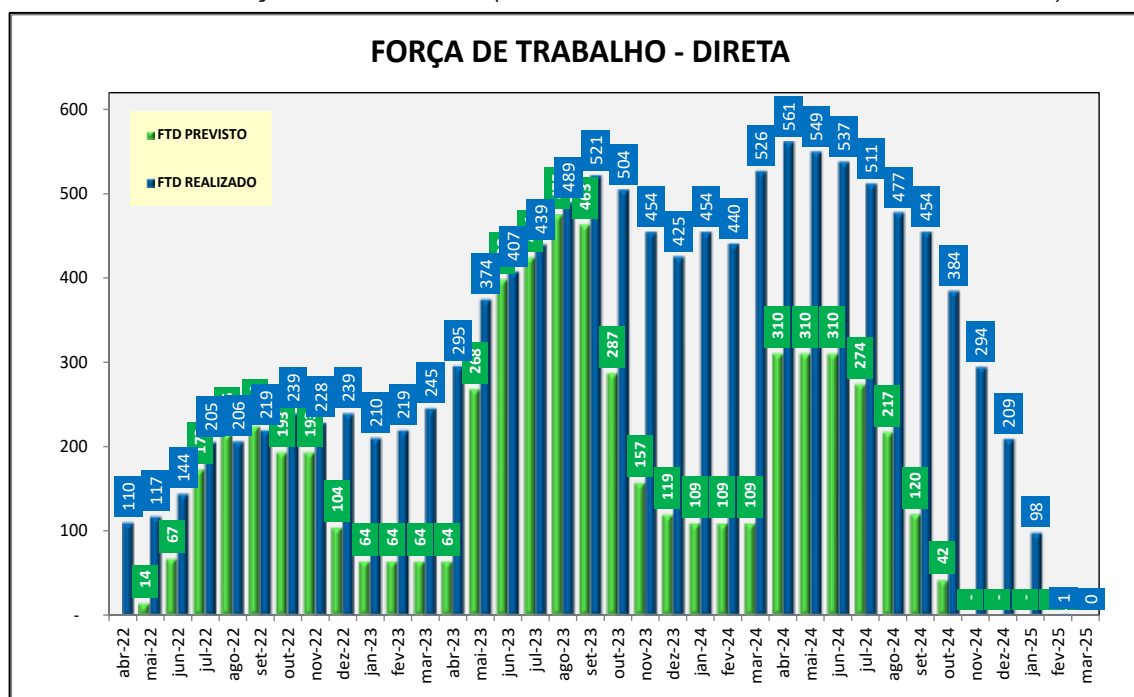


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Equipamentos Principais

Gráfico 34: Equipamentos Principais (Contrato 4300000595 – Consórcio MRF - Finalizado)

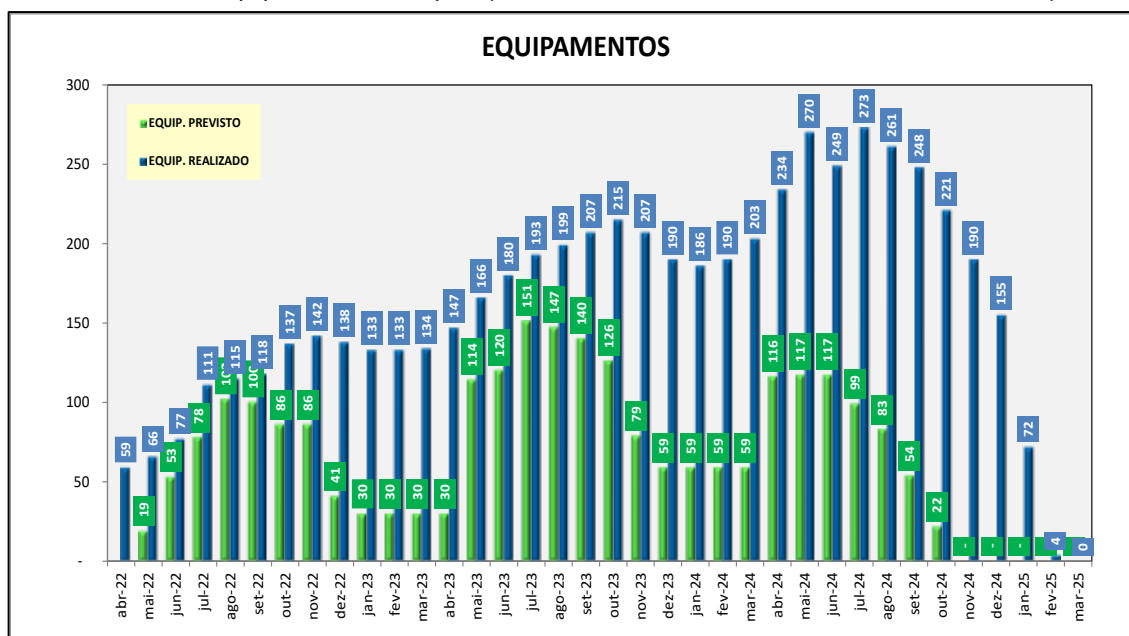


8.7.3 Barragem do Germano – Descaracterização da Barragem

Contrato 4300001308 - Ápia (em andamento)

Execução do Regrade Etapa 3, Regrade a Montante de Sela Tulipa e Drenagem Superficial.

Força de Trabalho Indireta

Gráfico 35: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300001308 – Ápia)

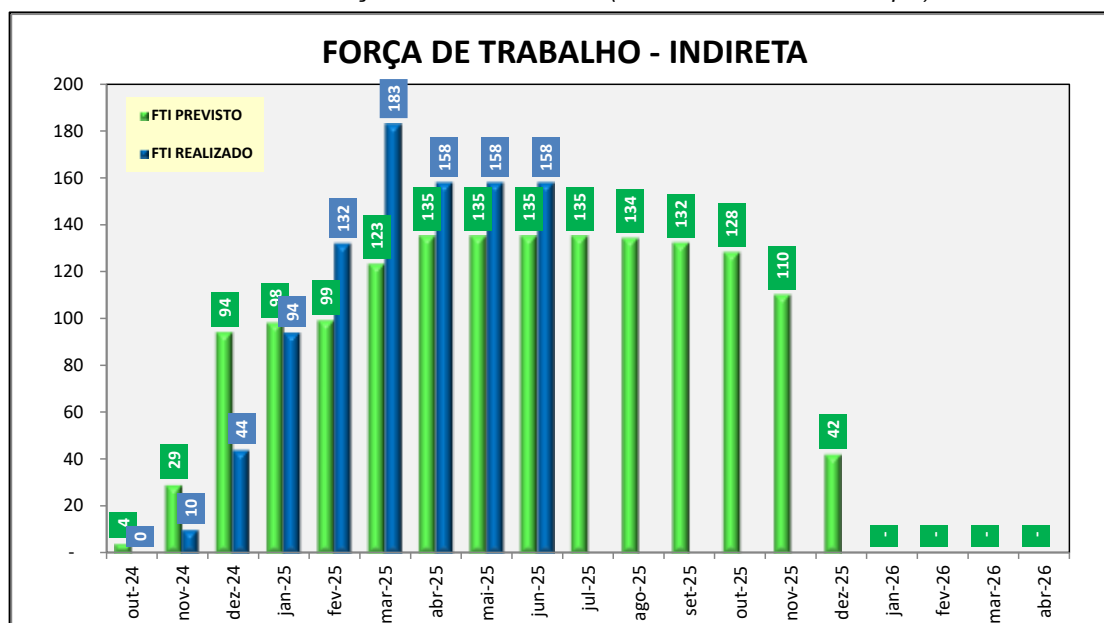

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL N°14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




Força de Trabalho Direta

Gráfico 36: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300001308 – Ápia)

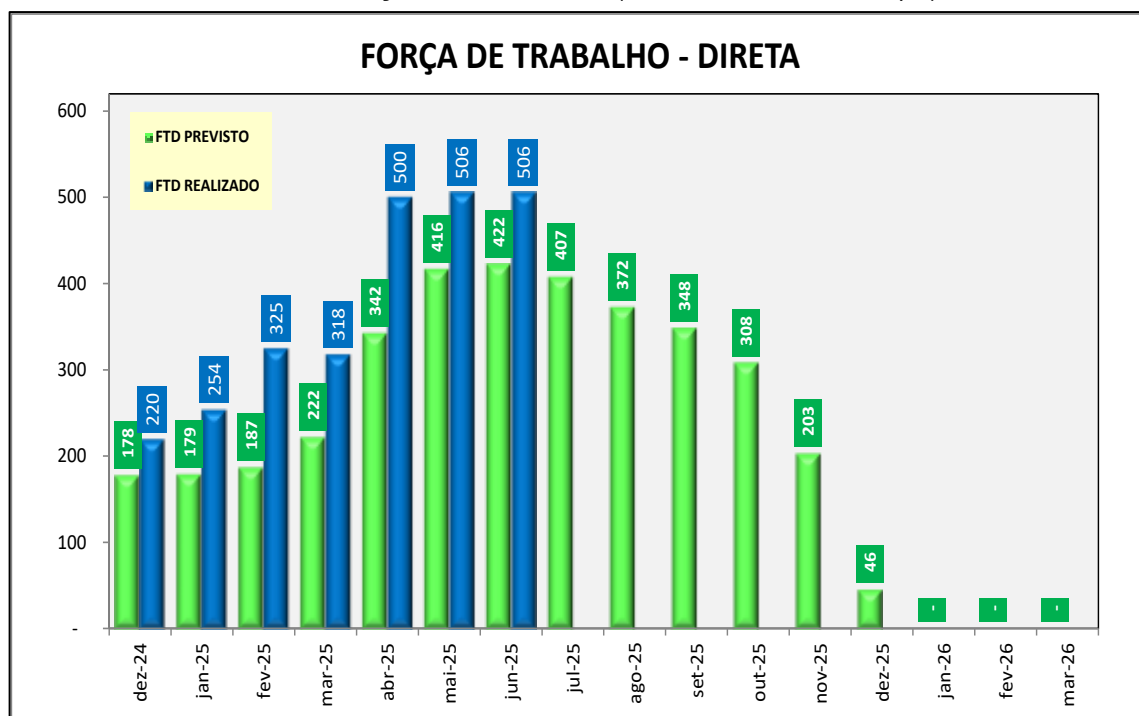

Equipamentos Principais

Gráfico 37: Equipamentos Principais (Contrato 4300001308 – Ápia)

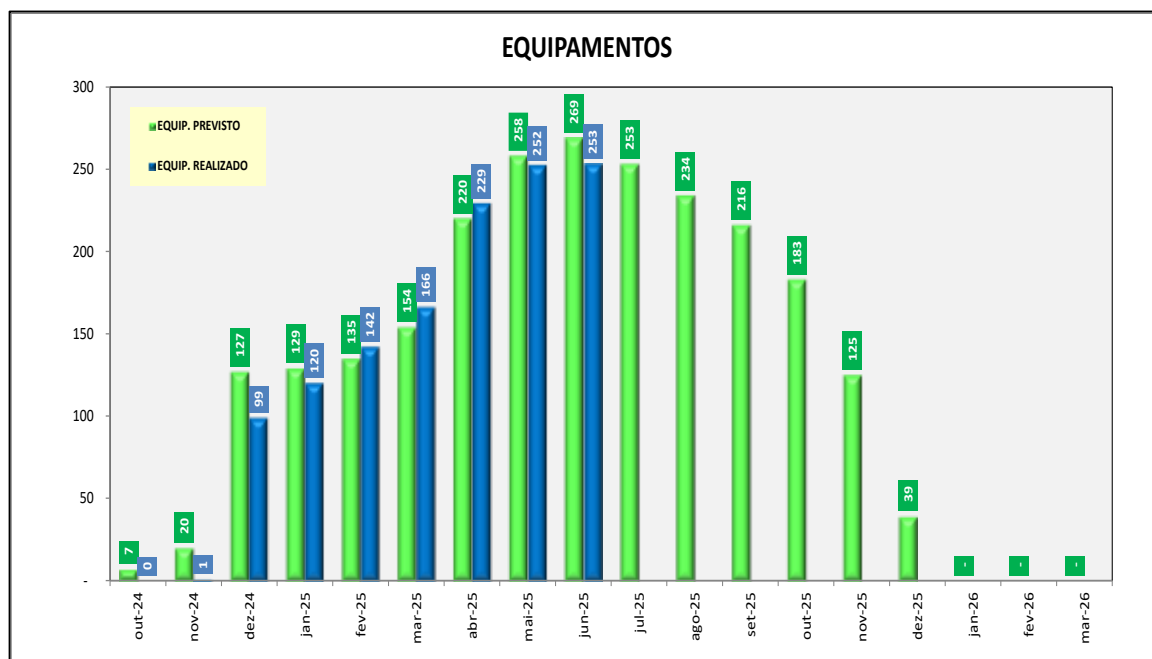

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




8.7.1 Barragem do Germano – Descaracterização da Barragem

Contrato 4300001042 - CRD (concluído)

Execução do Regrade a Montante de Sela Tulipa e Drenagem Superficial.


Força de Trabalho Indireta

Gráfico 38: Força de Trabalho Indireta (Contrato 4300001042 – CRD - Finalizado)

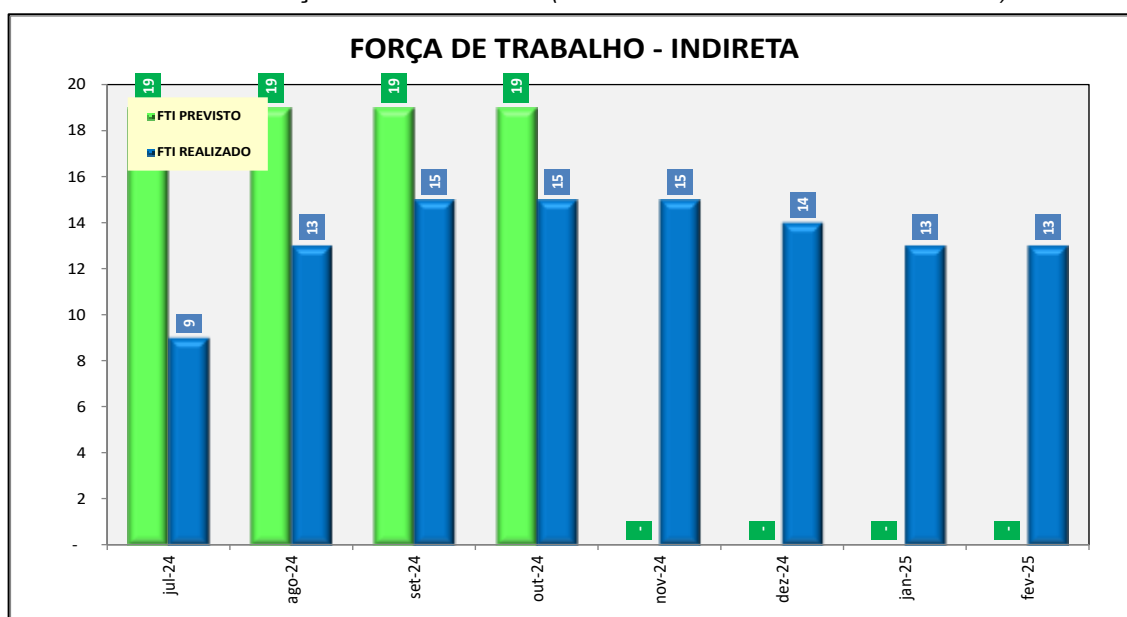

Força de Trabalho Direta

Gráfico 39: Força de Trabalho Direta (Contrato 4300001042 – CRD - Finalizado)

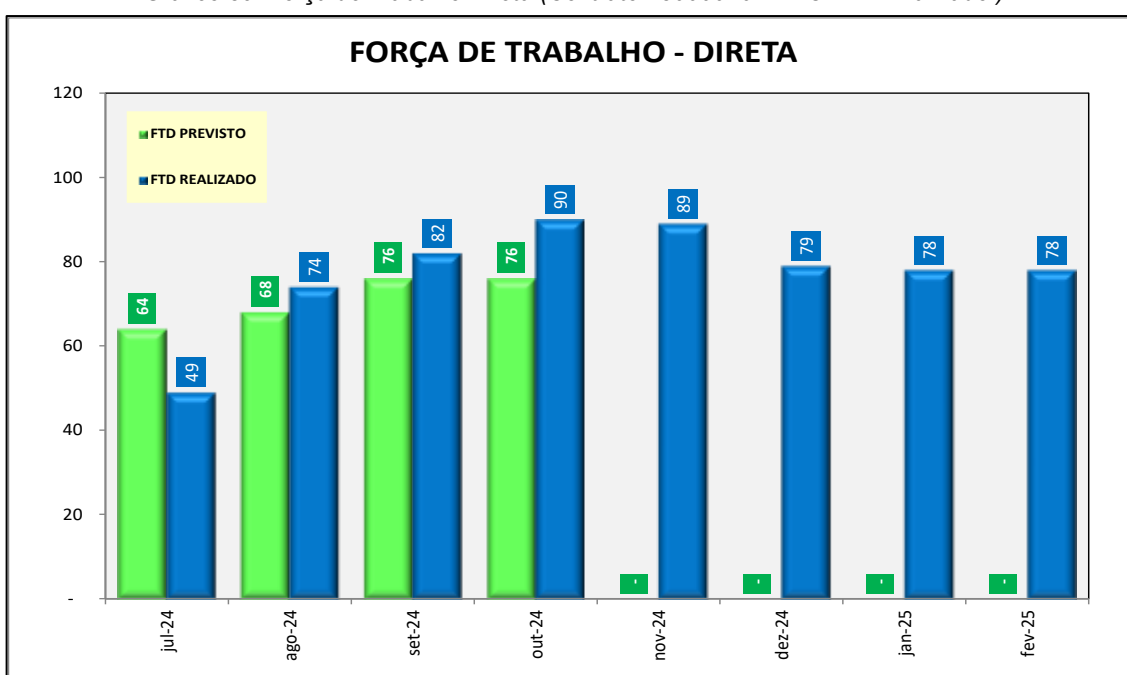

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Equipamentos Principais

Gráfico 40: Equipamentos Principais (Contrato 4300001042 – CRD - Finalizado)

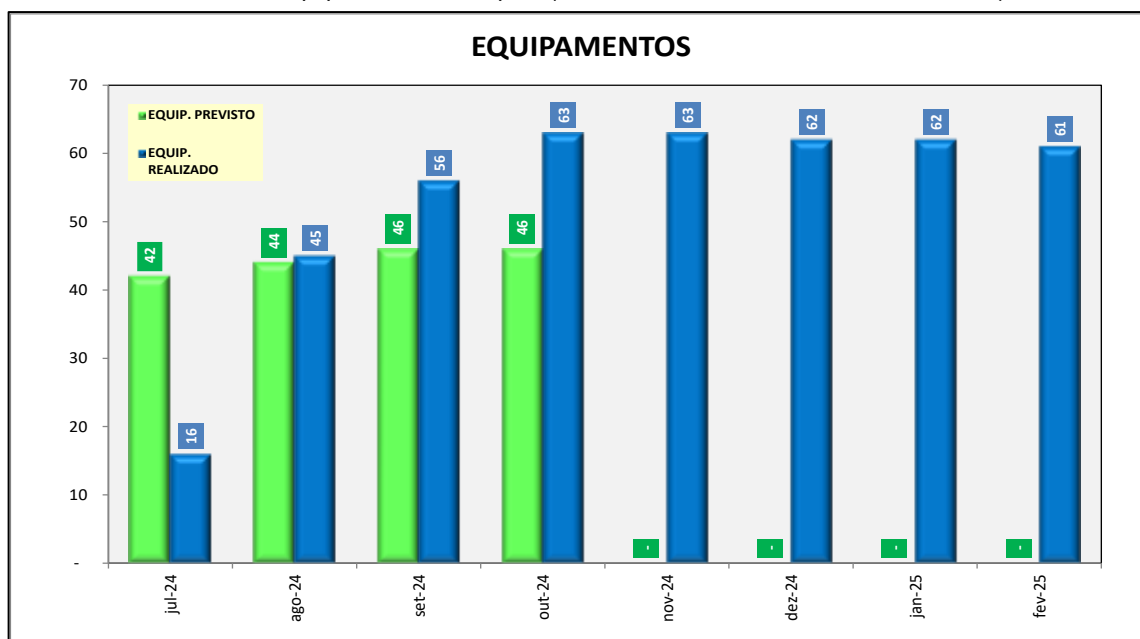

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



9. DESEMPENHO DO SUPRIMENTO

Este item tem a finalidade de atender às Recomendações 2, 6 e 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23.

9.1 Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes de Suprimentos

9.1.1 Barragem do Germano

A tabela 35 apresenta a composição dos desvios (positivos ou negativos) de Suprimentos da Barragem do Germano que constam na Tabela 30: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados no Período – Programa Descaracterização, Item 7.3 do presente relatório.

Tabela 35: Composição do Desvios / Ações dos Pacotes de Suprimentos da Barragem

BARRAGEM - PRINCIPAIS DESVIOS / AÇÕES DO SUPRIMENTOS					
PACOTE	PESO DESVIO TC	TÉRMINO TC	TENDÊNCIA	ANÁLISE DOS DESVIOS	AÇÕES
MATERIAL - FORNECIMENTO DE AGREGADOS - REGRADE	4,760%	08/07/2028	08/06/2026	. O desvio positivo é decorrente da execução das obras do Regrade estarem adiantadas em relação ao previsto na Linha de Base. Face ao avanço, a Samarco considera antecipar a conclusão das obras do Regrade.	. Monitoramento do estoque de materiais no pátio de agregados da Samarco.
Total Suprimentos Barragem >>>>	4,760%				

Nota: Obras de descaracterização da Cava foram concluídas em junho de 2023.

9.2 Atividades Principais de Suprimentos Executadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

BARRAGEM DO GERMANO	CAVA DO GERMANO
Agregados: Continuação do fornecimento de material, a partir do pátio de estocagem da Samarco e externo, para as obras para as obras do <i>Regrade</i> (incluindo os canais de drenagem superficiais).	Não aplicável (obras de descaracterização finalizadas).

9.3 Atividades Principais de Suprimentos Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

BARRAGEM DO GERMANO	CAVA DO GERMANO
Agregados: Continuação do fornecimento de material, a partir do pátio de estocagem da Samarco e externo, para as obras para as obras do <i>Regrade</i> (incluindo os canais de drenagem superficiais).	Não aplicável (obras de descaracterização finalizadas).

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



9.4 Principais Materiais – Fornecimento

Tabela 36: Principais Materiais de 2021 – Acumulados Previstos x Realizados

RECEBIMENTO DE AGREGADOS - ANO 2021 DESCARACTERIZAÇÃO DA CAVA E BARRAGEM DO GERMANO									
DESCRIÇÃO		QUANTITATIVOS (t)				QUANTITATIVOS (m³)			
MATERIAL	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
PEDRA DE MÃO	Concluído	160.828	160.828	0	100%	84.646	84.646	0	100%
ENROCAMENTO	Concluído	29.160	29.160	0	100%	12.960	12.960	0	100%
ENROCAMENTO E1	Concluído	110.661	110.661	0	100%	51.773	51.773	0	100%
ENROCAMENTO E2	Concluído	245.638	245.638	0	100%	111.653	111.653	0	100%
ENROCAMENTO 400mm	Concluído	14.718	14.718	0	100%	6.541	6.541	0	100%
ENROCAMENTO 400mm a 8	Concluído	8.878	8.878	0	100%	4.723	4.723	0	100%
BRITA 3	Concluído	1.338	1.338	0	100%	686	686	0	100%
BRITA	Concluído	69.574	69.574	0	100%	35.679	35.679	0	100%
BICA CORRIDA	Concluído	9.000	9.000	0	100%	4.615	4.615	0	100%
AREIA	Concluído	65.269	65.269	0	100%	42.415	42.415	0	100%
		715.063	715.063	0	100,0%	355.692	355.692	0	100,0%

Tabela 37: Principais Materiais de 2022 – Acumulados Previstos x Realizados

RECEBIMENTO DE AGREGADOS - ANO 2022 DESCARACTERIZAÇÃO DA CAVA E BARRAGEM DO GERMANO									
DESCRIÇÃO		QUANTITATIVOS (t)				QUANTITATIVOS (m³)			
MATERIAL	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
PEDRA DE MÃO RACHÃO	Concluído	4.347	4.347	0	100%	2.688	2.688	0	100%
PEDRA DE MÃO DC	Concluído	2.823	2.823	0	100%	1.746	1.746	0	100%
PEDRA DE MÃO	Concluído	126.035	126.035	0	100%	78.299	78.299	0	100%
ENROCAMENTO E1 B	Concluído	5.009	5.009	0	100%	3.049	3.049	0	100%
ENROCAMENTO E1 A	Concluído	49.988	49.988	0	100%	30.425	30.425	0	100%
ENROCAMENTO E1	Concluído	297.538	297.538	0	100%	183.005	183.005	0	100%
BRITA T2 DC	Concluído	2.966	2.966	0	100%	1.935	1.935	0	100%
BRITA T2 B	Concluído	19.984	19.984	0	100%	13.036	13.036	0	100%
BRITA T2 A	Concluído	10.338	10.338	0	100%	6.743	6.743	0	100%
BRITA T2	Concluído	109.104	109.104	0	100%	71.170	71.170	0	100%
BRITA 03 DC	Concluído	1.773	1.773	0	100%	1.157	1.157	0	100%
BRITA 03	Concluído	260	260	0	100%	203	203	0	100%
BRITA 02	Concluído	7.787	7.787	0	100%	5.857	5.857	0	100%
BRITA 0	Concluído	3.138	3.138	0	100%	2.037	2.037	0	100%
BICA CORRIDA	Concluído	33.659	33.659	0	100%	24.650	24.650	0	100%
AREIA T1	Concluído	3.600	3.600	0	100%	2.815	2.815	0	100%
AREIA	Concluído	120.231	120.231	0	100%	94.004	94.004	0	100%
		798.580	798.580	0	100,0%	522.819	522.819	0	100,0%

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 38: Principais Materiais de 2023 – Acumulados Previstos x Realizados

RECEBIMENTO DE AGREGADOS - ANO 2023									
DESCARACTERIZAÇÃO DA CAVA E BARRAGEM DO GERMANO									
DESCRIÇÃO		QUANTITATIVOS (t)				QUANTITATIVOS (m³)			
MATERIAL	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
PEDRA DE MÃO	Concluído	406.209	406.209	0	100,0%	253.881	253.881	0	100,0%
ENROCAMENTO D500mm	Concluído	3.594	3.594	0	100,0%	2.246	2.246	0	100,0%
ENROCAMENTO D50	Concluído	2.199	2.199	0	100,0%	1.374	1.374	0	100,0%
ENROCAMENTO E1	Concluído	146.034	146.034	0	100,0%	91.271	91.271	0	100,0%
BLOCO D50	Concluído	1.777	1.777	0	100,0%	1.110	1.110	0	100,0%
MATACO	Concluído	4.600	4.600	0	100,0%	2.875	2.875	0	100,0%
BRITA	Concluído	5.709	5.709	0	100,0%	3.910	3.910	0	100,0%
BRITA 2	Concluído	135	135	0	100,0%	93	93	0	100,0%
BRITA T2	Concluído	223.333	223.333	0	100,0%	152.968	152.968	0	100,0%
BICA CORRIDA	Concluído	69.786	69.786	0	100,0%	44.085	44.085	0	100,0%
AREIA	Concluído	238.446	238.446	0	100,0%	186.286	186.286	0	100,0%
		1.101.822	1.101.822	0	100,0%	740.099	740.099	0	100,0%

Tabela 39: Principais Materiais de 2024 – Acumulados Previstos x Realizados

RECEBIMENTO DE AGREGADOS - ANO 2024									
DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM DO GERMANO									
DESCRIÇÃO		QUANTITATIVOS (t)				QUANTITATIVOS (m³)			
MATERIAL	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
PEDRA DE MÃO	Concluído	179.249	179.249	0	100,0%	113.850	113.850	0	100,0%
ENROCAMENTO E1	Concluído	214.145	214.145	0	100,0%	133.841	133.841	0	100,0%
BLOCO D50	Concluído	9.038	9.038	0	100,0%	5.649	5.649	0	100,0%
BRITA 2	Concluído	103.230	103.230	0	100,0%	65.335	65.335	0	100,0%
BICA CORRIDA	Concluído	54.298	54.298	0	100,0%	34.300	34.300	0	100,0%
BRITA	Concluído	2.989	2.989	0	100,0%	2.047	2.047	0	100,0%
AREIA	Concluído	17.976	17.976	0	100,0%	14.044	14.044	0	100,0%
BRITA T2	Concluído	988	988	0	100,0%	677	677	0	100,0%
		581.913	581.913	0	100,0%	369.743	369.743	0	100,0%

Tabela 40: Principais Materiais de 2025 – Acumulados Previstos x Realizados (em andamento)

PLANILHA DE RECEBIMENTO DE AGREGADOS - PEDIDOS ANO 2025									
BARRAGEM DE GERMANO									
DESCRIÇÃO		QUANTITATIVOS (t)				QUANTITATIVOS (m³)			
MATERIAL	STATUS	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
PEDRA DE MÃO	Finalizado	170.767	169.922	846	99,50%	106.730	106.201	529	99,50%
ENROCAMENTO E1	Em andamento	125.918	46.992	78.926	37,32%	78.699	29.370	49.329	37,32%
BRITA 2	Finalizado	139.631	139.605	26	99,98%	88.374	88.358	16	99,98%
AREIA	Em andamento	200.000	151.341	48.659	75,67%	156.250	118.235	38.015	75,67%
		636.316	507.860	128.456	79,81%	430.052	342.164	87.888	79,56%

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



10. ENGENHARIA

Além do atendimento ao Termo de Compromisso, este item se destina a atender às Recomendações 2, 6, 7 e 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23.

10.1 Integração entre as Engenharias

A integração entre as projetistas de Engenharia (Stantec, BVP, JM Souto, VLB e ECM) foi conduzida pela Samarco, e teve como ponto central a Engenharia Conceitual do programa, desenvolvida em sua maior parte pela empresa Stantec. Desse modo, toda a base de desenvolvimento técnico gerada pela Stantec fundamentou o desenvolvimento das demais projetistas.

10.2 Tramitação de Documentação Técnica

O sistema corporativo da Samarco (SAP R3) é utilizado para formalizar toda a tramitação da documentação técnica emitida pelas empresas de Engenharia e fornecedores, bem como a documentação comentada pelas equipes da Samarco.

Os documentos aprovados para emissão por parte das projetistas devem ser cadastrados com atributos específicos (número do documento, disciplina, tipo de emissão, finalidade e destinatários, entre outros). A partir do cadastro é criada, automaticamente, a Guia de Remessa de Documento (GRD) e encaminhada para arquivo, indicando os documentos disponibilizados na rede da Samarco.

Os documentos emitidos pelas projetistas para as diferentes disciplinas são avaliados e aprovados pela equipe de Engenharia da Samarco, obedecendo fluxo de aprovação estruturado no sistema SAP, utilizado para controle e arquivamento dos documentos pertinentes. Concluído o trâmite interno de validação, a resposta a cada documento aprovado ou comentado é feita através do Centro de Documentação e Informação (CDI).

Após aprovação por parte da Engenharia da Samarco, a projetista emite eletronicamente cada documento em versão final para construção, de acordo com o tipo.

Periodicamente, a equipe de gestão documental verifica quais documentos foram aprovados para construção e, junto com a equipe de Planejamento, define quais serão disponibilizados às empresas contratadas para execução das obras.

10.3 Registro de Adequações

As obras do Programa Descaracterização do Germano vêm sendo executadas seguindo rigorosamente o planejamento original elaborado pela Engenharia da Samarco e os projetos executivos aprovados e liberados para construção.

A Samarco mantém Acompanhamento Técnico de Obras (ATO), vinculado diretamente à Engenharia durante todo o período de execução das obras, em todas as frentes e etapas construtivas para cada disciplina (Civil, Elétrica, Geotecnia, Instrumentação, Mecânica,

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




entre outras), de forma adequada à necessidade de atendimento aos cronogramas e ao cumprimento dos projetos, conforme foram concebidos.

Ademais, os projetos vêm sendo desenvolvidos concomitantemente à implantação; eventuais necessidades de adequação, se houver, poderão ser atendidas gerando mínimo impacto às atividades.

Até o presente momento, as adequações e/ou modificações incorridas nos projetos de Engenharia foram consideradas e incorporadas ao planejamento da implantação.

As listas dos projetos revisados e aprovados para atendimento à Recomendação 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23 constam na pasta “Anexo III – Engenharia” (anexos 3.1 e 3.2) do presente relatório.

Figura 104: Anexo III – Engenharia



10.4 Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes de Engenharia

10.4.1 Barragem do Germano

A tabela 41 apresenta a composição dos desvios (positivos ou negativos) de Engenharia da Barragem do Germano que constam na Tabela 30: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados no Período – Programa Descaracterização, Item 7.3 do presente relatório.

Tabela 41: Composição dos Desvios / Ações dos Pacotes de Engenharia da Barragem

BARRAGEM - PRINCIPAIS DESVIOS / AÇÕES DA ENGENHARIA					
PACOTE	PEÇO DESVIO TC	TÉRMINO TC	TENDÊNCIA	ANÁLISE DOS DESVIOS	AÇÕES
GERAL, DESIGN REVIEW DA DESCARACTERIZAÇÃO E OUTROS	0,720%	27/10/2028	27/10/2028 Meta Julho/26	. O avanço geral está adiantado em relação ao planejado em função dos trabalhos dos ATOs e "As Built" dos projetos seguirem o avanços das obras (Regrade com avanço superior ao previsto na Linha de Base).	. NA
Total Engenharia Barragem >>>>	0,720%				

Nota: As obras de descaracterização da Cava foram concluídas em junho de 2023.

10.5 Atividades Principais de Engenharia Realizadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

BARRAGEM DO GERMANO	CAVA DO GERMANO
- Acompanhamento AECOM e ITRB; <i>As-Built</i> da descaracterização da Barragem – BVP; - Acompanhamento das obras – Plano de Chuvas 2024-2025; - Acompanhamento Técnico de Obras (ATO): ➤ Regrade; - Acompanhamento do monitoramento pós-obras de descaracterização; ➤ Dique Sela Tulipa; ➤ Dique Selinha; ➤ Barragem Eixo 1.	- Acompanhamento do monitoramento ativo. - As-built da descaracterização da Cava do Germano.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



10.6 Atividades Principais de Engenharia Previstas p/ o Próximo Trimestre
(23/06/25 a 20/09/25)

BARRAGEM DO GERMANO	CAVA DO GERMANO
• Acompanhamento AECOM e ITRB; • <i>As-Built</i> da descaracterização da Barragem – BVP; • Acompanhamento Técnico de Obras (ATO) do <i>Regrade</i>; • Acompanhamento do monitoramento pós-obras de descaracterização; ➤ Dique Sela Tulipa; ➤ Dique Selinha; ➤ Barragem Eixo 1.	• Acompanhamento do monitoramento ativo.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

11.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao Item 1.3, subitem XII do Termo de Referência da FEAM.

11.2 Introdução

Para a Samarco: A Vida é o Nosso Maior Patrimônio. Nada vale mais que a vida. Ela está acima de todos os objetivos, acima de qualquer lucro e bens materiais, e deve ser preservada em nossas atividades diárias, através de nossas atitudes.

Todas as ações da empresa são guiadas pelo respeito à vida, dentro e fora do ambiente das operações. Este compromisso vai além da responsabilidade individual, e se estende a todos que estão à nossa volta, sempre com o foco no futuro e nas próximas gerações.

11.3 Política de SST – Samarco

Garantir a adequada administração dos riscos que afetam a execução da estratégia da empresa, bem como assegurar o ambiente adequado à operação da Samarco, contribuindo com a definição de novas diretrizes, a previsibilidade do ambiente, a garantia da conformidade e a busca contínua de ambiente de trabalho saudável e seguro, e da redução dos impactos socioambientais, por meio de controles adequados e eficazes.

11.4 Os Pilares da Samarco

11.4.1 Nossos Valores

Respeito às Pessoas – *Consideramos a vida humana um valor inegociável e tratamos todas as pessoas de forma igualitária, não aceitando discriminação de qualquer natureza e considerando oportuna a livre manifestação de ideias e opiniões.*

Integridade – *Atuamos com seriedade no cumprimento às leis e respeito aos princípios morais, primando pela dignidade e ética nas relações. Adotamos uma postura honesta e transparente com as partes envolvidas em nossos negócios.*

Mobilização para Resultados – *Estamos alinhados e comprometidos com as diretrizes, metas e objetivos da empresa e com seus compromissos com a sociedade, atuando de forma colaborativa e sistêmica, com equipes de alta performance, em busca dos melhores resultados globais para os negócios.*

Segurança – *Pautamos nossa conduta e nossas atitudes pela segurança a partir do compromisso com a gestão ampla e eficiente de riscos. O conceito de segurança permeia todos os aspectos dos negócios: financeiro, jurídico, operacional, do trabalho e ambiental.*

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11.4.2 Regras de Respeito à Vida

A figura 105 ilustra as regras de segurança obrigatórias da Samarco.

Figura 105: Regras de Respeito à Vida no Crachá Funcional

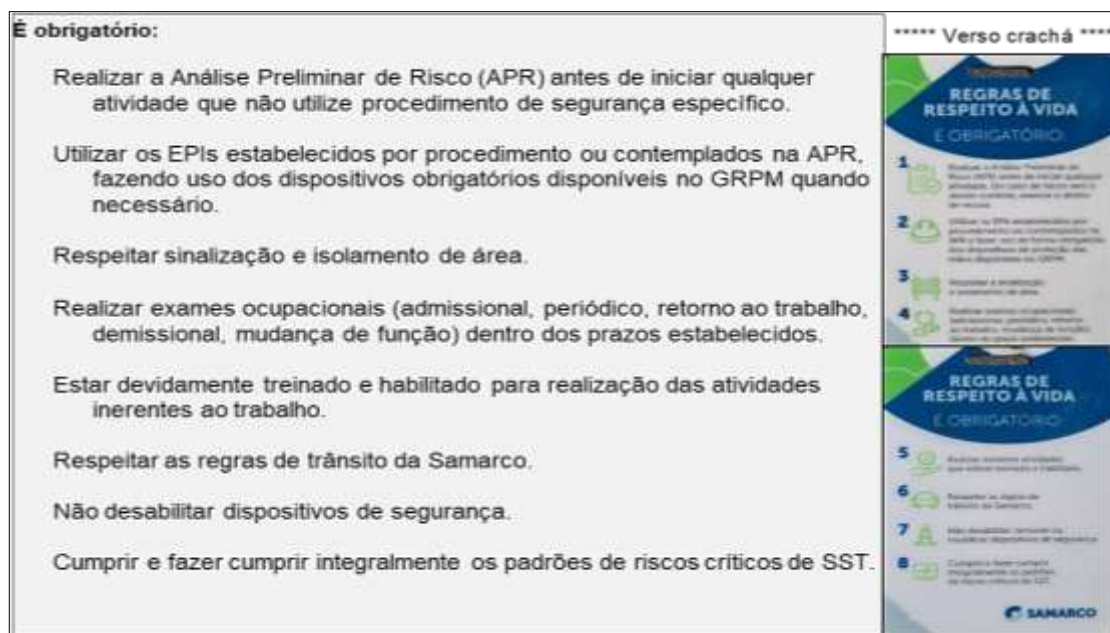

Com base nestas regras, todos os esforços para o cumprimento da política e das diretrizes de segurança nos projetos não se esgotarão, tanto para os funcionários quanto para os prestadores de serviços, independentemente da complexidade da estrutura ou do tipo de serviço a ser realizado.

11.4.3 Filosofia de Atuação

Na Samarco, os valores de Segurança e Saúde Ocupacional são suportados por três pilares – “Liderança, Comportamento e Sistema” – que englobam todas as ações que visam a promover ambiente de trabalho seguro e saudável, desenvolvendo consciência de prevenção a riscos em todas as pessoas envolvidas.

A figura 106 apresenta o fluxograma da filosofia de atuação de SST na Samarco.

Figura 106: Filosofia de Atuação de SST na Samarco



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Principais aspectos constantes nos três Pilares:

Liderança

- Definição de matriz de responsabilidades que determina, para cada cargo, as respectivas atribuições para com o Sistema de Saúde e Segurança;
- Definição das metas proativas e reativas propostas para as atividades, com reuniões de acompanhamento e definição de ações corretivas;
- Levantamento e disponibilização de recursos para a efetiva implantação do Sistema de Saúde e Segurança;
- Manutenção do ambiente de trabalho limpo e organizado;
- Atendimento a todos os requisitos legais.

Pessoas

- Grade de treinamentos que capacitem e instruem todos os empregados quanto aos riscos envolvidos e as medidas de controle apropriadas;
- Incentivo ao relato de incidentes;
- Gestão de desvios e gestão de consequências.

Sistema

- Avaliação dos impactos em processos, *layout*, equipamentos, entre outros, estabelecendo ações preventivas e corretivas para a mitigação dos riscos identificados, desde a fase de definição do projeto, elaboração dos desenhos até a construção, comissionamento e operação;
- Elaboração de manual de procedimentos de Saúde e Segurança, com instruções claras e concisas para orientar os empregados sobre o modo seguro e saudável de executar cada atividade;
- Definição de grupo de fiscalização que monitore e incentive a implementação efetiva do Sistema de Saúde e Segurança;
- Metodologia de investigação de acidentes e incidentes estruturada para detectar causas-raízes, disseminar ações preventivas e corretivas, bem como evitar a recorrência destes eventos;
- Estabelecimento de matriz de responsabilidades para aplicação das ferramentas de gestão de SST, visando ao efetivo envolvimento das lideranças;
- Definição de Sistema de Emergência que vise a minimizar os impactos negativos em caso de ocorrência de incidentes e eventos indesejáveis.


A figura 107 apresenta o resumo das diretrizes de segurança da Samarco, incluindo os resultados esperados.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 107: Resumo das Diretrizes de Segurança

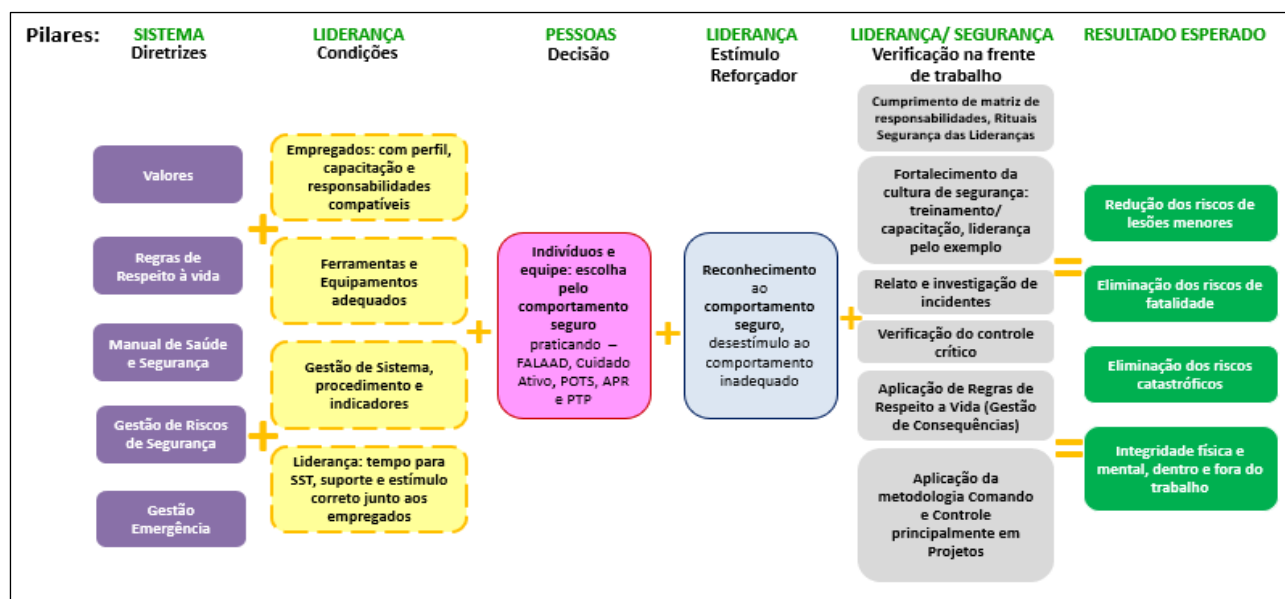

Resultados Esperados:

- Preservar a vida e a saúde de todos os empregados que trabalham no projeto, e dos membros das comunidades envolvidas;
- Garantir a continuidade das atividades em desenvolvimento, evitando interrupções provocadas por acidentes ou incidentes de qualquer natureza em qualquer etapa do projeto – fase de estudos, construção, comissionamento e *start-up*;
- Minimizar as consequências de quaisquer acidentes que venham a ocorrer, através da provisão adequada de atendimento de emergência;
- Prevenir danos materiais às propriedades da Samarco, das empresas prestadoras de serviços e das comunidades envolvidas;
- Evitar aumento do nível de risco nas operações após a implantação do projeto.

11.5 Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho

O aprendizado acumulado em mais de 40 anos de operação nas plantas existentes e a experiência obtida com a implantação dos projetos da Terceira e da Quarta Pelotização, e das obras emergenciais de contenção das estruturas remanescentes de barragens permitem que os projetos de descaracterização da Cava e Barragem do Germano sejam implantados sob a vigilância de moderno e efetivo sistema de controle de saúde e de segurança ocupacional, de forma a eliminar ou minimizar os riscos.

O sistema para gerenciamento dos aspectos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) é consistente com a política, os valores e os objetivos da Samarco, e está baseado nos requisitos da OHSAS 18000 e em padrões de SST da BHP e da VALE.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Este sistema de gestão é aplicado a todas as atividades desenvolvidas na fase de execução dos projetos, estabelecendo diretrizes claras para planejamento, execução, monitoramento e ações corretivas de SST exigidas em todas as etapas de construção.

A figura 108 apresenta o fluxo do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança na Samarco.

Figura 108: Sistema de Gestão de SST da Samarco

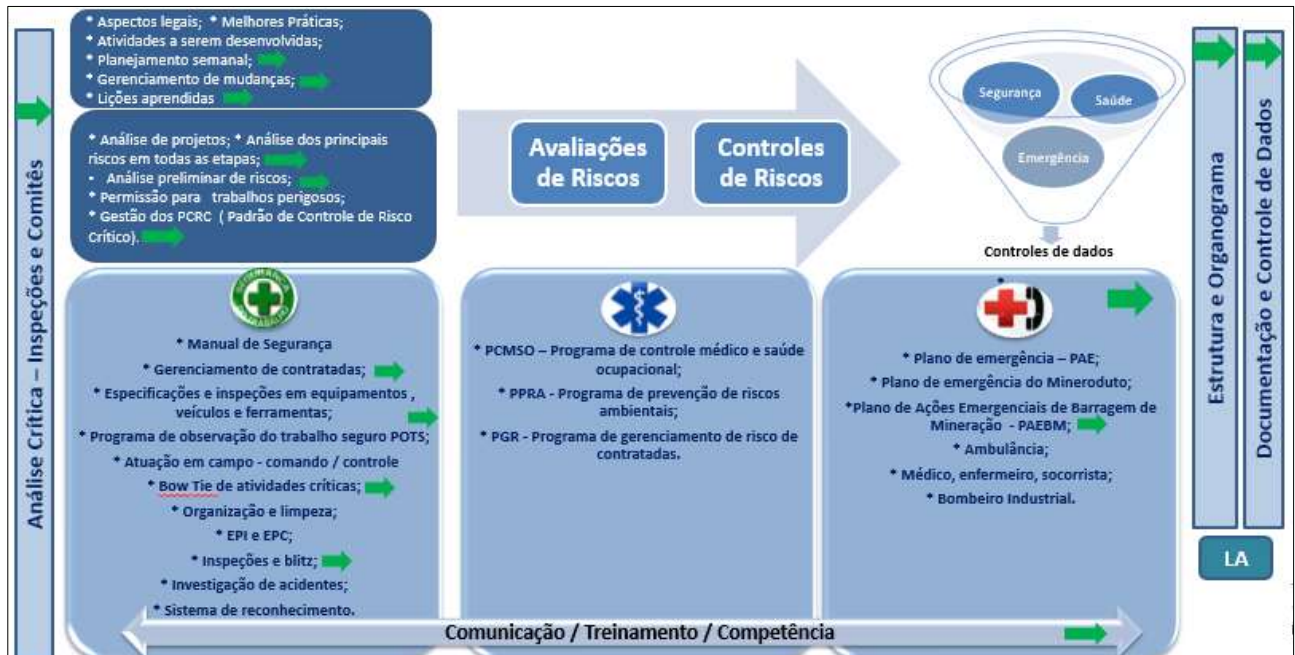

11.5.1 Objetivos do Plano de SST

Identificação dos riscos e adoção de medidas de controle das atividades na fase de execução dos projetos de descaracterização da Cava e Barragem do Germano. O Plano está contemplado no Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22, na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

Os seguintes documentos de referência são utilizados nesta fase:

- Disposições da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e do Emprego – MTE de junho de 1978;
- Padrões Samarco de Saúde e Segurança para Engenharia Básica e Detalhada;
- Portarias da Agência Nacional de Saúde – ANS;
- Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Samarco;
- Portarias do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;
- Lições aprendidas de acidentes e incidentes da Samarco;
- Lições aprendidas dos projetos da Terceira e da Quarta Pelotização;
- GLDs – BHP;
- Padrões para Controle de Riscos Fatais da BHP;
- RAC – Requisitos de Atividades Críticas da VALE;
- PCRC – Padrões de Controle de Riscos Críticos – Samarco.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11.6 Sistema de Gerenciamento de Riscos

A identificação e a avaliação de perigos e riscos são a base deste sistema, a partir da qual as medidas de controle são definidas e implementadas. Fundamentam-se nas normas e procedimentos operacionais, de manutenção e de construção existentes. Estas normas e procedimentos têm sido continuamente ajustados para se adaptar às mudanças na legislação que também vem sendo aperfeiçoada de forma contínua.

A experiência adquirida nos projetos da Terceira e da Quarta Pelotização, e nas obras emergenciais de contenção de estruturas remanescentes de barragem proporcionou melhor conhecimento dos riscos e das medidas eficazes de controle.

Durante o projeto da Quarta Pelotização, projetos estruturantes, obras emergenciais, nova filtragem e outros projetos da Samarco, todos os riscos críticos foram identificados e as medidas de controle foram estabelecidas com a participação de toda a Liderança.

Visando a incorporar melhores práticas e lições aprendidas dos projetos anteriores, uma revisão de riscos e controles foi realizada para os projetos de descaracterização da Cava e Barragem do Germano.

Na avaliação dos riscos foram levados em consideração todos os aspectos legais, gerenciamento de mudanças, lições aprendidas e melhores práticas obtidas através de *benchmarking* com os acionistas. São utilizadas práticas e metodologias como Análise Preliminar de Perigos (APP), Análise de Projetos, Análise Preliminar de Riscos (APR) e Permissão para Trabalhos Perigosos (PTP).

Para aperfeiçoar os resultados de SST, após o encerramento do projeto da Quarta Pelotização foram realizados seminários de Lições Aprendidas com o objetivo de identificar as oportunidades de melhoria adquiridas com a experiência de implantação deste projeto.

11.6.1 Identificação e Avaliação dos Riscos

11.6.1.1 Processo

A Samarco possui considerável experiência fundamentada nas operações das usinas de concentração e pelotização. Estas operações levaram à consolidação de sistemas de gestão de saúde e segurança, em conjunto com os prestadores de serviços. Embora os riscos operacionais sejam significativos, todos eles são bem compreendidos e controlados adequadamente.

O desempenho de segurança das operações tem se mostrado favorável, com as taxas de frequência para acidentes registrados (TRIFR) nos últimos anos abaixo da média da Indústria de Mineração.

11.6.1.2 *Design* para Saúde e Segurança

Avaliações de *design* foram realizadas nas etapas de projeto conceitual, básico e detalhado, envolvendo profissionais de SST, das projetistas e das áreas de operação e de manutenção, através da comparação com padrões de Engenharia para identificação e controle de riscos para construção, operações e manutenção.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



A equipe de SST participou da elaboração de especificações técnicas para compra de máquinas e equipamentos, de forma a assegurar o atendimento a normas e padrões de segurança nos processos de aquisição.

11.6.1.3 Fase de Execução

Para os projetos de descaracterização da Cava e Barragem do Germano foi realizada a Análise Preliminar de Perigos (APP), considerando as principais atividades realizadas na fase de execução. Esta metodologia foi selecionada por apresentar visão geral de problemas de segurança do sistema em estudo, no qual os perigos potenciais das atividades são analisados de forma ampla e abrangente, avaliando causas e consequências, e recomendando medidas requeridas para o controle, conforme detalhado no Anexo 6.2 – APP – Análise Preliminar Perigos_REV8 06_01_22, na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

Todas as atividades em campo são realizadas em área industrial com acesso controlado de pessoas, veículos e equipamentos, onde o sistema de gestão de SST foi implantado.

Para os riscos identificados, foi realizada a *avaliação do valor da probabilidade de ocorrência X categoria da consequência (gravidade do dano)*, considerando as ocorrências relatadas em diversas obras e as estatísticas de fatalidades obtidas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, as *medidas de controle existentes* (práticas de prevenção adotadas no Sistema Integrado de Gestão da Samarco que foram aplicadas às atividades da fase de estudos do projeto), e as *ações adicionais para o projeto da Filtragem Fase I* (medidas preventivas específicas que foram incrementadas na etapa de implementação do projeto).

Todos os padrões de controle de riscos críticos (que podem ocasionar uma ou mais fatalidades) foram considerados na análise quanto à aplicabilidade, ou não, de cada padrão ao projeto, e a previsão de aplicação das medidas de controle críticas.

Os seguintes PCRCs foram considerados:

- PCRC 01 – Veículos Rodoviários;
- PCRC 02 – Equipamentos Móveis;
- PCRC 03 – Explosivos e Blaster (Não se aplica à descaracterização);
- PCRC 04 – Controle de Solo;
- PCRC 05 – Materiais Perigosos;
- PCRC 06 – Ferramentas e Instrumentos;
- PCRC 07 – Proteção de Partes Móveis;
- PCRC 08 – Isolamento e Bloqueio;
- PCRC 09 – Trabalho em Altura;
- PCRC 10 – Içamento;
- PCRC 11 – Queda de Objetos;
- PCRC 12 – Colapso de Estruturas;
- PCRC 13 – Espaço Confinado;
- PCRC 14 – Projeção de Materiais;
- PCRC 15 – Afogamento;
- PCRC 16 – Explosão de Equipamentos e Componentes Mecânicos;
- PCRC 17 – Explosão de Equipamentos e Componentes Elétricos;
- PCRC 18 – Contato com Redes Elétricas.



RADAR: funciona pela emissão e captação de ondas eletromagnéticas, onde variações milimétricas na superfície monitorada são apresentadas como deslocamento.



INA / PIEZÔMETRO: mede o nível e a pressão de água na sala em diferentes profundidades.



ESTAÇÃO TOTAL ROBÓTICA: equipamento de alta precisão utilizado para realização do monitoramento de deslocamentos horizontal e vertical do terreno.



ESTAÇÃO METEOROLÓGICA: mede índices pluviométricos / precipitação, temperatura do ar, velocidade e direção do vento.



ACELERÔMETRO: mede a vibração na barragem por meio da medição de abalos sísmicos naturais ou induzidos (ex.: desmontes por explosivos ou tráfego de equipamentos).



MEDIDOR DE VAZÃO: mede o volume de líquido que passa por ele. Utilizado para medir a quantidade de água que sai de um dreno.



INCLINÔMETRO: utilizado para determinar deformações e deslocamentos horizontais na interior da estrutura.



VIDEOMONITORAMENTO: com esse monitoramento, acompanha-se o andamento das obras, eventos de chuvas, anomalias nas estruturas e condições de segurança.







PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11.6.2 Classificação dos Riscos

Riscos Extremos (Acima de 1000 pontos)

- Acidentes envolvendo transporte de pessoal / veículos rodoviários;
- Instabilidade de taludes (soterramentos).

Riscos Severos (de 300 a 999 pontos)

- Acidentes envolvendo equipamentos móveis / caminhões;
- Acidentes em trabalho em altura / queda de objetos;
- Acidentes em atividades envolvendo içamento de carga;
- Acidentes decorrentes da Interação Homem x Máquina (IHM);
- Acidentes decorrentes de interferências com ferrovia;
- Acidentes com eletricidade.

Riscos altos (de 100 a 299)

- Acidentes causados por partes móveis de equipamentos / ferramentas;
- Acidentes nas etapas de comissionamento e pré-teste;
- Acidentes em espaço confinado;
- Trabalho em condições climáticas adversas (descargas atmosféricas);
- Prensamento do corpo e/ou de partes do corpo.

Riscos Moderados (de 11 a 99)

- Colapso de estruturas prediais / industriais;
- Cortes / Ferimentos / Torsões / Escoriações / Queimaduras / Lesões diversas;
- Incêndio e Explosão;
- Afogamento.

Riscos Baixos (até 10)

- Lesões causadas por problemas ergonômicos;
- Riscos químicos;
- Acidentes nas atividades de *tie-in*;
- Acidentes decorrentes de contato com animais peçonhentos;
- Doenças decorrentes da exposição a ruído / particulados.

Notas: 1 – Os PCRCs também são aplicados para o transporte de empregados da Samarco e de prestadores de serviços entre local de trabalho e residência, quando utilizado transporte oferecido pelas empresas e nas viagens a serviço realizadas por empregados da Samarco.

2 – Ficou estabelecido que os veículos de visitantes e de empregados próprios ou contratados não são incluídos nesse escopo, e que os riscos gerados por sua entrada em áreas industriais devem ser gerenciados pelas diretrizes de controle de acesso à empresa, suportadas pelo processo “Gestão de Riscos à Segurança”.

11.6.3 Responsabilidades e Estrutura

11.6.3.1 Responsabilidades

As Lideranças têm papel fundamental na redução dos riscos de acidentes, através da implantação do Plano de SST e das recomendações provenientes das avaliações de

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



projetos, viabilizando recursos e ferramentas de gestão que possibilitem ambiente saudável e seguro, desenvolvendo consciência de prevenção em todos os empregados e favorecendo comportamentos seguros em todas as fases do projeto.

As empresas prestadoras de serviços têm seus respectivos Diretores como principais responsáveis pela implantação do Sistema de Saúde e Segurança e pelos resultados alcançados.

O comprometimento e o envolvimento das Lideranças são de fundamental importância à realização do desempenho de SST esperado para o projeto. A responsabilidade direta da alta administração de todas as empresas envolvidas é inegociável para a Samarco.

Toda a Liderança do projeto tem compromisso com local de trabalho seguro, participando ativamente do planejamento de todas as atividades, reforçando bons comportamentos de segurança e se recusando a aceitar desempenho insuficiente neste aspecto. Suas atribuições estão especificadas em matriz de responsabilidade, na qual constam ações como reuniões de SST, inspeções planejadas, investigação de acidentes, entre outros, conforme apresentado na tabela 42.

Tabela 42: Matriz de Responsabilidade para Lideranças

CARGO	INSPEÇÃO DE SEGURANÇA	AValiação DE DDD	PCPI	NOTIFICAÇÃO/ PARALISAÇÃO	REUNIÃO DO SESMT	BLITZ DE SEGURANÇA	APROVAÇÃO DE APR
TST EQUIPE DE SST	03 POR SEMANA	03 POR SEMANA	03 POR SEMANA	SE HOUVER	(QUINZENAL)	(QUINZENAL)	CONFORME DEMANDA
TST FORNECEDOR	03 POR SEMANA	PARTICIPAR	PARTICIPAR	SE HOUVER	(QUINZENAL)	(QUINZENAL)	CONFORME DEMANDA
ENCARREGADO/ LIDERES FORNECEDORES	02 POR SEMANA	CONDUZIR	PARTICIPAR	TRATAR	NA	PARTICIPAR	CONFORME DEMANDA

Uma matriz de responsabilidades específicas das Lideranças para a fase de execução do projeto foi elaborada conforme apresentado na tabela 43.

Tabela 43: Matriz de Responsabilidade para Gestores na Execução

CARGO	AValiação DE DDSS	AValiação COMPORTAMENTAL	INSPEÇÃO VER E AGIR	COMITE DE SST	INSPEÇÃO GERENCIAL	BLITZ DE SEGURANÇA
GESTOR SAMARCO	02 POR MÊS	02 POR MÊS	02 POR MÊS	(QUINZENAL)	(QUINZENAL)	PARTICIPAR
GESTOR FORNECEDOR	02 POR MÊS	02 POR MÊS	02 POR MÊS	(QUINZENAL)	(QUINZENAL)	PARTICIPAR
ENGENHEIROS/ FISCAIS	01 POR SEMANA	01 POR SEMANA	01 POR SEMANA	(QUINZENAL)	(QUINZENAL)	PARTICIPAR
SUPERVISORES DE SST	01 POR SEMANA	01 POR SEMANA	01 POR SEMANA	(QUINZENAL)	(QUINZENAL)	PARTICIPAR

11.6.3.2 Estrutura Organizacional

A estrutura da Samarco conta com um Gerente Cooperativo, um Engenheiro Especialista de Segurança, um profissional da equipe para análise de Projetos de Engenharia, uma equipe de Gestão de Segurança e uma equipe de Saúde, em sinergia com as Operações.

Estes profissionais são responsáveis pela identificação dos riscos, pelas definições de medidas de controle, pela avaliação dos projetos e pelo monitoramento do desempenho de SST na fase de execução do projeto.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Organograma de Gestão da Descaracterização

Figura 114: Organograma da Equipe de Gestão da Cava (Histórico)

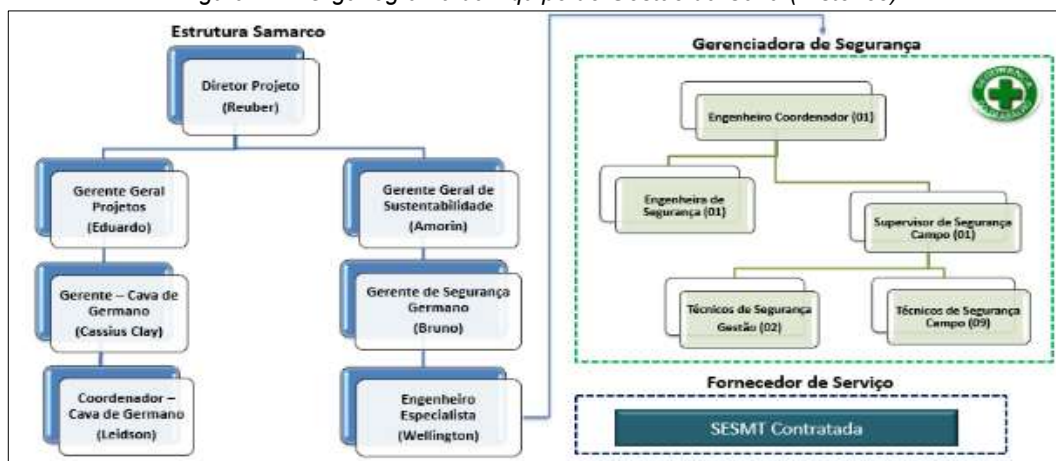


Figura 115: Organograma da Equipe de Gestão da Barragem


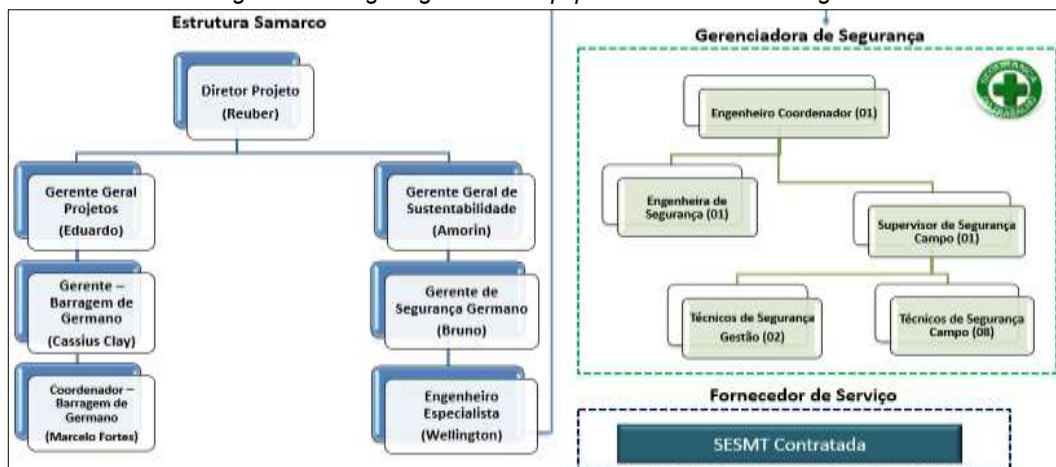


Figura 116: Organograma da Equipe de Emergência

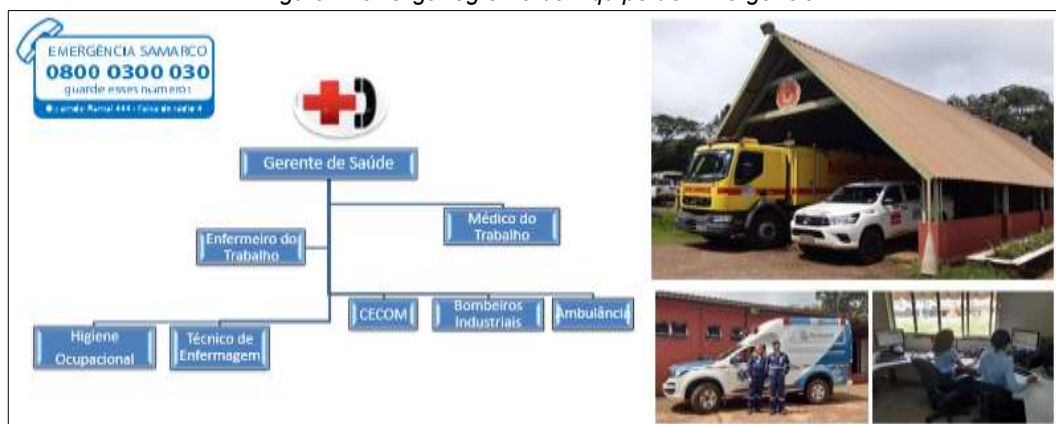

Para as atividades realizadas pela Equipe da Gerência de Mineração, a gestão de saúde e segurança é realizada pela Engenharia de Segurança do Trabalho de Germano, dentro dos padrões do Sistema de Gestão das Operações.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Um Profissional de SST é alocado junto às equipes de Engenharia do Projeto, visando a adequar as atividades às exigências e requisitos descritos nos seguintes documentos:

- Manual de Higiene e Segurança do Trabalho da Samarco;
- Disposições da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e do Emprego – MTE de junho de 1978;
- Padrões Samarco de Saúde e Segurança para Engenharia Básica e Detalhada;
- Portarias da Agência Nacional de Saúde – ANS;
- Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Samarco;
- Portarias do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;
- Lições aprendidas de acidentes e incidentes;
- Lições aprendidas do projeto Quarta Pelotização, obras emergenciais de recuperação de estruturas remanescentes e outros projetos;
- Condições inseguras registradas no banco de dados da Samarco;
- Padrões para Controle de Riscos Fatais da BHP;
- RAC – Requisitos de Atividades Críticas da VALE;
- PCRC – Padrões de Controle de Riscos Críticos da Samarco.

Empresas prestadoras de serviços possuem equipes de SST próprias para assegurar a capacitação dos seus trabalhadores e o cumprimento dos padrões estabelecidos.

De acordo com a criticidade das atividades executadas, a Samarco pode solicitar à empresa prestadora de serviços ao menos um profissional de Segurança, independentemente do efetivo. O dimensionamento das equipes de SST das prestadoras de serviços deve ter como base a Norma Regulamentadora NR4.

11.6.4 Objetivos e Metas

Para o monitoramento dos resultados obtidos em SST na fase de execução dos projetos são estabelecidos indicadores (KPIs). Mensalmente, as Lideranças e a equipe do projeto se reúnem para acompanhar os indicadores proativos e reativos de segurança e as metas estabelecidas. Ações corretivas são propostas para eventuais desvios encontrados. Outros indicadores proativos também são estabelecidos para medir a eficácia das ações do sistema de SST.

As metas devem ser consideradas durante todas as fases de projeto, desde a identificação até a fase de execução. Os indicadores de SST estão listados na tabela 44.

Tabela 44: Indicadores e Metas de SST

INDICADOR	META
Número de Fatalidades	0
Taxa de Acidentes Registrados	1,0
Cumprimento da Matriz de Responsabilidade	100%
Treinamentos (HHT / HHT Total)	2%
Avaliação de desempenho de fornecedores em gestão de saúde e segurança	85%

Nota: O indicador “Taxa de Acidentes Registrados” é corporativo, e monitorado incluindo todos os projetos correntes e os resultados da estatística de acidentes das atividades de operação da Samarco.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11.6.5 Treinamentos, Competência e Comunicação

Treinamentos

Todos os empregados envolvidos nas atividades de campo recebem treinamento introdutório abordando aspectos gerais de segurança do trabalho, higiene industrial, prevenção e combate a incêndio – incluindo Plano de Emergência, aspectos gerais de comunicação de riscos químicos e noções básicas de normas mandatórias (prevenção de quedas, etiquetagem e bloqueio, espaço confinado, trabalhos a quente, veículos e equipamentos móveis, içamento de cargas, segurança em instalações elétricas). A matriz de treinamentos está contemplada no Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22 (Capítulo 15), na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

A figura 117 apresenta registro de treinamento introdutório.

Figura 117: Treinamento Introdutório



O treinamento de segurança em campo está incluído no Programa de Treinamento Introdutório, sob a responsabilidade da supervisão direta do empregado, para avaliação de riscos das atividades específicas.

Além do treinamento introdutório, treinamentos específicos são exigidos de acordo com as atividades a ser realizadas: trabalho em altura, bloqueio, isolamento de área, içamento, entre outras.

Comprovação de habilidade específica é exigida para funções que envolvam a operação de equipamentos especiais (equipamentos móveis, equipamentos de guindar, instalações elétricas e outros).

Medidas de controle de capacitação física são adotadas para liberação da condução de caminhões, veículos de transporte coletivo e equipamentos móveis.

Reuniões de saúde e segurança com o SESMT dos prestadores de serviços são realizadas com o objetivo de treinar, capacitar, alinhar e planejar as atividades de SST do projeto.

Foi implantado programa de capacitação de Lideranças das empresas contratadas, conduzido por profissional com especialização em Psicologia do Trabalho, com foco nos seguintes tópicos: Competências das Lideranças; Liderança pela Segurança; Inteligência

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Emocional; *Feedback*; Comunicação não-violenta. A figura 118 traz exemplo do material do treinamento realizado com as Lideranças das empresas contratadas.

Figura 118: Treinamento de Lideranças de Contratadas

Lideranças de Contratadas

- Competências das lideranças;
- Liderança pela Segurança; Inteligência Emocional;
- Feedback;
- Comunicação não violenta.



Outro programa implantado é o de capacitação de equipes de gerenciadoras, também conduzido por profissional com especialização em Psicologia do Trabalho, com foco nos seguintes tópicos: Psicologia e Segurança do Trabalho – interações e possibilidades; Comportamento humano e seus ativadores; Processos de mudança de comportamento; Competências socioemocionais para a abordagem assertiva. A figura 119 traz exemplo do material do treinamento realizado com as equipes de gerenciadoras.

Figura 119: Treinamento de Equipe de Gerenciadoras



Equipe de Gerenciadoras

- Psicologia e segurança do trabalho – interações e possibilidades;
- Comportamento humano e seus ativadores;
- Processos de mudança de comportamento;
- Competências socioemocionais para a abordagem assertiva.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Todas as empresas envolvidas no projeto devem assegurar que nenhuma atividade ou operação seja desenvolvida com pessoal sem competência para a realização. A figura 120 apresenta registro de treinamento de equipes de gerenciadoras.

Figura 120: Treinamento de Capacitação de Lideranças Ápia



A matriz de treinamento documentada e cada um dos treinamentos obrigatórios estão contemplados no Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22, na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

Competência

De modo a garantir a competência dos Gerentes, Supervisores e Encarregados para o sucesso da implementação do sistema de SST, foi desenvolvido um programa para assegurar o comprometimento das Lideranças do projeto. Este programa inclui a visão geral das responsabilidades, habilidades de comunicação e sensibilização, e treinamento nos sistemas e procedimentos do projeto.

Comunicação

A Gerência de Comunicação desenvolveu ações de comunicação de SST em conjunto com a equipe de Saúde e Segurança. As ações são compostas de informativos, *banners*, campanhas, mídias e cartazes.

11.7 Plano de Ações Emergenciais de Barragem de Mineração – PAEBM

O PAEBM segue as normas e os procedimentos previstos na portaria 70389 da Agência Nacional de Mineração (ANM) de 17/05/2017. O principal objetivo é evitar ou minimizar perdas de vidas humanas decorrentes de eventual ruptura de barragem.

A figura 121 demonstra a localização e a identificação das estruturas geotécnicas no Complexo do Germano.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 121: Organograma da Equipe de Emergência



A figura 122 apresenta as placas de sinalização de ponto de encontro e de rotas de fuga.

Figura 122: Placa de Sinalização de Ponto de Encontro e de Rotas de Fuga



O treinamento do PAEBM é obrigatório para todos que acessam e/ou trabalham no Complexo do Germano. Periodicamente, a Samarco realiza reciclagem e simulados com todos os empregados e terceiros envolvidos nas obras de descaracterização da Cava e Barragem do Germano. A figura 123 demonstra a realização de um simulado no *site*.

Figura 123: Simulado do PAEBM 2025



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11.8 Ferramentas do Sistema de Gestão de Segurança

O Sistema de Gestão de Segurança da Samarco é composto de ferramentas de controle proativas e reativas, com o objetivo de salvaguardar a saúde e a segurança de todos os trabalhadores.

As ferramentas deste sistema estão contempladas no Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22 (Capítulo 22), na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório. A seguir são citados os principais recursos.

11.8.1 Checklist Fácil

Novo aplicativo *mobile*, intuitivo, com acesso facilitado e integrado às principais ferramentas de gestão de segurança da Samarco, permitindo a geração de gráficos e a análise dos resultados obtidos.

A figura 124 traz a apresentação do aplicativo.

Figura 124: Nova Tecnologia para a Realização de Inspeções



11.8.2 Análise Preliminar de Perigos – APP

Ferramenta utilizada na fase de concepção do projeto para identificar perigos, suas causas, bem como as medidas de controle existentes e as medidas de controle a implementar. A figura 125 mostra exemplo de APP realizada para o transporte de pessoal.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 125: Análise Preliminar de Perigos – APP

APP - ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS					
Samarco Mineração S.A.		Projeto de Descaracterização da Cava e Estagem do Germano		Atividade: 01	Folha: 01
Subsistema: Transporte de Pessoal		Equipamento: Veículos leves, Van e Ônibus		Rev: 8	PERE: PCN001 - Transporte Rodoviário
Data: 05/10/2021					
Perigo	Causas Possíveis	Impactos	Medidas de Controle	Ações adicionais para o Projeto	Valor do Risco
- Acidentes envolvendo veículos leves, ônibus e de transporte coletivo de pessoas (Veículos Rodoviários)	- Falha humana (imprudência, negligência ou imperícia) - Falha mecânica - Falha de inspeção preventiva - Falha de manutenção preventiva/corrente - Má estado de conservação de vias internas / externas - Falha/ falta de medidas de proteção coletiva / individual	- Acidentes - Pessoas graves - Perdas materiais - Ferimentos	- Procedimento de Manual de Operação de VET - Procedimento de manutenção preventiva / corrente - Inspeção liberando veículo, inspeção pré-operacional, inspeção periódica de veículos - O Plano Operar de caminhos deve considerar questões de segregação humana e segurança - Capacitação de motoristas - Escala de horários de entrada e saída - Controle de Tachômetro - Sistema de monitorização/liberação de motoristas - Pré-requisitos para contratação de veículos, conforme PCRC 01 - Segurança - Sistema de Operação de VET - Insatufação e conservação de vias - Controle de estado dos motoristas - Sistema de comunicação via rádio para reforço de mensagens de segurança no trânsito - Segregação de pedestres - Atualização de mapas periódica de veículos de transporte coletivo - Relato de acidentes e causas/ causas inseguras - DRECS - Diálogo Diário de Saúde e Segurança - Gerenciamento de congestionamentos - Especificações e inspeções em equipamentos, veículos e ferramentas - Observações de trânsito seguro - EDC e EDC - Rota de segurança - Overdimensionamento de vias - APP - Análise Preliminar de Riscos - Fiscalização em campo - Plano de emergência / Caves / Equipe de Resgate - Capacitação / Treinamento / Competência - Política de Monitoramento de uso abusivo de álcool e drogas - Veículos devem não deverão ser considerados como opção para transporte regular de passageiros, principalmente em atividades normais - Contratação de Motor Drive para avaliação, capacitação e treinamento de motoristas - Elaboração de rotograma por empresa especializada - Realização específica, baseada no rotograma aderente a relação de marchas e velocidade máxima por trecho - Instalação de câmeras de monitoramento - interna e externa aos caminhões - Central de comunicação com finalidade permitindo que câmeras sejam desligadas - Programa próprio de Monitoramento do uso abusivo de álcool e drogas para empresas de transportes - Cláusula de 30 para câmeras de vídeo (câmera, placa, câmbio e eixo) - Manutenção de controle dos PCRC - 01	- Aplica treinamento de direção defensiva específica para motoristas de transporte coletivo	- Severidade - (1000) - Probabilidade - (0,1) ALTO

O relatório de identificação e avaliação de riscos de Segurança e Saúde Ocupacional está detalhado no Anexo 6.2 – APP - Análise Preliminar Perigos_REV8 06_01_22, na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

11.8.3 Análise Preliminar de Riscos – APR

Ferramenta utilizada na fase de execução do projeto, elaborada previamente a cada atividade. Nesta análise são identificadas as etapas de execução, os riscos de cada etapa e as medidas de controle para neutralizar os riscos durante a execução.

Os prestadores de serviços devem implementar metodologias de análise para identificar e avaliar todos os riscos decorrentes das atividades a ser realizadas nas obras. Isso deve incluir todos os fatores que possam afetar de forma adversa a saúde (doenças ocupacionais), a segurança (danos materiais e pessoais) e o meio ambiente (poluição do ar, do solo e da água, danos a ecossistemas e à comunidade).

Os resultados das análises por parte dos prestadores de serviços são encaminhados e discutidos com a equipe de SST da Samarco, que poderá solicitar revisão ou complementação das análises, conforme seu melhor julgamento.

Com base nas análises de riscos aprovadas, os prestadores de serviços devem implementar ações de prevenção e controle para minimizar riscos a pessoas, instalações, meio ambiente e comunidade.

A capacitação para elaboração de APR é parte integrante do treinamento introdutório, e as orientações para aplicação da metodologia estão contempladas no Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22 (Item 22.1), na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



A não-realização de APR é motivo para intervenção na atividade. Realizar atividade sem APR ou com APR não-aprovada pela equipe de SST da Samarco é motivo para as ações administrativas previstas em contrato com os prestadores de serviços.

Para atividades com características especiais, nas quais a análise evidencie que as ações contidas nos PCRCs da Samarco não são suficientes para o controle efetivo dos riscos, será utilizada a metodologia *Bow Tie* para identificação de causas e medidas de controle específicas, permitindo melhor gestão deste tipo de atividade.

Para os projetos de Descaracterização do Germano foram realizadas análises de risco pela Metodologia *Bow Tie* para as seguintes atividades:

Projeto da Cava

- Plugagem da galeria;
- Construção dos túneis-bala;
- Construção das contenções atirantadas.

Projeto da Barragem

- Reconformação da barragem (*regrade*);
- Lançamento de galerias do transportador de correia sobre a rodovia MG-129.

Dependendo da atividade, a APR aprovada pode ter validade de até 90 dias corridos, desde que sejam mantidas as características da atividade como observadas no momento da elaboração da análise, conforme o modelo apresentado na figura 126.

Figura 126: Análise Preliminar de Riscos – APR (formulário válido até 90 dias corridos)

O formulário de Análise Preliminar de Riscos (APR) é composto por duas partes principais: uma capa/identificação e uma planilha de dados.

Capa/Identificação:

- Título:** ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
- Objetivo:** Identificar os riscos associados à atividade e avaliar a necessidade de medidas de controle.
- Informações de identificação:** Nome da atividade, local, data, responsável, etc.
- Classificação de risco:** Tabela com cores (verde, amarelo, laranja, vermelho) e níveis de risco.

Planilha de dados:

Item	Descrição da atividade	Risco	Medidas de controle	Validade
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Para as atividades de curta duração, é utilizado o formulário-padrão com validade semanal, conforme demonstrado nas figuras 127 e 128.

Figura 127: Análise Preliminar de Riscos – APR (formulário semanal, frente)

[illegible]

Figura 128: Análise Preliminar de Riscos – APR (formulário semanal, verso)

Figure 126 is a detailed form titled "ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO SIERPILITA" (Preliminary Risk Analysis Sierpilita). The form is divided into several sections:

- Header:** Includes the SAMARCO logo and the title "ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO SIERPILITA".
- Formalante (Formulator):** A section for identifying the person who created the form, with fields for Name, Address, and City.
- Formulário (Form):** A large section for data entry, divided into two main columns. The left column contains a grid for recording data, and the right column contains a grid for recording data. Below these grids are several checkboxes and text boxes for additional information.
- Formulário de Análise (Analysis Form):** A section at the bottom of the form, containing a grid for recording data and a section for additional information.

The form is designed to be filled out by a professional, likely a veterinarian or a public health official, to assess the risk of Sierpilita in a specific area.

11.8.4 Permissão Para Trabalho Perigoso – PTP

Documento de segurança aplicado a atividades consideradas perigosas ou críticas. Nestes casos, a emissão de Permissões para Trabalhos Perigosos (PTPs) é obrigatória.

Para a elaboração da PTP, os prestadores de serviços devem seguir as recomendações contidas no Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22 (Item 22.2), na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

As seguintes atividades são consideradas perigosas ou críticas:

- Trabalhos a quente;
- Trabalhos em altura superior a 2 metros;
- Trabalhos de escavação e perfuração;
- Trabalhos em espaços confinados;
- Trabalhos com eletricidade;
- Trabalhos com sistemas pressurizados;
- Içamento de cargas;
- Trabalhos sobrepostos;
- Trabalhos com fontes radioativas;

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Corte de peças metálicas com disco de corte e ferramenta elétrica;
- Trabalhos na proximidade de ferrovias;
- Trabalhos sobre telhados;
- Trabalhos com produtos químicos perigosos;
- Trabalhos com explosivos.

A figura 129 apresenta o formulário-padrão para elaboração da PTP.

Figura 129: Permissão para Trabalho Perigoso – PTP (formulário padrão)

PERMISSÃO PARA TRABALHOS PERIGOSOS - PTP		Referente à APR N.
Esta PTP é válida somente quando assinada pelo Supervisor e liberada pelo profissional da Gerenciadora de Saúde e Segurança, ou profissional de Segurança do Fornecedor de Serviços. Deve ser emitida antes do trabalho especificado ser iniciado. Deve ser FIXADA próxima ao local de trabalho e ser encerrada após conclusão do mesmo. Para as atividades de elétrica, escavações e içamentos com cargas com peso maior ou igual a 5 toneladas, a PTP deverá ser analisada e aprovada pela Gerenciadora de Saúde e Segurança e Gerenciadora de Obras. Nas atividades que envolvem áreas operacionais da Samarco, um responsável da Samarco deverá analisar e também assinar a liberação para a atividade na PTP.		
ÁREA:	INÍCIO DATA: HORA:	TÉRMINO DATA: HORA:
TRABALHO A SER REALIZADO: ☐ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ☐ TRABALHO EM ALTURA ☐ TRABALHO EM TELHADO ☐ FONTES RADIOATIVAS ☐ SISTEMAS PRESSURIZADOS ☐ ESCAVAÇÃO / PERFURAÇÃO ☐ SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO ☐ CORTE COM LIXADEIRA ☐ TRABALHO SOBREPOSTO ☐ IÇAMENTO DE CARGAS ☐ ESPAÇO CONFINADO ☐ SOLDA ELÉTRICA		
Qualquer resposta NÃO deve ser justificada e seguida de medidas de prevenção de acidentes suplementares no campo OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO NECESSÁRIAS		
PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO SIM NÃO ☐ ☐ Luva isoladora de eletricidade aprovada; ☐ ☐ Energia desligada, tagueada e bloqueada; ☐ ☐ Verificado circuito de voltagem; ☐ ☐ Inspeccionados cabo de extensão e ferramentas elétricas ☐ ☐ O pessoal está devidamente qualificado, habilitado e treinado para execução das atividades? ☐ ☐ Espaço livre de linhas/condutores elétricos; ☐ ☐ Os painéis de distribuição estão trancados e chaves mantidas com pessoal autorizado? ☐ ☐ Tapete isolante; ☐ ☐ As fontes de energia estão isoladas? ☐ ☐ O uso de escada metálica está proibido? ☐ ☐ As ferramentas manuais estão com os devidos isolamentos? ☐ ☐ Sacador de fusível; ☐ ☐ Cabo ou polo de segurança desconectado; ☐ ☐ Interruptor de falha de circuito de terra; ☐ ☐ Existe APR para a atividade? ☐ ☐ Aterramento elétrico.		
TRABALHO SOBREPOSTO SIM NÃO ☐ ☐ Todas as alternativas para evitar o trabalho sobreposto foram avaliadas ☐ ☐ Está previsto um sistema de sinalização e isolamento para a realização da atividade ☐ ☐ A instalação de anteparos contra queda de materiais no piso inferior foi considerada ☐ ☐ Ferramentas portáteis e manuais são amarradas		
TRABALHOS EM ALTURA SUPERIOR À 02 METROS SIM NÃO ☐ ☐ Equipamentos de proteção foram inspecionados e estão em perfeito estado de conservação? ☐ ☐ Foi realizada a reunião para análise dos riscos antes do início dos trabalhos? ☐ ☐ Foi realizado o DDS antes da tarefa? ☐ ☐ Os envolvidos conhecem e foram treinados no procedimento de prevenção de quedas? ☐ ☐ Os EPI's necessários estão disponíveis? ☐ ☐ Escadas inspecionadas antes de usar; ☐ ☐ Todos os envolvidos estão em perfeitas condições físicas para trabalhar em altura? ☐ ☐ As plataformas de trabalho são mantidas limpas, secas e sem obstrução? ☐ ☐ Andaimas e plataformas estão afastados da rede elétrica? ☐ ☐ Escadas fixadas; ☐ ☐ Andaimas/plataformas inspecionados, em boas condições e bem construídos? ☐ ☐ Área de trabalho isolada e sinalizada; ☐ ☐ Ferramentas e outros equipamentos guardados de modo seguro? ☐ ☐ Cinto de segurança tipo paraquedista; ☐ ☐ Corda/cabo de segurança e trava-queda; ☐ ☐ Rede/malha de proteção ☐ ☐ Talabarte duplo com amortecimento		
TRABALHO SOBRE TELHADOS SIM NÃO ☐ ☐ Previsto o uso de cinto-paraquedista e trava-quedas fixados em cabo-guia de aço ☐ ☐ O cabo-guia será fixado em estrutura definitiva da edificação ☐ ☐ Previsto o isolamento e sinalização do piso inferior ☐ ☐ A probabilidade de emissão de gases em processos industriais está controlada ☐ ☐ As condições climáticas (ausência de chuvas e ventos fortes) estão adequadas para a realização da atividade		
TRABALHOS COM FONTES RADIOATIVAS SIM NÃO ☐ ☐ Realizado cálculo para determinação de área restrita ☐ ☐ Área de trabalho isolada e sinalizada; ☐ ☐ Distância da área restrita atende requisito da CNEN; ☐ ☐ Monitor de radiação está no local; ☐ ☐ Empregados executantes do trabalho estão portando filmes dosimétricos; ☐ ☐ Supervisor de Radioproteção ou o RIA está presente no local; ☐ ☐ Equipamentos para resgate de fonte estão no local; ☐ ☐ Foi estabelecido um plano para realização do teste radiográfico e este foi aprovado		
TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS SIM NÃO ☐ ☐ Medição de gases: CO: -----, O2: -----, Explosividade: ----- ☐ ☐ Ferramentas elétricas / iluminação - 12/24 volts - se identificada atmosfera explosiva ☐ ☐ Realizado cálculo para determinação de área restrita ☐ ☐ Equipamentos de emergência: respiradores autônomos, extintores e equipamento para resgate. ☐ ☐ Exaustores e ventiladores para adequação da atmosfera do espaço confinado ☐ ☐ Leu APR/procedimento aplicável? ☐ ☐ Discutido método e risco no local? ☐ ☐ Disponibilidade de equipamento de medição? ☐ ☐ Equipamento drenado/lavado/purgado? ☐ ☐ Tubulações desconectadas? ☐ ☐ Pessoa de prontidão durante trabalho para atendimento de emergência ☐ ☐ Equipamento raquetado? ☐ ☐ Providenciado EPI's? ☐ ☐ Providenciado proteção térmica? ☐ ☐ Providenciado iluminação artificial? ☐ ☐ Providenciado iluminação a prova de explosão? ☐ ☐ Providenciado isolamento do local? ☐ ☐ Providenciado ferramenta anti-faísca? ☐ ☐ Providenciado corda salva-vidas e cinto de segurança? ☐ ☐ Sistema de TAG/ Bloqueio para sistemas elétrico, mecânico, pneumático, hidráulico e outros. ☐ ☐ Medições de pressão arterial nos empregados que irão trabalhar em espaço confinado		
CORTE DE PEÇAS METÁLICAS COM LIXADEIRA SIM NÃO ☐ ☐ Todas alternativas para a realização da atividade foram analisadas ☐ ☐ Somente o empregado que realiza a tarefa está na área de risco e a área será isolada ☐ ☐ O disco de corte/desbaste tem rotação (rpm) compatível com a rotação da lixadeira ☐ ☐ O disco utilizado para a atividade é novo ☐ ☐ Proteções mecânicas e elétricas da lixadeira estão adequadas ☐ ☐ Esta previsto o ângulo de corte em 90°		

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- *Feedback* imediato para os empregados observados;
- Reconhecimento e motivação através da entrega de brindes;
- Tratamento estatístico de itens conformes e não-conformes;
- Identificação de atividades e condições inseguras;
- Verificação da eficácia de treinamentos;
- Avaliação de aderência a procedimentos.

As avaliações das não-conformidades observadas e os aprendizados resultantes das análises de incidentes e acidentes são utilizados para alimentar um sistema de comunicação que utiliza alertas periódicos para divulgar riscos e medidas de controle.

Estas divulgações também são consideradas na revisão do Programa de Treinamentos, realizada por profissional com especialização em Psicologia do Trabalho que avalia e busca otimizar as iniciativas de treinamentos e de observação do trabalho seguro.

Além do POTS, a Samarco promove ações incentivando o comportamento seguro e premiando individualmente, ou por equipes, aqueles que se destacam no cumprimento das diretrizes de saúde e segurança.

A Samarco permite que cada empresa prestadora de serviços estabeleça programa de reconhecimento próprio, com o envolvimento da respectiva Diretoria nas premiações.

Nos programas próprios, os prestadores de serviços devem incluir itens de desempenho de saúde e segurança obrigatoriamente aprovados pela Samarco para que sejam adotados. As figuras 131 e 132 apresentam registros de realização do POTS e de eventos de reconhecimento no período.

Figura 131: Registros de Realização do POTS



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025


Figura 132: Registro de Evento de Reconhecimento



11.8.7 Fóruns de Discussões de Saúde e Segurança

Realizados com o envolvimento das Lideranças (diretores, gerentes gerais, gerentes de área, coordenadores, equipes de segurança, equipes dos prestadores de serviços) e todos os empregados das obras. A figura 133 apresenta o fluxo de trabalho com a periodicidade de realização de cada tipo de fórum de discussão.

Figura 133: Fluxo de Trabalho dos Fóruns de Discussões de Saúde e Segurança

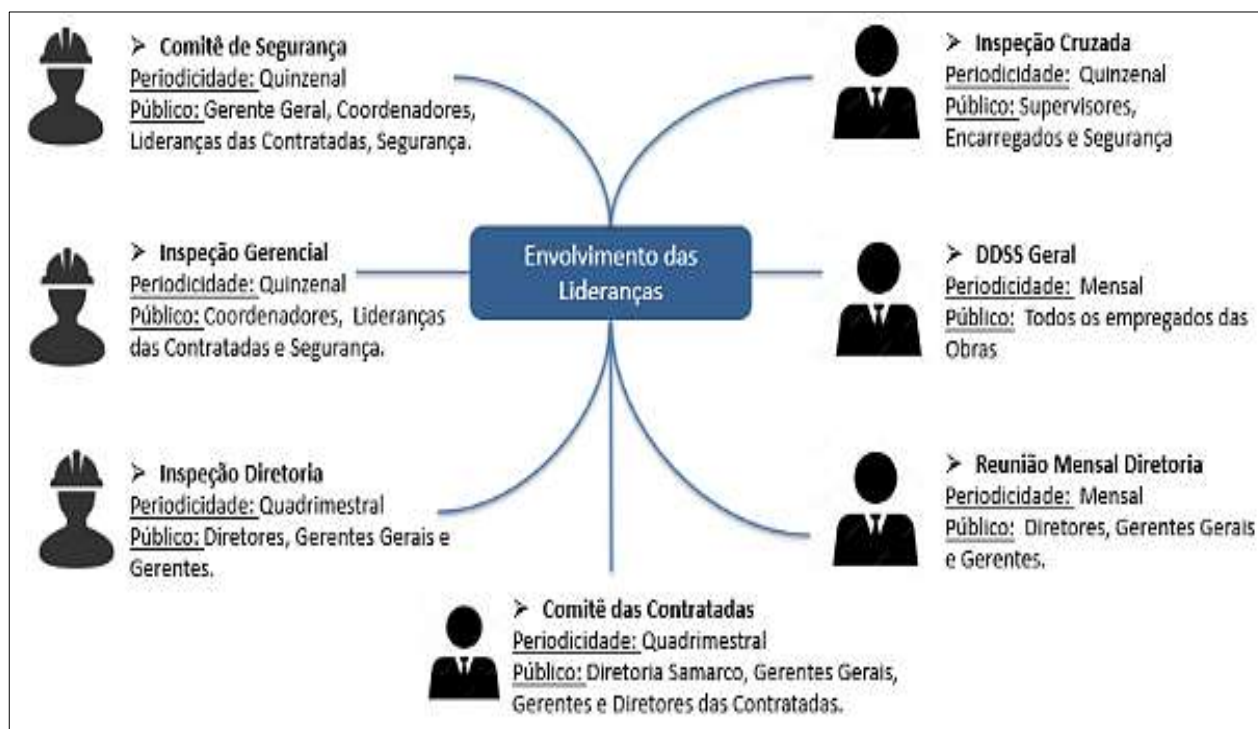

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

As figuras 134 a 137 apresentam alguns fóruns realizados durante o período.

Figura 134: Comitê de Segurança



Figura 135: Inspeção Gerencial



Figura 136: DDSS



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 137: Campanha Maio Amarelo



11.8.8 Inspeções e Blitz de Segurança

A Samarco realiza constantemente inspeções e *Blitz* de segurança nas frentes de serviços, com o objetivo de verificar o cumprimento e a aderência aos PCRCs.

11.8.8.1 Instalações, Ferramentas, Equipamentos e Veículos

Todas as instalações, ferramentas, equipamentos e veículos de prestadores de serviços são inspecionados por profissional competente e capaz de garantir o atendimento às exigências de SST do projeto, antes da autorização para início dos trabalhos. Tais recursos devem ser adequados antes de ser utilizados, e inspecionados regularmente para assegurar a continuidade da adequação.

As ferramentas manuais, elétricas, pneumáticas e hidráulicas são submetidas a inspeções regulares para liberação de uso antes da execução da atividade.

Programas de inspeção e manutenção de veículos e equipamentos são obrigatórios, e seu cumprimento é monitorado rotineiramente. Atenção especial é dada à gestão do transporte coletivo dos empregados envolvidos no projeto, com definição de ações de caráter preventivo para seleção e manutenção de frotas, bem como para capacitação e orientação a condutores.

A Samarco inspeciona e aprova caminhões e todos os tipos de equipamentos fixos e móveis, bem como as instalações que ofereçam riscos – andaimes, por exemplo.

Além disso, a Samarco controla a autorização de todos os motoristas e operadores de todos os tipos de equipamentos fixos e móveis. Somente aqueles que comprovam experiência específica, cumprem os treinamentos específicos, e são aprovados, recebem permissão para exercer suas atividades.

Áreas que apresentem desvios recorrentes e/ou ações fora do prazo devem ter as atividades suspensas até a regularização das não-conformidades existentes, visando a

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



assegurar que instalações e equipamentos estejam organizados e seguros antes da mobilização da equipe de trabalho, e sejam mantidos nesta condição.

11.8.8.2 Acompanhamento em Campo

Inspeções e *Blitz* de segurança são realizadas periodicamente, visando a acompanhar o desempenho de Saúde e Segurança das empresas prestadoras de serviços, com foco em organização e limpeza das áreas, coordenar ações corretivas e assegurar que nenhuma não-conformidade fique sem o tratamento adequado que evidencie eficácia e prazo de cumprimento.

Para cada não-conformidade detectada é elaborado plano de ação, com acompanhamento nas reuniões dos comitês. Além disso, a Samarco monitora todas as atividades do projeto através de plano de inspeções, realizadas por equipe treinada e responsável por assegurar o cumprimento de todos os requisitos contidos no Sistema de SST.

As inspeções são realizadas em conformidade com a matriz de responsabilidades, com o objetivo de identificar boas práticas e oportunidades de melhoria no processo, escolher um risco crítico para avaliar o conhecimento dos empregados e verificar a efetividade da implantação dos controles. O atendimento a esta matriz é monitorado e utilizado na avaliação do envolvimento das Lideranças nos aspectos de SST.

Atividades em que existam condições inseguras e que representem perigo iminente à saúde e à vida das pessoas são paralisadas imediatamente, e somente serão reiniciadas após a adoção das medidas de controle requeridas. As figuras 138 a 140 apresentam registros de inspeções e *Blitz* de segurança realizadas.

Figura 138: Veículo com Equipamento de Monitoramento de Velocidade – PCRC 01



Figura 139: Veículo Com Rádio de Comunicação – PCRC 01 (SESI)



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 140: Inspeções e Blitz de Segurança em Veículos na Área da Barragem



11.8.9 Gestão de Contratadas – Reconhecimento

Semestralmente, a Samarco promove Comitê com as Diretorias de todas as contratadas. Os indicadores de segurança dos projetos são apresentados durante o evento.

Os prestadores de serviços com os melhores resultados em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente recebem, como reconhecimento, placa para o 1º lugar, e certificados para o 2º e 3º lugares.

Figura 141: Registro do Comitê em 2024 – Reconhecimento das Contratadas em Destaque (Quadrimestral)



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11.8.10 Lições Aprendidas

A Samarco mantém discussões sobre as lições aprendidas nos projetos próprios e externos como item de pauta nos Comitês. As figuras 142 a 145 exemplificam boas práticas que foram adotadas como lições aprendidas.

Figura 142: Sinalização Específica – Relação de Marchas e Velocidades Máximas por Trecho

MODELOS	VAZIO	CARREGADO
AXOR 3131	6ª	2ª
VOLVO 303	6ª	2ª
ATEGO 1719	6ª	2ª
AXOR 4144 E 3344	6ª	2ª
ACELO 1016	3ª	2ª
ATEGO 2730	4ª	3ª

Figura 143: Rotograma Elaborado por Empresa Especializada



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 144: Central de Comunicação com Familiares – Celulares Desligados nas Frentes de Serviços



Figura 145: Câmeras de Monitoramento Interno e Externo em Caminhões



11.8.10.1 Planejamento Semanal

Reuniões de coordenação com os prestadores de serviços acontecem semanalmente para discutir todas as disciplinas do projeto, com participação das equipes de SST. As figuras 146 e 147 apresentam o registro e a evidência de reunião realizada.

Figura 146: Reunião de Coordenação com Prestadores de Serviços







PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 147: Evidência de Reunião de Coordenação em Ata

ATA DE REUNIÃO		Folha: 1/10	
ATA DE REUNIÃO Reunión coordenada por: Marcelo Fortes Data: 17/06/2025 Ata elaborada por: Priscila Vianete Horário Início: 13h02min Local: Sala de Reunião do Canteiro da Barragem Horário Término: 14h14min Nº do Contrato: 4300001308			
Objetivo: Execução das obras do Regrade 3, tais como serviços de terraplenagem, escavações, execução de drenos internos, reaterros, implantação de sistema de drenagem superficial, proteções superficiais, forma, armação, concretagem, obras viárias e de transposição de drenagem.			
1. PARTICIPANTES			
Nome	Empresa / Área	Assinatura	
Marcelo Fortes	Samarco		
Anderson Barsante	Samarco		
Daniel Dias	Samarco / Consórcio Tractebel MCA		
Kenia Aparecida	Samarco / Ambipar		
Ana Claudia Avelar	Samarco / Consórcio Tractebel MCA		
Thais Hofman	Samarco / Consórcio Tractebel MCA		
Diego Rossetto	Samarco / TSX		
Priscila Vianete	Samarco / Consórcio Tractebel MCA		
Wesley Zapparoli	Samarco / WZC		
Alessandra Haru	Construtora Ápia		
Amanda Batista	Construtora Ápia		
Carlos Alberto	Construtora Ápia		
Mafran Botelho	Construtora Ápia		
Cristian Hoehne	Construtora Ápia		

11.8.11 Gerenciamento de Mudanças

As avaliações de riscos e o estabelecimento de controles são realizados de acordo com o escopo do projeto, o processo a ser adotado, o *layout* definido, os tipos de equipamentos, as vias de acesso, entre outros aspectos. Caso haja mudanças em qualquer destas definições, a comunicação formal deve ser feita à equipe de SST via Nota de Alteração de Projeto (NAP), para que a revisão nos riscos e controles seja realizada.

Para alterações de Engenharia durante a fase de desenvolvimento de projeto, a equipe de especialistas em saúde e segurança é responsável pela análise de todas as mudanças relacionadas aos desenhos ou à especificação de processos e de equipamentos.

A gestão de mudanças também é utilizada para avaliação, controle e comunicação no sistema de gestão, de modo que melhorias e iniciativas sejam registradas e utilizadas na atualização do Plano de SST.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

A figura 148 apresenta alerta de segurança referente a manutenção de acessos principais na região do *Regrade* da Barragem do Germano. Não houve necessidade de alteração de fluxo na região.

Figura 148: Alerta de Segurança – Intervenção no Acesso “Rio Bahia” - Barragem do Germano

ALERTA DE SEGURANÇA


REVISÃO 001- 07/05/2025

TERRAPLANAGEM – ACESSO RIO BAHIA

BARRAGEM DE GERMANO

Este alerta tem como objetivo informar sobre a atividade de execução de terraplanagem no acesso “Rio Bahia” próximo a balança na área da Barragem de Germano que terá início no dia 13/06/2025 às 17 horas com previsão de término no dia 21/06/2025. Nesse período o acesso ficará interditado durante todo o dia (24 horas).

O acesso para o refeitório avançado da Barragem de Germano e canteiro administrativo CAR será pelo acesso de Sela Tulipa e Selinha.

MAPA DO LOCAL DA INTERVENÇÃO E ALTERNATIVA DE ACESSO



Distribuído P. Entre em contato com a Segurança da Trabalho em 2020

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11.9 Equipamentos de Proteção Individual – EPIs

A Samarco define a especificação mínima dos EPIs (tipo e qualidade) a ser cumprida pelos prestadores de serviços, a partir dos riscos dos locais de trabalho e das atividades. Além dos requisitos da Samarco, a Norma Regulamentadora NR6 também deve ser atendida.

Os requisitos da Samarco estão contemplados no Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22 (Item 18.4), na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

Os prestadores de serviços são responsáveis por manter estoque de EPIs com quantidade adequada nas obras, a fim de evitar interrupção na realização das atividades. Além disso, devem fornecer e controlar os EPIs de seus funcionários e visitantes, assegurando que sejam adequadamente utilizados e mantidos. Também devem garantir as boas condições dos EPIs e os respectivos registros de fornecimento, treinamento e fiscalização de uso.

Os EPIs não podem sofrer alteração em sua estrutura, nem ser utilizados em condições para as quais não foram especificados.

O uso de uniforme é obrigatório por parte de todos os empregados dos prestadores de serviços, com o propósito de facilitar a identificação destes profissionais.

11.10 Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs

Os prestadores de serviços devem prever e implantar sistemas de proteção coletiva nos locais de trabalho, todos previamente aprovados pela equipe de SST da Samarco. Os padrões estabelecidos nos procedimentos de segurança, bem como todos os requisitos da Samarco e das normas regulamentadoras, em especial a NR18, devem ser atendidos.

Os requisitos da Samarco estão contemplados no Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22 (Item 18.3), na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

A instalação das proteções coletivas definidas na Avaliação Preliminar de Risco (APR) é considerada pré-requisito obrigatório para a autorização de realização da atividade.

A retirada de qualquer Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) de caráter definitivo ou provisório, sem a efetiva eliminação do risco, é considerada falta grave e passível de penalidades.

A sinalização de segurança nas obras deve atender aos padrões estabelecidos pela Samarco, conforme previsto no Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22 (Item 18.6), na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório. Os padrões legais, em especial a NR18 e a NR26, também devem ser atendidos.

A sinalização e o isolamento dos perigos durante a execução das obras são de responsabilidade dos prestadores de serviços encarregados das atividades.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11.11 Plano Diretor de Canteiros e Caminhos Seguros

Este plano define critérios e *layout* para instalação de acessos, portaria, estacionamentos de veículos e de ônibus, pátios de estocagem, almoxarifados, oficinas, escritórios, restaurantes e outros recursos para os prestadores de serviços.

As formas de segregação entre pessoas, máquinas e veículos durante o período de construção do projeto são definidas prioritariamente. Os caminhos seguros são construídos e mantidos em toda área de trabalho. Segregações entre as atividades do projeto e as atividades operacionais (rotina) também são priorizadas.

A implantação de acessos e os controles exclusivos para canteiros de obras, restaurantes, sanitários e serviços de atendimento a emergências passam por avaliação.

Também consta no Plano Diretor a obrigatoriedade de atendimento às determinações do Corpo de Bombeiros local, no tocante ao sistema de proteção contra incêndio e pânico.

11.12 Sistema de Permissões: Crachá, Vestuários e Uniformes

Crachá

Todos os empregados dos prestadores de serviços admitidos nas áreas de trabalho dos projetos são obrigados a portar documento denominado 'Crachá Funcional' para poder realizar suas atividades. Este documento evidencia a identificação do empregado, os treinamentos realizados e suas permissões de acesso.

Vestuários e Uniformes

O uso de uniforme é obrigatório por parte de todos os empregados nos canteiros de obras.

Os requisitos da Samarco para o fornecimento de uniformes estão contemplados no Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22 (Item 18.5), na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

Os prestadores de serviços devem disponibilizar, gratuitamente, no mínimo três jogos de uniformes para seus empregados a cada seis meses, impedindo o uso de peças danificadas. O uniforme deve ser 100% algodão, padrão Santista ou similar, com mangas longas para empregados de força de trabalho direta (atividades em campo) e confeccionado em cores de alta visibilidade.

Os prestadores de serviços também devem disponibilizar coletes refletivos na cor laranja, conforme o seguinte padrão específico: colete com faixa refletiva de, no mínimo, quatro centímetros de largura na parte da frente e nas costas, com elástico na barra para eliminar o risco de contato com partes móveis de equipamentos.

11.13 Ergonomia

Todas as atividades são analisadas com relação aos aspectos ergonômicos, seguindo os padrões estabelecidos na Norma Regulamentadora NR17.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



11.14 Incidência de Fenômenos Naturais

A Samarco mantém serviço de monitoramento constante de descargas atmosféricas. No caso de probabilidade de incidência de raios nas áreas de trabalho, os prestadores de serviços recebem comunicado de 'alerta de raio' e, imediatamente, devem retirar todas as pessoas dos locais considerados não-seguros (área ou campo descoberto, e instalações sem aterramento e SPDA), independentemente da atividade que estiver sendo realizada.

11.15 Manuseio e Armazenamento de Produtos Químicos

As técnicas adequadas de manuseio e armazenamento de produtos químicos consideram destinação de espaços e metodologia de armazenamento que permitam a deposição e a retirada destes produtos com segurança para os empregados, bem como a preservação dos equipamentos utilizados na atividade.

Qualquer produto químico só pode ser usado após avaliação da área de Higiene Ocupacional, e uma cópia da FISPQ deve ser disponibilizada nos locais de armazenagem e manuseio. Todos os produtos devem ser adequadamente identificados, sinalizados e armazenados.

Os prestadores de serviços devem treinar os empregados envolvidos no manuseio de produtos químicos, elaborar e revisar os respectivos procedimentos de manuseio, fornecer a FISPQ dos produtos e assegurar que todos os produtos transportados atendam à legislação em vigor.

11.16 Segurança no Transporte de Cargas

Todas as atividades de transporte de cargas dos projetos são de responsabilidade da Samarco, planejadas de modo a atender a todos os requisitos de segurança, tais como controle de velocidade, inspeções e controle de veículos, treinamentos, entre outros, para que sejam realizadas conforme os padrões de segurança e de qualidade requeridos.

O transporte de cargas sob responsabilidade dos prestadores de serviços é monitorado, visando a garantir a segurança desta atividade.

11.17 Gestão de Riscos de Saúde: Exames

A saúde de todos os empregados é monitorada periodicamente através do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, com exames admissionais, periódicos, para mudança de função, e na demissão.

O rol de exames atende à legislação Brasileira e está descrito no Edital de Contratação disponibilizado a todas as empresas que pretendem prestar serviços à Samarco.

As empresas prestadoras de serviços são avaliadas periodicamente por parte da Samarco, a fim de verificar a adesão aos requisitos legais e aos padrões pré-estabelecidos. Após análise, as ações de adequação são estabelecidas e monitoradas. Penalizações podem ser estipuladas para as empresas que não se adequarem.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Os prestadores de serviços devem monitorar todos os agentes ambientais existentes nas áreas de trabalho (ruído, poeira, vibração, entre outros) que podem causar danos à saúde dos empregados. As medições são disponibilizadas à Samarco, juntamente com as medidas de controle para o caso de a exposição exceder o limite legal.

Em conformidade com a legislação Brasileira, os prestadores de serviços devem monitorar seus empregados antes de acessar as dependências da Samarco, e no curso de seu trabalho, quanto ao uso de bebidas alcoólicas e de qualquer substância ilegal.

11.18 Manual de Procedimentos de Segurança

Os Procedimentos de Segurança constituem a base para o desenvolvimento de práticas seguras de trabalho, permitindo o controle e a mitigação da exposição dos empregados aos riscos. Estes procedimentos são revisados sempre que medidas de controle e/ou práticas que se mostrem mais seguras para a realização das atividades sejam identificadas.

Os procedimentos são elementos importantes para capacitação dos empregados em atividades específicas, além de estabelecer controles para todos os riscos críticos, conforme consta no subitem 11.6.1.3 – Fase de Execução do presente relatório.

A Samarco disponibiliza a todos os prestadores de serviços dos projetos o Manual de Procedimentos de Segurança, conforme descrito no Anexo 6.4 – Índice de Procedimentos de Segurança, na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho”, contendo todos os procedimentos pertinentes que devem ser adotados.

O manual está em conformidade com as políticas da Samarco, BHP e VALE, e atende a todas as exigências legais vigentes no país.

11.19 Manual de Saúde e Segurança do Trabalho (Edital de SST)

Disponibilizado a todos os prestadores de serviços, o documento ‘Anexo 6.1 – Edital de SST para Contratação de Fornecedores Revisão 5_Ago/22’, na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório, tem o objetivo de informar às empresas os requisitos mínimos de saúde e segurança para realização das atividades do Programa Descaracterização do Germano, além de orientar os processos de contratação de serviços.

O Edital de SST contém as especificações de veículos e equipamentos, instalações físicas, treinamentos, exames médicos, capacitação e permissões, incorporando as lições aprendidas nos projetos já executados pela Samarco. O edital é parte integrante de todos os contratos de prestação de serviços entre a Samarco e as empresas contratadas.

11.20 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO

Para assegurar as condições mínimas de saúde física e psicológica dos trabalhadores, é obrigatório que todos os prestadores de serviços implementem PCMSO próprio, conforme o seu PGR, obedecendo às seguintes atribuições:

- Elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) conforme a Norma Regulamentadora NR7;

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Elaborar e colocar em prática o PCMSO, com base nos riscos à saúde identificados, em conformidade com o conjunto de ações preventivas adotadas pela Samarco, tais como: exames médicos ocupacionais, melhorias ambientais, adoção de medidas de proteção individual e coletiva, programas de treinamento, normas e procedimentos de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, entre outros;
- Dispor de sistema de controle e documentação que propiciem a gestão de informações sobre as condições de saúde e do ambiente de trabalho para a empresa e seus empregados, de forma a atender ao disposto na legislação em vigor, considerando: convocação dos empregados, Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), acesso a registros, relatórios anuais, entre outros;
- Estabelecer ações de controle de doenças e vacinação nos canteiros de obras.

O prestador de serviços deve proporcionar, sem ônus para seus empregados, os exames médicos previstos na Norma Regulamentadora NR7.

11.21 Seleção de Prestadores de Serviços

A pré-qualificação de prestadores de serviços nos aspectos de SST é realizada para todas as empresas convidadas a participar dos processos de concorrência.

Na pré-qualificação, é avaliada a capacidade das proponentes de executar os serviços requeridos com a qualidade desejada e com ênfase no atendimento às exigências de SST, através de análise de resultados históricos. Os prestadores de serviços que apresentam bom desempenho de SST em projetos anteriores na Samarco podem ter seu histórico incluído na pré-qualificação.

Esta análise pode contemplar as seguintes ações: avaliação da documentação legal referente a SST, visitas técnicas nas instalações de empresas para as quais estejam prestando serviços similares, de modo que a equipe de SST da Samarco possa se certificar de que possuem condições adequadas para atender aos padrões exigidos no Plano de SST para os projetos. As inspeções são realizadas com acompanhamento parcial ou total, dependendo do grau de risco da atividade sob responsabilidade da proponente.

Os seguintes requisitos devem ser atendidos pelos prestadores de serviços:

- Dispor de sistema de qualificação equivalente para seus prestadores de serviços 'quarteirizados', sendo que estes devem ser submetidos à aprovação formal da gerenciadora de SST, bem como da Samarco;
- Adotar, no mínimo, as ações constantes no Plano de Gestão de SST da Samarco (inclusos os padrões de SST), no Edital de SST, no Manual de Procedimentos de SST e nos planos de emergência, como Diálogos Diários de Saúde e Segurança (DDSS), inspeções, reuniões de segurança com a participação de todos os empregados, Análises Preliminares de Risco de todas as atividades e Permissões para Trabalhos Perigosos, sendo monitorados quanto ao cumprimento destes quesitos;
- Possuir equipes próprias para o gerenciamento das questões de SST. Nos contratos firmados para a prestação de serviços existem cláusulas que preveem penalidades

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



rigorosas no caso de violação das disposições contidas no Manual de Saúde e Segurança, inclusive com a possibilidade de rescisão contratual para os casos de falhas reincidentes.

O desempenho dos prestadores de serviços em SST é monitorado durante a realização das suas atividades, sendo considerado para outros processos de contratação.

Os prestadores de serviços somente têm a permissão de iniciar seus trabalhos no canteiro de obras após atender a todos os requisitos de SST para a mobilização (instalações, documentações, máquinas, equipamentos e ferramentas).

As empresas prestadoras de serviços e suas subcontratadas podem adotar procedimentos próprios, somente nos casos em que estes sejam mais restritivos quando comparados aos procedimentos adotados pela Samarco.

A participação da Liderança dos projetos e da equipe de SST em reuniões de *Kick-Off* com os prestadores de serviços é de fundamental importância. Nestas ocasiões são enfatizados todos os padrões de SST aplicáveis aos serviços prestados, assegurando a entrega destes padrões a todos os prestadores de serviços envolvidos.

As atividades de mobilização sempre contam com a participação da Liderança dos projetos, visando a resultados bem-sucedidos.

11.22 Emergência

O Plano de Emergência do *Site* é adotado no local onde a obra será implantada, prevendo sinergia de recursos e a possibilidade de ações integradas. Um profissional da equipe de SST da Samarco é indicado para coordenar o Plano de Emergência.

A Samarco é responsável pelos recursos de atendimento de primeiros socorros, provendo instalações, profissionais especializados, remoção em ambulância e demais recursos materiais e humanos necessários.

Em casos específicos, os prestadores de serviços serão solicitados a mobilizar recursos próprios para atendimento a emergências.

A Samarco possui central dedicada para encaminhamento das demandas de emergência, conforme indicado na figura 149.

Figura 149: Números da Central de Emergência da Samarco



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



12. ASPECTOS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO

12.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao item 1.3 – Aspectos Ambientais das Obras de Descaracterização – Subitens I, II, III, IV e V do Termo de Referência da FEAM.

Também tem o objetivo de informar os controles ambientais durante as obras do Programa Descaracterização do Germano, bem como apresentar as ações implementadas e os resultados obtidos na gestão ambiental no período.

12.2 Introdução

Este item estabelece conjunto de ações para a gestão ambiental de projetos, em conformidade com as diretrizes da Samarco e as normas e legislações ambientais aplicáveis, priorizando a prevenção e a redução dos impactos ambientais decorrentes das atividades das obras.

12.3 Ref. Item 1.3 Aspectos Ambientais das Obras de Descaracterização

12.3.1 Ref. Item 1.3 – I – Apresentar o Estado das Estruturas de Drenagem, Canais de Desvio da Bacia de Drenagem ou Restabelecimento da Calha do Rio Formado por Elementos Naturais, Durante o Atual Estágio das Obras de Descaracterização, Quando Couber

O estado das estruturas de drenagem superficial no aspecto ambiental, com relação a integridade e funcionalidade, das obras de descaracterização são apresentadas a seguir, conforme as inspeções realizadas no período:

Cava do Germano: Inspeção da Drenagem Superficial e Vegetação

1. Verificação do projeto e localização:

- ✓ Traçado e cotas: Canais, canaletas, sarjetas e dispositivos implantados correspondem ao projeto aprovado;
- ✓ Profundidade das valas e caixas: Conforme projeto;
- ✓ Alinhamento dos canais/canaletas/sarjetas: Conforme projeto;
- ✓ Solução aplicada:
 - **Canais periféricos à montante do barramento:** Provisórios com acabamento em pedra de mão “arrumada”. Definitivo (Canal CP-03) com piso e paredes em concreto armado moldado in-loco;
 - **Canal de drenagem principal:** Canais, caixas de dissipação e escadas hidráulicas implantados em concreto armado moldado in-loco. Travessias de veículos em concreto pré-moldado;
 - **Passagem sob a rodovia MG-129:** Túneis tipo bala em peças pré-moldado e moldado in-loco;
 - **Canal da ombreira direita:** Canais e dispositivos de drenagem implantados em concreto em concreto pré-moldado. Escadas hidráulicas e descidas d’água em concreto armado moldado in-loco;
 - **Canal da ombreira esquerda:** Trecho superior a montante da berma de reforço revestido em pedra argamassada. Trecho inferior, canais e bacia de dissipação, revestido em concreto armado moldado in-loco;
 - **Canais superficiais do barramento:** Canaletas em peças de concreto pré-moldadas;

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- **Canais superficiais a jusante do barramento:** Canaletas em peças de concreto pré-moldadas e canais em concreto armado moldado in-loco.

Observações: Em termos funcionais, o sistema assegura a vazão prevista para eventos de chuva, com estruturas devidamente projetadas para controle e direcionamento das águas, minimizando riscos de inundação e garantindo a manutenção da rede ao longo do tempo. Importante informar que os canais periféricos provisórios implantados na superfície do reservatório serão modificados no decorrer da execução das obras do projeto de Proteção dos Taludes da Cava do Germano.

2. Condições das caixas de passagem, canaletas, bacias de dissipação, canais e dispositivos:

- ✓ Canais provisórios: Encontram-se em perfeito estado de conservação;
- ✓ Canais definitivos: Implantação concluída e em perfeito estado de conservação;
- ✓ Caixas, canaletas e dispositivos de drenagem: Sistema íntegro, sem danos, com tampas adequadas e proteções coletivas onde aplicável, limpos e desobstruídos;
- ✓ Canal de drenagem Principal (CDP): Bacias intermediária e bacia final, escadas hidráulicas e descidas d'água com estruturas em perfeito estado de conservação;
- ✓ Dispositivos de captação e direcionamento de fluxo funcionando sem bloqueios e sem vazamentos.

Observações: De modo geral, as estruturas dos canais, das caixas e dispositivos de drenagem estão em perfeito estado de conservação e encontram-se em operação.

A manutenção é realizada regularmente pela equipe de Rotina da Samarco.

3. Inspeção das Tubulações e Material

- ✓ Tubos e passagens: Assentados corretamente, sem desalinhamento;
- ✓ Materiais empregados: Em bom estado;
- ✓ Ausência de vazamentos em tubulações e conexões.

Observações: Em geral, todas as tubulações e passagens encontram-se operacionais, limpas e sem obstruções.

4. Esgotamento e Bombas (se aplicável)

- ✓ Bombas existentes e em funcionamento eficiente: Todo o sistema opera por gravidade dispensando o uso de bombas (não aplicável).
- ✓ Água bombeada não causa entupimentos em outras redes: Não aplicável.

Observações: Não aplicável.

5. Estado Geral e Manutenção

- ✓ Ausência de erosão ou desgastes ou sedimentos no sistema;
- ✓ Vegetação e taludes limpos, sem obstruções e sem erosões;
- ✓ Ausência de insetos, animais, odores ou sinais de problemas.

Observações: O sistema de drenagem atende os critérios ambientais e de funcionalidade previstos em projeto, dimensionado e implantado conforme parâmetros técnicos adequados, garante a capacidade de escoamento das águas pluviais sem provocar impactos negativos ao meio ambiente, como erosão ou poluição dos corpos d'água.

6. Segurança e Sustentabilidade

- ✓ Bordas e acessos protegidos adequadamente
- ✓ Sistema preserva pavimento e previne alagamentos

Observações: Considera a segurança e a sustentabilidade, evitando a ampliação de cheias, com soluções que mitigam impactos e asseguram sua eficiência hidráulica e sua compatibilidade e conservação ambiental, conforme as Leis, normas e boas práticas técnicas recomendadas e reconhecidas para projetos de drenagem em sites de mineração.

As figuras 150, 151, 152 e 153 apresentam evidências das boas condições do sistema de drenagem superficial, definitivo e provisório, implantado na Cava do Germano.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 150: Vista Geral do Sistema de Drenagem Superficial da Cava do Germano



Figura 151: Sistema de Drenagem Superficial a Montante do Barramento Principal da Cava



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 152: Sistema de Drenagem Superficial do Barramento Principal da Cava



Figura 153: Sistema de Drenagem Superficial a Jusante do Barramento Principal da Cava



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Resumo da inspeção realizada na Cava do Germano:

O sistema de drenagem superficial implantado na Cava de Germano apresenta desempenho satisfatório quanto à sua integridade física e funcionalidade operacional, demonstrando conformidade com os padrões técnicos e ambientais previstos no projeto. Do ponto de vista ambiental, observou-se que o sistema foi concebido considerando aspectos de sustentabilidade, como a minimização de impactos ao solo, à vegetação e aos recursos hídricos locais.

Ações recomendadas:

Limpeza dos dispositivos de drenagem antes do início do próximo período chuvoso.

Bacia do Chico: Inspeção em Drenagem Superficial e Vegetação

1. Verificação do projeto e localização:

- ✓ Traçado e cotas: Canais e dispositivos implantados correspondem ao projeto aprovado;
- ✓ Profundidade das valas e caixas: Conforme projeto;
- ✓ Alinhamento dos canais: Conforme projeto;
- ✓ Solução aplicada:
 - **Canal principal:** Piso e paredes revestidos em pedra argamassada;
 - **Canais secundários:** Piso e paredes revestidos em pedra argamassada;
 - **Passagem sob a ferrovia da Vale:** Túneis tipo bala em peças pré-moldado e moldado in-loco;
 - **Bueiros:** Estruturas em concreto armado moldado in-loco.

Observações: Em termos funcionais, o sistema assegura a vazão prevista para eventos de chuva, com estruturas devidamente projetadas para controle e direcionamento das águas, minimizando riscos de inundação e garantindo a manutenção da rede ao longo do tempo. Importante informar que a travessia de veículos, localizada no canal secundário a montante do transportadores CV090/108, será removida após a desmobilização do pátio de materiais temporário existente no local.

2. Condições das caixas de passagem, canais e dispositivos de drenagem:

- ✓ Canais provisórios: Não aplicável (obras definitivas finalizadas);
- ✓ Canais definitivos: Implantação concluída e em perfeito estado de conservação;
- ✓ Caixas/Bueiros e dispositivos de drenagem: Sistema íntegro, sem danos, com tampas adequadas e proteções coletivas onde aplicável, limpos e desobstruídos;
- ✓ Dispositivos de captação e direcionamento de fluxo funcionando sem bloqueios e sem vazamentos.

Observações: De modo geral, as estruturas dos canais e dispositivos de drenagem estão em perfeito estado de conservação e encontram-se em operação.

A travessia de veículos existente no canal secundário não impede o escoamento de água. A remoção de material sedimentado no canal será removido antes do início do próximo período chuvoso.

A manutenção é realizada regularmente pela equipe de Rotina da Samarco.

3. Inspeção das Tubulações e Material

- ✓ Tubos e passagens: Assentados corretamente, sem desalinhamento;
- ✓ Materiais empregados: Em bom estado;
- ✓ Ausência de vazamentos em tubulações e conexões.

Observações: Em geral, todas as tubulações e passagens encontram-se operacionais, limpas e sem obstruções.

4. Esgotamento e Bombas (se aplicável)

- ✓ Bombas existentes e em funcionamento eficiente: Todo o sistema opera por gravidade dispensando o uso de bombas (não aplicável).

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



O canal de drenagem principal da Bacia do Chico encontra-se desassoreado, limpo e com o revestimento finalizado. O trecho do canal secundário, localizado entre o estacionamento e o pátio de materiais, será desassoreado quando da remoção da travessia de veículos existente no local.

De forma geral, o sistema de drenagem implantado na Bacia do Chico apresenta desempenho satisfatório quanto à integridade física e à funcionalidade operacional, atendendo aos padrões técnicos e ambientais estabelecidos no projeto. Sob a ótica ambiental, destaca-se que o sistema foi concebido considerando princípios de sustentabilidade, priorizando a minimização de impactos sobre o solo, a vegetação e os recursos hídricos da área de influência.

Ações recomendadas:

Desassoreamento e limpeza do canal secundário a montante dos TCLDs CV090/108 antes do início do próximo período chuvoso, visando assegurar o seu pleno funcionamento.

Barragem do Germano: Inspeção em Drenagem Superficial e Vegetação

1. Verificação do projeto e localização:

- ✓ Traçado e cotas: Canais e dispositivos implantados correspondem ao projeto aprovado;
- ✓ Profundidade das valas e caixas: Conforme projeto;
- ✓ Alinhamento dos canais: Conforme projeto;
- ✓ Solução aplicada:
 - **Canal de drenagem principal:** Totalmente finalizado e em operação. Estrutura do emboque, canal (piso e paredes), descidas d'água, travessia de veículos e bacia final em concreto armado moldado in-loco;
 - **Canal principal do regrade:** Definitivo - eixo principal do canal com piso e paredes com revestimento em geocélulas preenchidas com concreto, formando um sistema de revestimento tridimensional reforçado que permite a flexibilização da estrutura sobre a base em solo compactado. Nas laterais da calha do canal, revestimento em pedra argamassada. Provisório – vala construída com a mesma capacidade operacional prevista em projeto para o canal definitivo. Travessia de veículos com estrutura em concreto pré-moldada.
 - **Canais de aproximação do regrade:** Totalmente concluído e em operação. Canal com o eixo principal com piso e paredes com revestimento em geocélulas preenchidas com concreto, formando um sistema de revestimento tridimensional reforçado que permite a flexibilização da estrutura sobre a base em solo compactado. Nas laterais da calha do canal, revestimento em pedra argamassada. Travessia de veículos implantada com estrutura em concreto pré-moldado.
 - **Canais secundários do regrade:** Definitivos - piso e paredes revestidos em pedra “arrumada”. Provisórios – valas construídas com a mesma capacidade operacional prevista em projeto para os canais definitivos.
 - **Canal de drenagem da ombreira esquerda:** Trecho inferior e intermediário com estrutura dos canais e escadas hidráulicas implantados em concreto pré-moldado. Trecho superior em obras (mesma solução empregada nos trechos finalizados);
 - **Canal de drenagem da ombreira direita:** Obras em andamento (mesma solução empregada no canal da ombreira esquerda).

Observações: Em termos funcionais, o sistema assegura a vazão prevista para eventos de chuva, com estruturas devidamente projetadas para controle e direcionamento das águas, minimizando riscos de inundação e garantindo a manutenção da rede ao longo do tempo.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



2. Condições das passagens molhadas, travessias de veículos, canais e dispositivos de drenagem:

- ✓ Canais provisórios: Construídos com a mesma capacidade operacional prevista em projeto e em operação;
- ✓ Canais definitivos: Implantação concluída e em perfeito estado de conservação;
- ✓ Caixas/Bueiros e dispositivos de drenagem: Sistema íntegro, sem danos, com tampas adequadas e proteções coletivas onde aplicável, limpos e desobstruídos;
- ✓ Dispositivos de captação e direcionamento de fluxo funcionando sem bloqueios e sem vazamentos.

Observações: De modo geral, as estruturas dos canais e dispositivos de drenagem definitivos estão em perfeito estado de conservação e encontram-se em operação. Os trechos provisórios permitem o escoamento das águas com a mesma capacidade operacional prevista em projeto.

A manutenção é realizada regularmente pela equipe de Projetos da Samarco.

3. Inspeção das Tubulações e Material

- ✓ Tubos e passagens: Assentados corretamente, sem desalinhamento;
- ✓ Materiais empregados: Em bom estado;
- ✓ Ausência de vazamentos em tubulações e conexões.

Observações: Em geral, todas as tubulações e passagens encontram-se operacionais, limpas e sem obstruções.

4. Esgotamento e Bombas (se aplicável)

- ✓ Bombas existentes e em funcionamento eficiente: Atualmente, o sistema opera por gravidade dispensando o uso de bombas (não aplicável).
- ✓ Água bombeada não causa entupimentos em outras redes: Não aplicável.

Observações: Sistema desativado e desmobilizado em setembro de 2024 com o início da operação do canal de drenagem principal.

5. Estado Geral e Manutenção

- ✓ Ausência de erosão ou desgastes ou sedimentos no sistema;
- ✓ Vegetação e taludes limpos, sem obstruções e sem erosões;
- ✓ Ausência de insetos, animais, odores ou sinais de problemas.

Observações: O sistema de drenagem atende os critérios ambientais e de funcionalidade previstos em projeto, dimensionado e implantado conforme parâmetros técnicos adequados, garante a capacidade de escoamento das águas pluviais sem provocar impactos negativos ao meio ambiente, como erosão ou poluição dos corpos d'água.

6. Segurança e Sustentabilidade

- ✓ Bordas e acessos protegidos adequadamente
- ✓ Sistema preserva pavimento e previne alagamentos

Observações: Considera a segurança e a sustentabilidade, evitando a ampliação de cheias, com soluções que mitiguem impactos e asseguram sua eficiência hidráulica e sua compatibilidade e conservação ambiental, conforme as Leis, normas e boas práticas técnicas recomendadas e reconhecidas para projetos de drenagem em sites de mineração.

As figuras 155 a 158 apresentam evidências das boas condições do sistema de drenagem superficial, definitivo e provisório, implantado na Barragem do Germano.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 155: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem da Barragem – Regiões do Pinheirinho e Ferrovia



Figura 156: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem da Barragem – Região do Dique Auxiliar



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 157: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem da Barragem – Região da Baía 3



Figura 158: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem da Barragem – Canal de Drenagem Principal



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Resumo da inspeção na Barragem do Germano:

O sistema de drenagem superficial da Barragem do Germano encontra-se em boas condições operacionais, permitindo perfeitamente o escoamento das águas superficiais provenientes das chuvas e do solo.

De forma geral, o sistema de drenagem implantado na Barragem do Germano apresenta desempenho satisfatório quanto à integridade física e à funcionalidade operacional, atendendo aos padrões técnicos e ambientais estabelecidos no projeto. Sob a perspectiva ambiental, ressalta-se que o sistema foi concebido considerando princípios de sustentabilidade, priorizando a minimização de impactos sobre o solo, a vegetação e os recursos hídricos da área de influência.

Ações recomendadas:

Manutenção periódica dos canais e dispositivos provisórios, em função das obras em andamento, visando garantir a plena capacidade operacional do sistema.

Sela Tulipa: Inspeção em Drenagem Superficial e Vegetação

1. Verificação do projeto e localização:

- ✓ Traçado e cotas: Canais e dispositivos implantados correspondem ao projeto aprovado;
- ✓ Profundidade das valas e caixas: Conforme projeto;
- ✓ Alinhamento dos canais: Conforme projeto;
- ✓ Solução aplicada:
 - **Canais de drenagem a montante do barramento:** Sistema totalmente finalizado e em operação. Canais com piso e paredes revestidos em pedra “arrumada”;
 - **Canais do barramento e berma de reforço:** Canais finalizados e em operação. Canais com piso e paredes revestidos em pedra “arrumada”. Descidas d’água com piso em concreto e paredes em pedra argamassada.

Observações: Em termos funcionais, o sistema assegura a vazão prevista para eventos de chuva, com estruturas devidamente projetadas para controle e direcionamento das águas, minimizando riscos de inundação e garantindo a manutenção da rede ao longo do tempo.

2. Condições dos canais e dispositivos de drenagem:

- ✓ Canais definitivos: Implantação concluída e em perfeito estado de conservação;
- ✓ Caixas/Bueiros e dispositivos de drenagem: Sistema íntegro, sem danos, com tampas adequadas e proteções coletivas onde aplicável, limpos e desobstruídos;
- ✓ Dispositivos de captação e direcionamento de fluxo funcionando sem bloqueios e sem vazamentos.

Observações: De modo geral, as estruturas dos canais e dispositivos de drenagem definitivos estão em perfeito estado de conservação e encontram-se em operação. Os trechos provisórios permitem o escoamento das águas com a mesma capacidade operacional prevista em projeto.

A manutenção é realizada regularmente pela equipe de Rotina da Samarco.

3. Inspeção das Tubulações e Material

- ✓ Tubos e passagens: Assentados corretamente, sem desalinhamento;
- ✓ Materiais empregados: Em bom estado;
- ✓ Ausência de vazamentos em tubulações e conexões.

Observações: Em geral, todas as tubulações e passagens encontram-se operacionais, limpas e sem obstruções.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL N°14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



4. Esgotamento e Bombas (se aplicável)

- ✓ Bombas existentes e em funcionamento eficiente: O sistema opera por gravidade dispensando o uso de bombas (não aplicável).
- ✓ Água bombeada não causa entupimentos em outras redes: Não aplicável.

Observações: Não aplicável

5. Estado Geral e Manutenção

- ✓ Ausência de erosão ou desgastes ou sedimentos no sistema;
- ✓ Vegetação e taludes limpos, sem obstruções e sem erosões;
- ✓ Ausência de insetos, animais, odores ou sinais de problemas.

Observações: O sistema de drenagem atende os critérios ambientais e de funcionalidade previstos em projeto, dimensionado e implantado conforme parâmetros técnicos adequados, garante a capacidade de escoamento das águas pluviais sem provocar impactos negativos ao meio ambiente, como erosão ou poluição dos corpos d'água.


6. Segurança e Sustentabilidade

- ✓ Bordas e acessos protegidos adequadamente
- ✓ Sistema preserva pavimento e previne alagamentos

Observações: Considera a segurança e a sustentabilidade, evitando a ampliação de cheias, com soluções que mitigam impactos e asseguram sua eficiência hidráulica e sua compatibilidade e conservação ambiental, conforme as Leis, normas e boas práticas técnicas recomendadas e reconhecidas para projetos de drenagem em sites de mineração.

A figura 159 apresenta evidências das boas condições do sistema de drenagem superficial, definitivo e provisório, implantado no Dique Sela Tulipa.

Figura 159: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem do Dique Sela Tulipa



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Resumo da inspeção realizada em Sela Tulipa:

O sistema de drenagem superficial implantado em Sela Tulipa apresenta desempenho satisfatório quanto à sua integridade física e funcionalidade operacional, demonstrando conformidade com os padrões técnicos e ambientais previstos no projeto. Do ponto de vista ambiental, observou-se que o sistema foi concebido considerando aspectos de sustentabilidade, como a minimização de impactos ao solo, à vegetação e aos recursos hídricos locais.

Ações recomendadas:

Limpeza e manutenção dos dispositivos de drenagem antes do início do próximo período chuvoso.

Selinha: Inspeção em Drenagem Superficial e Vegetação

1. Verificação do projeto e localização:

- ✓ Traçado e cotas: Canais e dispositivos implantados correspondem ao projeto aprovado;
- ✓ Profundidade das valas e caixas: Conforme projeto;
- ✓ Alinhamento dos canais: Conforme projeto;
- ✓ Solução aplicada:
 - **Canais do barramento e berma de reforço:** Canais finalizados e em operação. Canais com piso e paredes revestidos em pedra “arrumada”. Descidas d’água com piso em concreto e paredes em pedra argamassada;
 - **Canais de drenagem a jusante do barramento (Vale do Fundão):** Sistema totalmente finalizado e em operação. Canais com piso e paredes revestidos em pedra “arrumada”.

Observações: Em termos funcionais, o sistema assegura a vazão prevista para eventos de chuva, com estruturas devidamente projetadas para controle e direcionamento das águas, minimizando riscos de inundação e garantindo a manutenção da rede ao longo do tempo.

2. Condições das passagens molhadas, travessias de veículos, canais e dispositivos de drenagem:

- ✓ Canais definitivos: Implantação concluída e em perfeito estado de conservação;
- ✓ Caixas/Bueiros e dispositivos de drenagem: Sistema íntegro, sem danos, com tampas adequadas e proteções coletivas onde aplicável, limpos e desobstruídos;
- ✓ Dispositivos de captação e direcionamento de fluxo funcionando sem bloqueios e sem vazamentos.

Observações: De modo geral, as estruturas dos canais e dispositivos de drenagem definitivos estão em perfeito estado de conservação e encontram-se em operação. Os trechos provisórios permitem o escoamento das águas com a mesma capacidade operacional prevista em projeto.

A manutenção é realizada regularmente pela equipe de Rotina da Samarco.

3. Inspeção das Tubulações e Material

- ✓ Tubos e passagens: Assentados corretamente, sem desalinhamento;
- ✓ Materiais empregados: Em bom estado;
- ✓ Ausência de vazamentos em tubulações e conexões.

Observações: Em geral, todas as tubulações e passagens encontram-se operacionais, limpas e sem obstruções.

4. Esgotamento e Bombas (se aplicável)

- ✓ Bombas existentes e em funcionamento eficiente: Atualmente, o sistema opera por gravidade dispensando o uso de bombas (não aplicável).
- ✓ Água bombeada não causa entupimentos em outras redes: Não aplicável.

Observações: Sistema desativado e desmobilizado em setembro de 2024 com o início da operação do canal de drenagem principal.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



5. Estado Geral e Manutenção

- ✓ Ausência de erosão ou desgastes ou sedimentos no sistema;
- ✓ Vegetação e taludes limpos, sem obstruções e sem erosões;
- ✓ Ausência de insetos, animais, odores ou sinais de problemas.

Observações: O sistema de drenagem atende os critérios ambientais e de funcionalidade previstos em projeto, dimensionado e implantado conforme parâmetros técnicos adequados, garante a capacidade de escoamento das águas pluviais sem provocar impactos negativos ao meio ambiente, como erosão ou poluição dos corpos d'água.

6. Segurança e Sustentabilidade

- ✓ Bordas e acessos protegidos adequadamente
- ✓ Sistema preserva pavimento e previne alagamentos

Observações: Considera a segurança e a sustentabilidade, evitando a ampliação de cheias, com soluções que mitigam impactos e asseguram sua eficiência hidráulica e sua compatibilidade e conservação ambiental, conforme as Leis, normas e boas práticas técnicas recomendadas e reconhecidas para projetos de drenagem em sites de mineração.

As figuras 160 e 161 apresentam evidências das boas condições do sistema de drenagem superficial, definitivo e provisório, implantado no Dique Selinha.

Figura 160: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem do Dique Selinha



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 161: Evidências das Condições do Sistema a de Drenagem de Selinha – Vale do Fundão



Resumo da inspeção realizada em Selinha:

O sistema de drenagem superficial implantado em Selinha apresenta desempenho satisfatório quanto à sua integridade física e funcionalidade operacional, demonstrando conformidade com os padrões técnicos e ambientais previstos no projeto. Do ponto de vista ambiental, observou-se que o sistema foi concebido considerando aspectos de sustentabilidade, como a minimização de impactos ao solo, à vegetação e aos recursos hídricos locais.

Ações recomendadas:

Limpeza e manutenção dos dispositivos de drenagem antes do início do próximo período chuvoso.

Barragem Eixo 1: Inspeção em Drenagem Superficial e Vegetação

1. Verificação do projeto e localização:

- ✓ Traçado e cotas: Canais e dispositivos implantados correspondem ao projeto aprovado;
- ✓ Profundidade das valas e caixas: Conforme projeto;
- ✓ Alinhamento dos canais: Conforme projeto;
- ✓ Solução aplicada:
 - **Canais de drenagem a montante do barramento (Vale do Fundão):** Sistema totalmente finalizado e em operação. Canais com piso e paredes revestidos em pedra “arrumada”.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- **Canais de drenagem a jusante do barramento (Vale do Fundão):** Sistema totalmente finalizado e em operação. Canal da ombreira esquerda: estrutura do emboque, canal (piso e paredes), descidas d'água e bacia final em concreto armado moldado in-loco. Canal da ombreira direita: estrutura do emboque, canal (piso e paredes), descidas d'água, travessia de veículos e bacia final em concreto armado moldado in-loco;

Observações: Em termos funcionais, o sistema assegura a vazão prevista para eventos de chuva, com estruturas devidamente projetadas para controle e direcionamento das águas, minimizando riscos de inundação e garantindo a manutenção da rede ao longo do tempo.

2. Condições das passagens molhadas, travessias de veículos, canais e dispositivos de drenagem:

- ✓ Canais definitivos: Implantação concluída e em perfeito estado de conservação;
- ✓ Caixas/Bueiros e dispositivos de drenagem: Sistema íntegro, sem danos, com tampas adequadas e proteções coletivas onde aplicável, limpos e desobstruídos;
- ✓ Dispositivos de captação e direcionamento de fluxo funcionando sem bloqueios e sem vazamentos.

Observações: De modo geral, as estruturas dos canais e dispositivos de drenagem definitivos estão em perfeito estado de conservação e encontram-se em operação. Os trechos provisórios permitem o escoamento das águas com a mesma capacidade operacional prevista em projeto.

A manutenção é realizada regularmente pela equipe de Rotina da Samarco.

3. Inspeção das Tubulações e Material

- ✓ Tubos e passagens: Assentados corretamente, sem desalinhamento;
- ✓ Materiais empregados: Em bom estado;
- ✓ Ausência de vazamentos em tubulações e conexões.

Observações: Em geral, todas as tubulações e passagens encontram-se operacionais, limpas e sem obstruções.

4. Esgotamento e Bombas (se aplicável)

- ✓ Bombas existentes e em funcionamento eficiente: Atualmente, o sistema opera por gravidade dispensando o uso de bombas (não aplicável).
- ✓ Água bombeada não causa entupimentos em outras redes: Não aplicável.

Observações: Sistema desativado e desmobilizado em setembro de 2024 com o início da operação do canal de drenagem principal.

5. Estado Geral e Manutenção

- ✓ Ausência de erosão ou desgastes ou sedimentos no sistema;
- ✓ Vegetação e taludes limpos, sem obstruções e sem erosões;
- ✓ Ausência de insetos, animais, odores ou sinais de problemas.

Observações: O sistema de drenagem atende os critérios ambientais e de funcionalidade previstos em projeto, dimensionado e implantado conforme parâmetros técnicos adequados, garante a capacidade de escoamento das águas pluviais sem provocar impactos negativos ao meio ambiente, como erosão ou poluição dos corpos d'água.

6. Segurança e Sustentabilidade

- ✓ Bordas e acessos protegidos adequadamente
- ✓ Sistema preserva pavimento e previne alagamentos

Observações: Considera a segurança e a sustentabilidade, evitando a ampliação de cheias, com soluções que mitigam impactos e asseguram sua eficiência hidráulica e sua compatibilidade e conservação ambiental, conforme as Leis, normas e boas práticas técnicas recomendadas e reconhecidas para projetos de drenagem em sites de mineração.

As figuras 162 e 163 apresentam evidências das boas condições do sistema de drenagem superficial, definitivo e provisório, implantado na Barragem Eixo 1.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 162: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem a Montante da Barragem Eixo 1



Figura 163: Evidências das Condições do Sistema de Drenagem a Jusante da Barragem Eixo 1



Resumo da inspeção realizada na Barragem Eixo 1:

O sistema de drenagem superficial implantado na Barragem Eixo 1 apresenta desempenho satisfatório quanto à sua integridade física e funcionalidade operacional, demonstrando conformidade com os padrões técnicos e ambientais previstos no projeto. Do ponto de vista ambiental, observou-se que o sistema foi concebido considerando aspectos de sustentabilidade, como a minimização de impactos ao solo, à vegetação e aos recursos hídricos locais.

Ações recomendadas:

Limpeza e manutenção dos dispositivos de drenagem antes do início do próximo período chuvoso.

Em termos gerais, o sistema de drenagem superficial implantado na descaracterização da Cava do Germano, da Barragem do Germano, dos diques de Sela Tulipa e Selinha, bem como na Barragem do Eixo, atende os critérios ambientais e de funcionalidade previstos em projeto.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



12.3.2 Ref. Item 1.3 – II – Informar as Ações e Programas Adotados para Controlar, Mitigar, Recuperar e, Quando Couber, Compensar Impactos Ambientais Causados pelas Obras de Descaracterização

Este subitem informa ações e programas adotados para controlar, mitigar, recuperar e, quando couber, compensar impactos ambientais causados pelas obras de descaracterização.


12.3.2.1 Ref. Item 1.3 – Subitem II (a) – Informar Ações Executadas do Programa de Manejo do Patrimônio Espeleológico na Área Afetada pelas Obras de Descaracterização, Quando Couber

Este subitem informa as ações do programa de manejo do patrimônio espeleológico executadas na área afetada pelas obras de descaracterização.

Foram identificadas 65 cavidades naturais subterrâneas na Área Diretamente Afetada (ADA) referente aos projetos de Descaracterização da Cava e Barragem do Germano, bem como no seu entorno (*buffer* de 250 metros).

As áreas de influência dessas cavidades foram divididas em grupos que abarcaram todas as cavidades presentes no empreendimento e que, por norma, exigem esta definição. As cavidades e as áreas de influência definidas e aprovadas estão apresentadas na figura 164.

Figura 164: Cavidades por Grau de Relevância da Descaracterização e Áreas de Influência Definidas



A seguir estão evidenciados os avanços das ações executadas sobre as cavidades que fazem parte da ADA e do *buffer* de 250 metros no Programa Descaracterização do Germano no período de referência. As ações foram realizadas em atendimento às condicionantes

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



direcionadas à temática espeleológica, conforme o Documento de Autorização para Intervenção Ambiental (DAIA) n.º 26980161, cuja vigência foi encerrada em fevereiro de 2024.

CONDICIONANTE 06 – RESGATE ESPELEOLÓGICO

Redação original:

“Realizar, antes da intervenção nas cavidades naturais subterrâneas, o registro e armazenamento cartográfico e fotográfico das cavidades alvo de supressão, bem como inventário e coleta de espeleotemas e elementos geológicos, depósitos sedimentares químicos e clásticos e de elementos biológicos representativos do ecossistema cavernícola, compreendendo o resgate, transporte adequado e a destinação a coleções científicas institucionais e o registro de todas as informações no CANIE.

Apresentar relatório técnico-fotográfico acompanhado de anotação de responsabilidade técnica junto ao conselho profissional que ateste que a supressão de cavidades foi precedida do referido resgate e realizar o registro de todas as informações no CANIE.”

Histórico

Foram previstos impactos negativos irreversíveis em duas cavidades, autorizados no processo COPAM nº 09020000191/20: CA-08, LOC-0177, sendo o primeiro considerado de baixa relevância e o segundo considerado de média relevância. Também foram previstas interferências indiretas em outras três cavidades, cuja supressão já havia sido autorizada na LOC nº 020/2019 (Parecer Único nº 0603993/2019, PA COPAM 00015/1984/107/2017), denominadas: LOC-0171, LOC-0174 e LOC-0175.

O relatório de resgate espeleológico foi protocolado em 28 de outubro de 2022, através ofício GMA-G-917/2022, vinculado ao processo COPAM nº 09020000191/20. Este relatório contém todo o detalhamento fotográfico, cartográfico e os depósitos relevantes às ações realizadas para os resgates bioespeleológicos (AMF nº 117/2021), conforme previsto na condicionante. Esta condicionante foi atendida e os resultados do resgate foram publicados em atendimento à Condicionante 07, conforme descrito no tópico a seguir.

Figura 165: Registro Fotográfico do Inventário do Resgate Espeleológico na Caverna CA-08



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 166: Aplicação da Metodologia de Busca Ativa Dentro das Cavidades



CONDICIONANTE 07 – PUBLICAÇÃO DOS DADOS DO RESGATE

Redação original:

“Disponibilizar os resultados obtidos que se referem a condicionante de resgate de informações e elementos das cavidades suprimidas para a comunidade espeleológica brasileira por meio de submissão dos dados para publicação científica (periódicos, revistas, anais, dentre outros) com apresentação de aceite da publicação.”

Histórico

Os dados obtidos a partir do resgate de informações e elementos das cavidades suprimidas foram submetidos para avaliação da comissão científica do 37º Congresso Brasileiro de Espeleologia – CBE, tendo sido aceitos para publicação. A divulgação dos dados ocorreu por meio dos anais do evento em julho de 2023. Posteriormente, o documento comprobatório do aceite do trabalho pela comissão científica do referido congresso foi protocolado através do ofício SAM-G-0545/2023, vinculado ao processo COPAM nº 09020000191/20.

CONDICIONANTE 08 - MONITORAMENTO DE MATERIAL PARTICULADO

Redação original:

“Ampliar a execução semestral do Programa de Monitoramento de Material Particulado, definido como condicionante 55 da Licença de Operação Corretiva – LOC nº 020/2019 (Parecer Único nº0603993/2019, PA COPAM 00015/1984/107/2017), para as cavidades BG-03, BG-04, LOC-0185 e LOC-0182. OBS: A metodologia a ser empregada é a descrita no âmbito da LOC nº 020/2019 (Parecer Único nº0603993/2019, PA COPAM 00015/1984/107/2017).”

Histórico

O monitoramento de material particulado em cavidades do Programa Descaracterização do Germano segue a metodologia empregada e descrita no âmbito da LOC nº 020/2019

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



(Parecer Único nº 0603993/2019, PA COPAM 00015/1984/107/2017), em atendimento à Condicionante 55.

As campanhas em campo ocorrem semestralmente sob responsabilidade da empresa Ativo Ambiental e os resultados são apresentados juntamente à Condicionante 55, atendendo ao cronograma aprovado pelo órgão ambiental.

A sexta campanha do monitoramento de material particulado foi realizada entre 12 e 23 de junho de 2023, e a entrega do relatório à Samarco ocorreu em outubro de 2023.

A sétima campanha foi realizada entre 5 e 11 de dezembro de 2023 e os dados coletados estão contemplados no relatório entregue à Samarco em fevereiro de 2024.

A oitava campanha foi realizada entre 7 e 16 de maio de 2024 e os dados coletados estão contemplados no relatório entregue à Samarco em agosto de 2024.

A nova campanha foi realizada entre 13 e 23 de janeiro de 2025 e os dados coletados estão contemplados no relatório entregue à Samarco em março de 2025.

A partir das observações, é possível entender que a distância das fontes emissoras não tem relação com a deposição de material particulado. Uma hipótese é que a deposição resulte de causa natural associada à gênese e composição das cavidades monitoradas. Observa-se, ainda, que a deposição de particulados nas cavidades monitoradas não apresenta impactos à fauna e presença de recursos tróficos nestas feições.

Cabe informar que, apesar de o DAIA do Processo n.º 09020000191/20 ter encerrado sua vigência em fevereiro de 2024, as cavidades-alvo continuaram sendo monitoradas ao longo de 2024 como medida preventiva. No entanto, ao longo de todo o período monitorado, não houve impactos da deposição de material particulado sobre o ecossistema que está ligado às cavidades BG-03, BG-04, LOC-0185 e LOC-0182. Dessa forma, tendo em vista os resultados alcançados, o monitoramento foi cessado devido ao término da vigência do DAIA, não havendo justificativa para sua manutenção.

Importante ressaltar que, no âmbito do Parecer n.º 35/FEAM/GST/2025, vinculado ao Projeto Longo Prazo (Processo SLA n.º 3858/2022), foi aprovada pela FEAM a implementação do Programa de Gestão Espeleológica do Complexo Germano. O referido programa definiu cavidades-alvo de monitoramento, representativas da totalidade do território abrangido pelos projetos em execução, contemplando as áreas da LOC, Descaracterização e Longo Prazo. Assim, o programa viabiliza o monitoramento sistemático e contínuo das condições morfodinâmicas e hidrogeológicas das cavidades suscetíveis a impactos potenciais oriundos das atividades operacionais da Samarco, garantindo o suporte para a gestão ambiental preventiva e mitigatória nestas áreas.

CONDICIONANTE 10 – MONITORAMENTO DE INTEGRIDADE FÍSICA

Redação original:

“Executar o programa de monitoramento de integridade física das cavidades BG-01, BG-05, LOC-0149, LOC-0150, LOC-0191, LOC-0192, LOC-0202, LOC-0217, LOC-219, LOC-

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



0291, LOC-0295 e SM-121. OBS: A metodologia a ser empregada é a descrita no âmbito da LOC nº 020/2019 (Parecer Único nº 0603993/2019, PA COPAM 00015/1984/107/2017).”

Histórico

O Monitoramento de integridade física das cavidades preconizadas pela Condicionante 10 do DAIA da Descaracterização da Cava e Barragem de Germano vem sendo realizado semestralmente pela empresa Ativo Ambiental, empregando a metodologia descrita no âmbito da LOC nº 020/2019 (Parecer Único nº 0603993/2019, PA COPAM 00015/1984/107/2017), em atendimento à condicionante 50.

A sexta campanha de monitoramento de integridade física foi realizada entre 25 de setembro e 6 de outubro de 2023, e a entrega do relatório à Samarco ocorreu em dezembro de 2023.

Em novembro de 2023 foi realizado protocolo anual em atendimento parcial a esta condicionante, da mesma forma que nos anos anteriores, via Ofício SAM_G_1090_2023, Processo SEI 77964805, com respeito aos dados consolidados até a quinta campanha.

A sétima campanha foi realizada entre 22 de maio e 13 de junho de 2024 e os dados coletados estão contemplados no relatório entregue à Samarco em setembro de 2024.

A oitava campanha foi realizada entre 26 de novembro e 11 de dezembro de 2024 e os dados coletados estão contemplados no relatório entregue à Samarco em fevereiro de 2025. A figura 167 apresenta o monitoramento da oitava campanha: ponto de fragilidade P3 da cavidade LOC-0291. A fotografia consta no relatório entregue à Samarco em dezembro de 2024.

Em termos gerais, não houve alterações perceptíveis na integridade física. Pontualmente, foram observadas mobilizações de sedimentos clásticos. Tais ocorrências podem estar relacionadas a impactos antrópicos resultantes de atividades de monitoramento, bem como a enxurradas provenientes de águas meteóricas.

Figura 167: Monitoramento de Integridade Física Ponto de Fragilidade P4 da cavidade LOC-0291 (Oitava Campanha)



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



É importante ressaltar que, apesar de o DAIA do Processo n.º 09020000191/20 ter encerrado sua vigência em fevereiro de 2024, as cavidades-alvo continuaram sendo monitoradas ao longo de 2024 como medida preventiva. No entanto, ao longo de todo o período monitorado, não houve impactos sobre a integridade física das cavidades BG-05, LOC-0149, LOC-0150, LOC-0191, LOC-0192, LOC-0202, LOC-0217, LOC-219, LOC-0291, LOC- 0295 e SM-121. Dessa forma, tendo em vista os resultados alcançados, o monitoramento foi cessado devido ao término da vigência do DAIA, não havendo justificativa para sua manutenção.

Importante ressaltar que, no âmbito do Parecer n.º 35/FEAM/GST/2025, vinculado ao Projeto Longo Prazo (Processo SLA n.º 3858/2022), foi aprovada pela FEAM a implementação do Programa de Gestão Espeleológica do Complexo Germano. O referido programa definiu cavidades-alvo de monitoramento, representativas da totalidade do território abrangido pelos projetos em execução, contemplando as áreas da LOC, Descaracterização e Longo Prazo. Assim, o programa viabiliza o monitoramento sistemático e contínuo das condições morfodinâmicas e hidrogeológicas das cavidades suscetíveis a impactos potenciais oriundos das atividades operacionais da Samarco, garantindo o suporte para a gestão ambiental preventiva e mitigatória nestas áreas.

CONDICIONANTE 11 - MONITORAMENTO SISMOGRÁFICO

Redação original:

“Executar o monitoramento sismográfico com a instalação de sismógrafos nas cavidades BG-01, BG-05, LOC-0149 e SM-121. OBS: A metodologia a ser empregada é a descrita no âmbito da LOC n.º 020/2019 (Parecer Único n.º 0603993/2019, PA COPAM 00015/1984/107/2017).”

Histórico

O Monitoramento Sismográfico foi executado pela empresa BioEspeleo Consultoria Ambiental, em parceria com a SismoGeo Engenharia, nas cavidades BG-01, BG-05, LOC-0149 e SM-121 definidas em condicionante pela SEMAD para o Programa Descaracterização do Germano. A metodologia de execução do monitoramento é a descrita no âmbito da LOC n.º 020/2019 (Parecer Único n.º 0603993/2019, PA COPAM 00015/1984/107/2017).

Nas referidas cavidades foram instalados sismógrafos funcionando ininterruptamente, com o principal objetivo de verificar se a movimentação de máquinas e equipamentos – em decorrência das atividades do projeto – pode gerar algum tipo de risco à integridade física das cavidades. De acordo com a empresa responsável, os níveis de vibração registrados nas cavidades-alvo de monitoramento são relativamente baixos, sem representar risco à integridade física, confirmando a baixa magnitude dos níveis de vibração gerados por equipamentos móveis em mineração.

Em agosto de 2024, foi realizada pela BioEspeleo Consultoria Ambiental uma vistoria nos equipamentos instalados nas cavidades-alvo do estudo, atestando o monitoramento ativo

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

nos oito sismógrafos vistoriados. A figura 168 apresenta evidência de vistorias realizadas → equipamento (cavidade): A (BG-01), B (BG-05), E (LOC-0149) e H (SM-121).

Figura 168: Vistorias de Equipamentos Instalados – Cavidades BG-01, BG-05, LOC-0149 e SM-121



A Samarco realizou o monitoramento sismográfico em período integral e seguiu as premissas estabelecidas conforme programa aprovado.

No período analisado, os níveis de vibração registrados nas cavidades alvos foram baixos, não representando risco para a integridade física das feições. As vibrações apresentaram caráter majoritariamente transiente e baixa intensidade, com mais de 99,9% dos registros abaixo do limite sugerido pelo CECV, que é de 3 mm/s. Isso demonstra o baixo potencial dos equipamentos utilizados na obra para causar impactos nas cavidades, além de evidenciar a eficácia das medidas de controle adotadas para mitigar os efeitos das vibrações.

Cabe informar que, apesar de o DAIA do Processo n.º 09020000191/20 ter encerrado sua vigência em fevereiro de 2024, as cavidades-alvo continuaram sendo monitoradas ao longo de 2024 como medida preventiva. Ademais, ao longo de todo o período monitorado, não houve impactos sobre a integridade física das cavidades BG-01, BG-05, LOC-0149 e SM-

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



121. Além disso, as atividades do projeto que envolviam a região das cavidades BG-01 e BG-05 já foram concluídas e não há previsão de novas intervenções na área onde se encontram as cavidades LOC-0149 e SM-121, e o entorno dessas cavidades apresenta condições que restringem o acesso de máquinas e equipamentos, o que limita qualquer interferência futura nessas áreas.

Dessa forma, tendo em vista os resultados alcançados, o monitoramento foi cessado devido ao término da vigência do DAIA, não havendo justificativa para sua manutenção.

Importante destacar que as cavidades LOC-0149 e SM-121 estão incluídas no Subprograma de Monitoramento Sismográfico, integrante do Programa de Gestão Espeleológica do Projeto Longo Prazo, aprovado pela FEAM no âmbito do Processo SLA nº 3858/2022.

Contudo, na iminência de qualquer atividade que possa gerar impacto às cavidades, os sismógrafos serão reinstalados pontualmente nas cavidades próximas à atividade, conforme determinado pela condicionante 48 da LOC n.º 20/2019.

CONDICIONANTE 12 – MONITORAMENTO BIOESPELEOLÓGICO

Redação original:

“Ampliar a execução do programa de monitoramento bioespeleológico, definido como condicionante 56 da Licença de Operação Corretiva – LOC nº 020/2019 (Parecer Único nº 0603993/2019, PA COPAM 00015/1984/107/2017), para a cavidade LOC-0166.”

Histórico

A Condicionante 12 do DAIA para o Programa Descaracterização do Germano solicitou ampliar a execução do programa de monitoramento bioespeleológico, definido como Condicionante 56 da Licença de Operação Corretiva – LOC nº 020/2019 (Parecer Único nº 0603993/2019, PA COPAM 00015/1984/107/2017), apenas para a cavidade LOC-0166.

Para realização deste monitoramento, as campanhas e protocolos dos relatórios têm seguido periodicidade acordada com o órgão ambiental para a LOC, sendo esta anual, conforme estabelecido no programa ambiental validado pela SEMAD.

Em julho de 2023 foi realizado protocolo anual em atendimento parcial a esta condicionante, da mesma forma que nos anos anteriores, via Ofício SAM_G_0649_2023, Processo SEI 69398785, com respeito aos dados consolidados até a quarta campanha.

Em 15 de agosto de 2023 ocorreu a quinta campanha de monitoramento na cavidade LOC-0166. Os dados provenientes desta campanha constam no relatório entregue à Samarco em novembro de 2023. Os resultados indicam que esta cavidade e as demais monitoradas no âmbito da condicionante têm apresentado padrões condizentes com o esperado para a dinâmica natural.

A sexta campanha de monitoramento bioespeleológico foi realizada entre 15 de fevereiro e 9 de março de 2024, e a entrega do relatório à Samarco ocorreu em maio de 2024.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



A sétima campanha foi realizada entre 30 de outubro e 18 de novembro de 2024. Os dados coletados estão sendo analisados e serão apresentados no próximo relatório a ser entregue à Samarco. As observações indicam que as espécies estão conseguindo se manter na paisagem de estudo, ao considerar os dados de todas as cavidades em conjunto. Inclusive, algumas apresentaram aumento populacional.

A cavidade LOC-0166 foi a que apresentou maior abundância e maior frequência de morcegos ao longo de todo o monitoramento. Além disso, essa cavidade também registrou aumento na abundância de outras espécies-alvo, como Theridiidae sp (Araneae).

É importante ressaltar que, apesar de o DAIA do Processo n.º 09020000191/20 ter encerrado sua vigência em fevereiro de 2024, as cavidades-alvo continuaram sendo monitoradas ao longo de 2024 como medida preventiva. No entanto, ao longo de todo o período monitorado, não houve impactos sobre impactos sobre o meio biótico da cavidade LOC-0166. Dessa forma, tendo em vista os resultados alcançados, o monitoramento foi cessado devido ao término da vigência do DAIA, não havendo justificativa para sua manutenção.

Ademais, a LOC-0166 foi contemplada no Subprograma de Monitoramento Faunístico e de Condições Ambientais do Programa de Gestão Espeleológica aprovado pela FEAM no âmbito do Parecer nº 35/FEAM/GST/2025 do Projeto Longo Prazo em que foram definidas cavidades-alvo de monitoramento representativas de todo o território dos projetos atualmente em execução, confluindo assim as áreas da LOC, Descaracterização e Longo Prazo.

CONDICIONANTE 13 – PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE CAVIDADES

Redação original:

“Implementar o programa de sinalização das cavidades com instalação de placas: (iii) de sinalização e restrição de acessos as cavidades mais próximas da ADA e com aberturas visíveis, nos acessos e áreas de trânsito de trabalhadores;

(iv) instalação de placas nos arredores das cavidades que se encontram nas proximidades da ADA, sinalizando a distância a partir da qual o modo ‘compactação’ do rolo compactador deve ser desativado para trafegar.”

Histórico

Após a emissão do DAIA, a Samarco identificou os pontos estratégicos para implantação das placas indicativas de proibição de acesso às áreas das cavidades naturais subterrâneas, bem como de proibição de uso de rolo compactador nas proximidades.

A sinalização de restrição de acesso foi realizada em atendimento à Condicionante 13 do DAIA, apresentada no ofício GMA-G-311/2021. As placas de sinalização têm seu estado de conservação constantemente avaliado, sendo encaminhadas para reparos e manutenções em caso de necessidade. Na avaliação ocorrida no período, não foi identificada a necessidade de reparos nas placas instaladas para atendimento à referida condicionante.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 169: Sinalização – Identificação de Cavidade, Limite de Velocidade e Proibição de Uso de Rolo Compactador



Figura 170: Sinalização de Área de Proteção de Cavidades Naturais Subterrâneas – Acesso Restrito



12.3.2.2 Ref. Item 1.3 – Subitem II (b) – Informar As Ações Executadas Ações de Resgate da Fauna e da Flora na Área Afetadas, Se Couber

Ações de Afugentamento e Eventual Resgate de Fauna

O programa de afugentamento e eventual resgate de fauna foi realizado antes, e concomitante à etapa de supressão vegetal, visando à minimização de possíveis impactos diretos sobre a fauna. Seu objetivo principal foi o afugentamento da fauna local, preferencialmente de maneira espontânea, e o resgate, caso necessário, para áreas seguras e com suporte para o seu restabelecimento.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Os animais ocasionalmente resgatados foram direcionados a áreas de soltura previamente selecionadas, destinadas a garantir ambiente adequado às espécies e a devida distância das atividades operacionais – mantendo, portanto, a integridade dos animais realocados e de todos os prestadores de serviço potencialmente afetados.

A execução do programa nas áreas de descaracterização da Barragem contou com equipe composta de biólogos e auxiliares de campo, todos com experiência em atividades desta natureza. Além dos membros que atuaram diretamente em campo, a equipe contou com o apoio de médicos veterinários da Clínica Veterinária Inconfidentes, conveniada à Sete Soluções e Tecnologia Ambiental, para realizar atendimentos e procedimentos emergenciais aos espécimes, em caso de necessidade.

As atividades conduzidas pela empresa Sete Soluções e Tecnologia Ambiental foram previamente autorizadas através da AMF Nº SPP 05/2021 – Processo SEI 1370.01.0031357/2020-56.

No período, não houve necessidade de afugentamento e eventual resgate de fauna, uma vez que as atividades de supressão da vegetação foram finalizadas.

O relatório final considerando os dados consolidados e atribuídos ao Programa de Afugentamento e Eventual Resgate de Fauna foi protocolado em 02/02/2023, através do ofício GMA-G-0124/2023 e Recibo Eletrônico de Protocolo 60139104.

Resgate de Flora e Reintrodução

O Programa de Resgate de Flora tem o objetivo principal de promover a preservação e resguardar parte das espécies e da diversidade genética que integram a Área Diretamente Afetada (ADA) pelo Programa Descaracterização do Germano, visando a mitigar os impactos da retirada de vegetação nativa.

O resgate de flora na área de descaracterização da Barragem do Germano é realizado pela empresa Emflortec. As espécies resgatadas são encaminhadas ao Centro de Desenvolvimento Florestal, Social e Ambiental (CEDASF).

O CEDASF foi construído com o objetivo de produzir mudas oriundas de sementes resgatadas de áreas onde há intervenções no Complexo do Germano, além de reintroduzir todo o material vegetal coletado nos resgates de flora. Está localizado próximo à área de intervenção, no Distrito de Antônio Pereira (Vila Samarco), no município de Ouro Preto, evitando o transporte das mudas em longas distâncias, o que reduz o custo operacional, submete as plantas a menos estresse e aumenta a taxa de sobrevivência.

O viveiro é dotado de casa de sombra, áreas de pleno sol para aclimação de mudas, estufa para sementeiras e estrutura de tubetes suspensos para a produção de mudas florestais, área destinada a recuperação e pesquisa sobre resgate de plantas rupestres, sistema de irrigação por microaspersão e estruturas de apoio. Neste local são realizadas as atividades de triagem, beneficiamento, quebra de dormência e produção de mudas, além de servir como ponto de apoio para as equipes de resgate, sendo fundamental para o sucesso do programa.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 171: Vista Geral do Centro de Desenvolvimento Florestal, Social e Ambiental



Figura 172: Viveiro no Distrito de Antônio Pereira



Figura 173: Área de Expansão do Viveiro



Tendo em vista que o resgate de flora antecede a supressão vegetal, e que as atividades de supressão estão concluídas, não houve resgate de flora no período do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

12.3.2.3 Ref. Item 1.3 – Subitem II (c) – Deverão Ser Apresentadas As Ações para Controle de Supressão Vegetal e de Processos Erosivos na Área Afetada pelas Obras de Descaracterização, Bem Como Os Comprovantes de Regularização Ambiental da Atividade

Ações de Controle de Supressão Vegetal

O Programa de Acompanhamento de Supressão Vegetal tem como diretriz o Parecer Único de Intervenção Ambiental nº 09020000191/20. Para operacionalizar esta atividade, devem ser respeitados o manual, a *checklist* e o fluxograma de supressão vegetal em campo, elaborados pela equipe de Meio Ambiente da Samarco, conforme demonstrado na figura 174.

Figura 174: Fluxograma Operacional de Supressão Vegetal

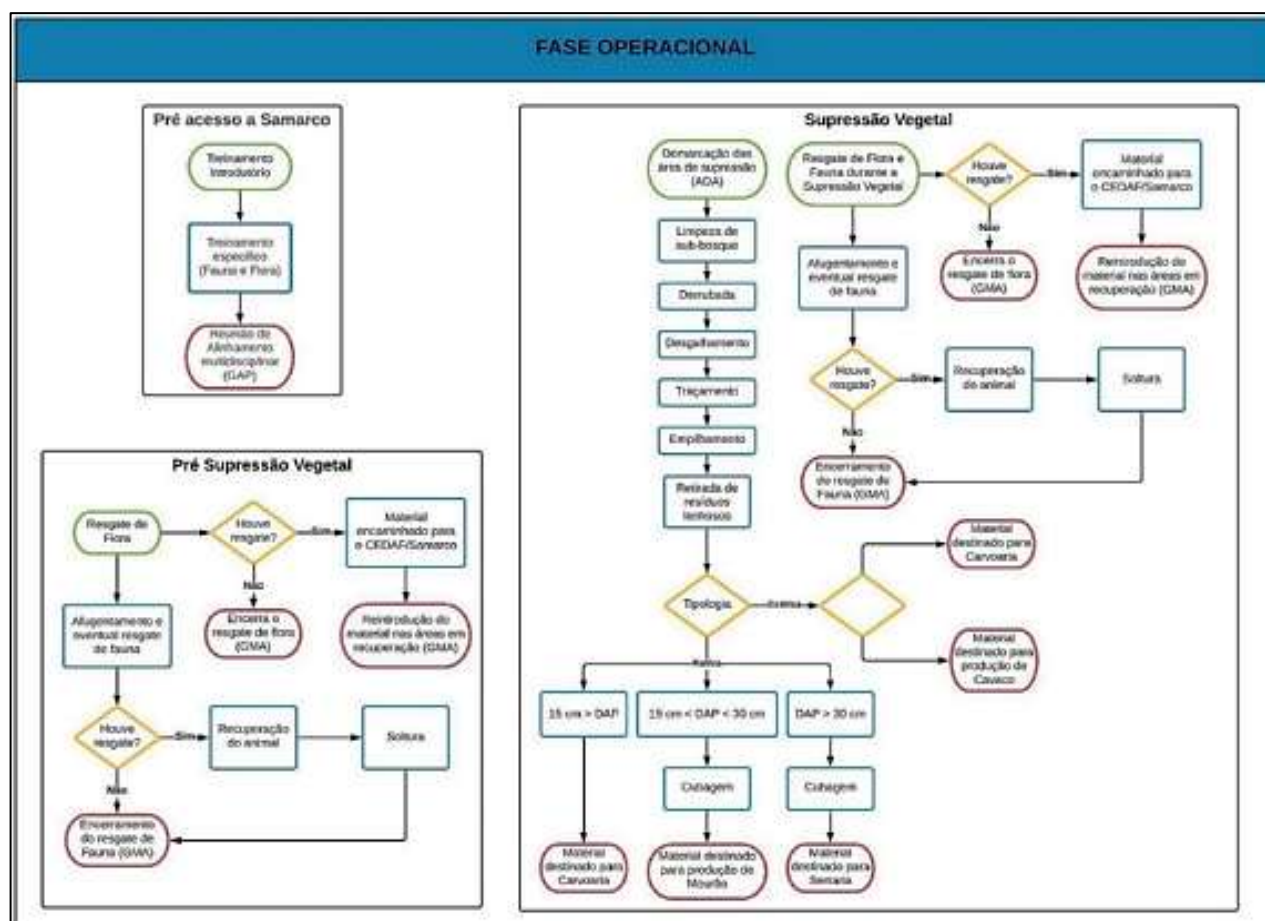

A supressão vegetal nas áreas afetadas pelo Programa Descaracterização do Germano foi finalizada, porém o processo para retirada e destinação das lenhas suprimidas continua em andamento, seguindo todas as diretrizes citadas.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Ações de Controle de Processos Erosivos

Para verificação de existência e/ou evolução de processos erosivos na descaracterização da Cava e Barragem do Germano são realizadas inspeções visuais pela Gerência de Meio Ambiente, bem como a revegetação de taludes. Tais ações de controle são divididas nos dois grupos que seguem.

- **Recomposição Vegetal**

Este tipo de revestimento tem como finalidade preservar as áreas expostas durante a obra, proporcionando maior resistência à erosão superficial causada pela ação das precipitações pluviais.

A estratégia de revegetação é definida conjuntamente pela equipe de Meio Ambiente da Samarco e pela empresa contratada para realizar a atividade. A correção de adubação do solo e o preparo do local são feitos após análise química e recomendação por parte de profissional tecnicamente capacitado.

As espécies escolhidas e a técnica aplicada ficam a cargo da empresa contratada, sempre respeitando as melhores práticas descritas na literatura.

Durante o período, foram realizadas a hidrossemeadura e a aplicação de biomanta em área total de 31.180,97m² nas regiões que integram o Projeto de Descaracterização da Barragem do Germano, conforme a seguir:

- 6065,07m² na região do pé do Pinheirinho;
- 153,65m² na área do contrapilhamento de Selinha; e
- 24.962,25m² na superfície do reservatório da Barragem (*regrade*).

As figuras 175 a 178 ilustram as atividades de manutenção (hidrossemeadura e biomanta) nas áreas da Barragem do Germano.

Figura 175: Aplicação de Biomanta (Região do Pinheirinho)



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 176: Aplicação de hidrossemeadura (Selinha)



Figura 177: Aplicação de Hidrossemeadura (Regrade)



Figura 178: Aplicação de Hidrossemeadura (Regrade)



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- **Inspecções visuais**

A empresa gerenciadora de Meio Ambiente realiza vistorias de áreas, que consistem de inspeções visuais. Quando algum desvio é identificado, este é informado às equipes de Geotecnia, Meio Ambiente e Obras para tomar as providências necessárias e pertinentes.

Nas áreas plantadas são feitas avaliações de germinação das sementes, bem como acompanhamento regular do desenvolvimento vegetativo através de inspeções em campo.

A partir das avaliações são realizadas as manutenções eventualmente necessárias, como combate a formigas cortadeiras, aplicação de adubo de cobertura, intensificação da irrigação e reaplicação da hidrossemeadura em pontos falhos, conforme ilustrado nas figuras 179 a 181.

Figura 179: Avaliação de Campo da Recomposição na região de Sela Tulipa



Figura 180: Avaliação de Campo da Recomposição em Selinha



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 181: Avaliação de Campo da Recomposição em Selinha



- 12.3.2.4 Ref. Item 1.3 – Subitem II (d) – Deverão Ser Apresentadas As Medidas Adotadas para Acompanhamento e Controle dos Índices de Qualidade do Ar na Área Afetada pelas Obras de Descaracterização

Monitoramento de Fumaça Preta

Realizado conforme descrito na instrução técnica interna da Samarco, e apresentado no subitem 5.2.3.3 – Emissões Atmosféricas do presente relatório.

Monitoramento da Qualidade do Ar

Devido ao porte e ao tipo das atividades realizadas nos projetos do Programa Descaracterização do Germano, é necessário acompanhar os efeitos das emissões, manifestados na alteração da qualidade do ar da atmosfera na região.

Ao estabelecer ponto de monitoramento, os principais aspectos considerados são: (i) as emissões atmosféricas provenientes das operações do empreendimento; (ii) as condições meteorológicas na região, em especial o regime de ventos; bem como (iii) os locais que apresentam condições minimamente adequadas ao monitoramento.

O local mais interessante para monitorar a qualidade do ar foi determinado com base na proximidade entre as fontes emissoras do empreendimento e as comunidades, e nas concentrações finais de poluentes resultantes da modelagem de dispersão atmosférica da região.

Assim, o monitoramento é realizado nas áreas vizinhas à Samarco, através da estação automática da qualidade do ar localizada no Distrito de Santa Rita Durão, no município de Mariana. O monitoramento automático possibilita o acompanhamento contínuo dos níveis de poluentes atmosféricos – especificamente, materiais particulados – decorrentes das

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



emissões oriundas das principais atividades desenvolvidas no Complexo do Germano, associadas ao regime de ventos da região.

Figura 182: Estação Automática de Monitoramento da Samarco em Santa Rita Durão



Figura 183: Vista da Estação de Monitoramento em Santa Rita Durão



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 184: Detalhes dos Equipamentos da Estação de Monitoramento em Santa Rita Durão



Tabela 45: Especificação de Equipamentos da Estação de Monitoramento em Santa Rita Durão

Parâmetro Monitorado	Método de Medição	Equipamento Utilizado
Partículas Inaláveis (< 2,5 µm) - MP _{2,5}	Absorção de raios beta	Analizador Met One BAM 1020
Partículas Inaláveis (< 10 µm) - MP ₁₀	Absorção de raios beta	Analizador Met One BAM 1020
Partículas Totais em Suspensão - PTS	Absorção de raios beta	Analizador Met One BAM 1020
Velocidade Escalar do Vento - VV	Anemômetro de conchas	Sensor Met One 034B
Direção Escalar do Vento - DV	Biruta com pá alanceada	
Temperatura do Ar - TA	Termistor	Sensor Met One 085-35
Umidade Relativa do Ar - UR	Capacitor variável	
Precipitação Pluviométrica - PP	Pluviômetro de gangorra	Sensor Met One 370
Pressão Atmosférica - PA	sensor piezoresistivo	Sensor Met One 092
Radiação Solar - RS	Termopilha	Sensor Met One 096

Nota: instalação dos sensores meteorológicos de TA, UR, PP, PA e RS na estação realizada no dia 21/09/2021.

Fonte: Relatório Técnico – RTC22053 Ecosoft

Medições de Material Particulado

Os parâmetros avaliados neste relatório foram: Partículas Inaláveis (< 2,5µm) – MP2,5; Partículas Inaláveis (< 10µm) – MP10; e Partículas Totais em Suspensão – PTS.

No período, as concentrações médias diárias monitoradas na estação de Santa Rita Durão atenderam aos padrões de qualidade do ar vigentes, considerando: padrão intermediário PI-2 (a partir de janeiro de 2025) para MP2,5 e MP10, e padrão final para PTS, conforme a

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Resolução CONAMA nº 506/2024. As concentrações médias diárias do poluente PTS monitorados atenderam ao padrão final de qualidade do ar ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Os resultados dos monitoramentos realizados no período são apresentados a seguir.

Gráfico 41: Médias Diárias MP2,5 – Fonte: Ambion



Gráfico 42: Médias Diárias MP10 – Fonte: Ambion




Gráfico 43: Médias Diárias PTS – Fonte: Ambion




PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

O gráfico 46 apresenta a precipitação pluviométrica registrada na estação para o período, com total acumulado igual a 318,00mm.

Gráfico 46: Acumulados Diários (Precipitação Pluviométrica) – Fonte: Ambion



Controle de Velocidade dos Equipamentos e Veículos

Os limites de velocidade adotados no Complexo do Germano buscam minimizar a emissão de material particulado, bem como atender aos requisitos de saúde e segurança. Cada limite é indicado com sinalização específica em todos os acessos internos. A velocidade máxima de 40km/h é estabelecida como padrão nas vias não-pavimentadas.

Figura 185: Placa Indicativa de Velocidade Máxima de 20km/h em Via Não-Pavimentada



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL N°14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 186: Placa Indicativa de Velocidade Máxima de 40km/h em Via Não-Pavimentada



Umectação

A umectação de vias e acessos serve para controlar as emissões atmosféricas no Complexo do Germano. Esta atividade é realizada utilizando caminhões-pipa nas rotas definidas pela Gerência de Meio Ambiente da Samarco.

As medidas de controle aplicadas dependem diretamente das condições meteorológicas, sabendo que a precipitação pluviométrica também atenua o potencial de emissões atmosféricas provenientes das atividades desenvolvidas.

Figura 187 Rotograma de Umectações de Vias de Acesso



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 188: Umectação de Vias das Obras da Barragem do Germano



Figura 189: Umectação de Vias nas Áreas de Canteiros da Barragem do Germano



Figura 190: Umectação de Vias na região da Barragem do Germano (Pinheirinho)



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 191: Umectação de Vias do Canteiro da Ápia - Barragem do Germano



Figura 192: Abastecimento do Caminhão Pipa no Apanhador da Selinha



A figura 193 apresenta o rotograma dos acessos principais da Barragem do Germano, estabelecido para umectação utilizando polímero.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



12.3.3 Ref. Item 1.3 – III – Apresentar Os Resultados de Avaliação da Qualidade da Água no Atual Estágio das Obras de Descaracterização

12.3.3.1 Monitoramento de Qualidade de Águas Superficiais

A Samarco realiza análises físico-químicas que evidenciam as condições momentâneas de qualidade em amostras de águas coletadas. Primeiramente, os dados são comparados aos limites estabelecidos na legislação ambiental, e posteriormente comparados entre si, ajudando a estabelecer relações de causa e efeito para os resultados obtidos.

Os resultados das amostras de águas superficiais foram comparados aos limites estabelecidos pela Deliberação Normativa Conjunta Nº 8 do COPAM/CERH, de 21 de novembro de 2022 para águas Classe 2.

O sistema de tratamento na vertente do córrego Santarém é constituído de três estruturas em cascata, assim descritas:

- 1) Ponto de controle a jusante do Barragem Eixo 1;
- 2) Ponto de controle a jusante da Nova Barragem de Santarém;
- 3) Ponto de controle a jusante do Dique S3.

Os pontos de monitoramento hídrico referentes aos projetos de descaracterização são os definidos como 'S3' e 'Jusante Eixo 1'.

A qualidade da água é monitorada no ponto 'S3', localizado após a terceira estrutura e fora da Área Diretamente Afetada (ADA), conforme indicado na figura 194. A garantia da qualidade da água é exigida neste ponto de controle.

Figura 194: Pontos Monitoramento - Qualidade de Água Superficial - Vertente do Córrego Santarém



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Todos os parâmetros avaliados na dinâmica físico-química das águas superficiais associadas atendem à legislação ambiental. Os registros de valores de turbidez na saída do dique S3 demonstram que os controles de sedimentação e clarificação vêm sendo efetivos.

Principais parâmetros avaliados no período:

- *pH*: não houve desvios no período
- *Cor da água*: não foram observadas não-conformidades no período
- *Condutividade elétrica*: os resultados obtidos indicaram águas pouco mineralizadas
- *Sólidos suspensos*: não foram observadas não-conformidades no período
- *Sólidos dissolvidos*: todos os valores observados atenderam ao limite legal
- *Turbidez*: não foram observadas não-conformidades no período
- *Cloreto*: os valores observados estão em conformidade com a legislação ambiental
- *Demanda bioquímica de oxigênio (DBO)*: apresentou resultados adequados
- *Demanda química de oxigênio (DQO)*: apresentou resultados adequados
- *Oxigênio dissolvido*: os resultados indicam que as águas amostradas são oxigenadas, favorecendo o desenvolvimento das comunidades aquáticas
- *Fósforo*: não foram observadas não-conformidades no período
- *Ferro*: os resultados atenderam ao limite legal
- *Óleos e graxas*: em conformidade com a legislação ambiental
- *Fenóis*: houve desvio no período em decorrência de decomposição da matéria orgânica (plantas, folhas, matérias e outros resíduos orgânicos)
- *Organismos patogênicos*: não foram observadas não-conformidades no período
- *Elementos-traço analisados no período*: arsênio, cianeto livre, cobre, mercúrio e zinco apresentaram resultados adequados
- *Acidez*: valores registrados considerados 'baixos'. Este parâmetro não é limitado pela legislação ambiental.
- *Dureza*: amostras classificadas como 'brandas' em todas as campanhas
- *Nitrogênio amoniacal*: apresentou baixos teores, atendendo à legislação
- *Nitrato*: todos os resultados conformes
- *Nitrito*: todos os resultados conformes
- *Nitrogênio total*: todos os resultados conformes
- *Íons sulfato e sulfeto*: concentrações registradas consideradas 'baixas'

12.3.4 Ref. Item 1.3 – IV – Para Obras em Estágio de Finalização, Apresentar As Medidas Adotadas para O Manejo e A Proteção do Solo, dos Recursos Hídricos, para Garantir A Estabilidade Geotécnica da Área Descaracterizada e A Metodologia Aplicada para Recomposição da Cobertura Vegetal

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



12.3.4.1 Metodologia de Revegetação

As atividades de revegetação foram estruturadas de acordo com o Plano Geral de Revegetação da Samarco. Este plano indica as ações que devem ser realizadas nas áreas que necessitem de recuperação, para que retornem o mais próximo possível às suas características originais.

Além de recuperar as áreas impactadas, as ações do plano servem para controlar processos erosivos e auxiliar na manutenção de cursos hídricos, atuando na conservação e contribuindo para o aumento da biodiversidade local.

Metodologias e técnicas adotadas na recomposição vegetal:

Análise de Solo

De acordo com a instrução normativa nº 2 de outubro de 2008 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o solo é classificado como tipo 2, caracterizado como argiloso (teor de argila entre 15 e 35%). Apresenta baixa fertilidade dos macronutrientes (fósforo, cálcio, magnésio e potássio) e dos micronutrientes (boro, cobre, zinco e manganês), baixo teor de matéria orgânica, baixo valor de soma de bases, bem como a susceptibilidade a processos erosivos.

Acerto e Regularização do Terreno

É desejável que a superfície do talude esteja o mais regularizada possível, para que as biomantas possam ficar totalmente aderidas. Acerto e regularização podem ser feitos manualmente ou mecanicamente, buscando eliminar os sulcos erosivos, preencher os espaços vazios e ancorar os sedimentos soltos. As concavidades do terreno e as negatividades dos taludes devem ser removidas ou minimizadas para evitar a formação de novos focos erosivos, desmoronamentos e escorregamentos.

O retaludamento mecânico foi realizado por parte da Samarco. Após a regularização da superfície do talude, foi implementado sistema de drenagem constituído de vertedouro, canaletas dissipadoras e leiras para escoamento da água pluvial.

Preparo do Terreno

Nos taludes de corte e aterro, o preparo do solo foi realizado por micro-coveamento, ou seja, covas pequenas próximas umas das outras com profundidade suficiente, de maneira a reter todos os insumos aplicados – fertilizantes, corretivos, *mulch*, adesivos e sementes.

Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins

Estabilização ou eliminação de formigas cortadeiras e cupins existentes nas áreas destinadas ao projeto e nas proximidades, utilizando isca formicida à base de sulfuramida.

Hidrossemeadura

Técnica utilizada nos trabalhos de revegetação e recuperação ambiental, cujo principal objetivo é proteger o solo dos efeitos erosivos e das suas consequências.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Nota: Devido às dimensões da área plana da Barragem e da Cava de Germano, foi necessário deixar faixas de acesso com aproximadamente 5 metros de largura sem realizar o plantio. Esta medida foi necessária para permitir o trânsito do caminhão-pipa nesses trechos e irrigar as áreas adjacentes.

Mix de Sementes

Para a recuperação de uma área, é necessário garantir o sucesso da germinação e do desenvolvimento da vegetação – que dependem, fundamentalmente, da qualidade das sementes. O poder germinativo, o grau de pureza e o vigor inicial são requisitos essenciais que devem ser observados na aquisição de sementes.

Os insumos utilizados na preparação do *mix* de sementes nas áreas da Cava do Germano estão descritos na tabela 46:

Tabela 46: Mix de Sementes e Insumos para Hidrossemeadura

Tipo x Consumo		Insumos para Hidrossemeadura kg/ha	
<i>Brachiaria humidicola</i>	40 kg/ha	Fertilizante orgânico	6 m³
Capim mombaça - <i>Panicum maximum</i> Jacq.	40 kg/ha	Adubo plantio NPK 08-28-16 + m	600 kg
Aveia preta - <i>Avena strigosa</i> Schreb.	70 kg/ha	Calcário dolomítico	1500 kg
Milheto - <i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R.Br.	20 kg/ha	Formicida	5 kg
Capim gordura - <i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv.	30 kg/ha	Adubo de cobertura NPK 20-05-20 ou sulfato de amônio	200 kg 100 kg
<i>Brachiaria ruziziensis</i> R.Germ & Evrard	30 kg/ha	Fixador/Adesivo	40 kg
Apaga fogo - <i>Alternanthera tenella</i> Colla	20 kg/ha	Mulch Bagaço de cana de açúcar	1200 kg
<i>Brachiaria decumbens</i>	20 kg/ha	Mulch Fibra de celulose	2000 kg
Nabo forrageiro - <i>Raphanus sativus</i> L.	5 kg/ha		
Feijão guandu - <i>Cajanus Cajan</i> (L.) Huth	25 kg/ha		
<i>Crotalaria spectabilis</i> Röth	50 kg/ha		
Feijão de porco - <i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.	10 kg/ha		
Azevém - <i>Lolium multiflorum</i>	70 kg/ha		
Grama batatais (<i>Paspalum notatum</i>)	20 kg/ha		
Grama bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	20 kg/ha		
Pé de galinha (<i>Eleusine indica</i>)	20 kg/ha		
Aveia (Avena sativa)	30 kg/ha		
Estilosantes (<i>Stylosanthes guianensis</i>)	15 kg/ha		

Biomanta Antierosiva

Produto integralmente constituído (100%) por fibras vegetais biodegradáveis, entrelaçadas com rede de fios resistentes degradáveis de polipropileno, utilizando costura longitudinal por processo industrial com espaçamento de 5cm entre os fios e de 6cm entre os pontos, formando trama que confere resistência e qualidade. O produto acabado é enrolado em bobina e embalado em filme plástico. A fixação da manta é efetuada com grampos que podem ser de aço, até mesmo de madeira ou bambu, considerando 4 grampos/m². O grampeamento nos transpasses deve ter espaçamento mínimo de 30cm.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Monitoramento e Manutenção Ambiental

A manutenção das áreas consiste do reforço da revegetação em locais onde o recobrimento do solo não esteja satisfatório. Isso é fundamental para favorecer a recuperação de ambientes alterados, alcançando a estabilização para que o próprio meio auxilie a retomada dos processos ecológicos.

Ressemeio

Consiste de nova realização da atividade de hidrossemeadura, porém com quantidade inferior de insumos.

As áreas semeadas devem ser inspecionadas durante 60 dias após o plantio, com o objetivo de verificar a existência de falhas, ou seja, identificar pontos onde a cobertura vegetal não se desenvolveu e o substrato se encontra exposto. Nos locais que apresentam falhas deve ser feito o ressemeio, utilizando as mesmas espécies citadas na tabela 46, na proporção da área considerada inadequada.

Adubação de Cobertura

A adubação deve ser realizada homogeneamente, evitando maior concentração do sulfato de amônio em determinados locais. A alta concentração pode prejudicar o crescimento das plantas e, caso seja carregada aos cursos d'água, pode aumentar excessivamente os nutrientes nela existentes.

Irrigação

Atividade que deve ser realizada em período de estiagem, ou quando percebida a ausência de precipitação por uma semana durante os três primeiros meses após o plantio. A irrigação deve ser na proporção de 7 litros de água por metro quadrado, dia sim e dia não, exigindo caminhão com capacidade para 10 mil litros.

12.3.5 Ref. Item 1.3 – V – Apresentar As Medidas Mitigadoras e Emergenciais Adotadas Visando A Continuidade do Abastecimento Público A Jusante da Barragem até A Zona de Autossalvamento – ZAS e Zona de Segurança Secundárias – ZSS, Caso Exista Captação de Água À Jusante da Estrutura

O atendimento a este item está contemplado no Anexo 7.2 – Plano de Abastecimento de Água Barragem Germano – Instrução Técnica 01-2021 GMG_CEDEC, documento integrante do Plano de Ações de Emergências de Barragem de Mineração (PAEBM) da Samarco, disponibilizado na pasta “Anexo VII – Meio Ambiente” do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



13. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ANDAMENTO DAS OBRAS

Para atendimento integral ao Item 1.3, subitem XIII do Termo de Referência da FEAM.

13.1 Descaracterização da Barragem do Germano

13.1.1 Canal Drenagem Principal da Barragem do Germano



Foto 1: Emboque e Setores 1 / 2 do Canal Principal Em Operação(Obras Concluídas)

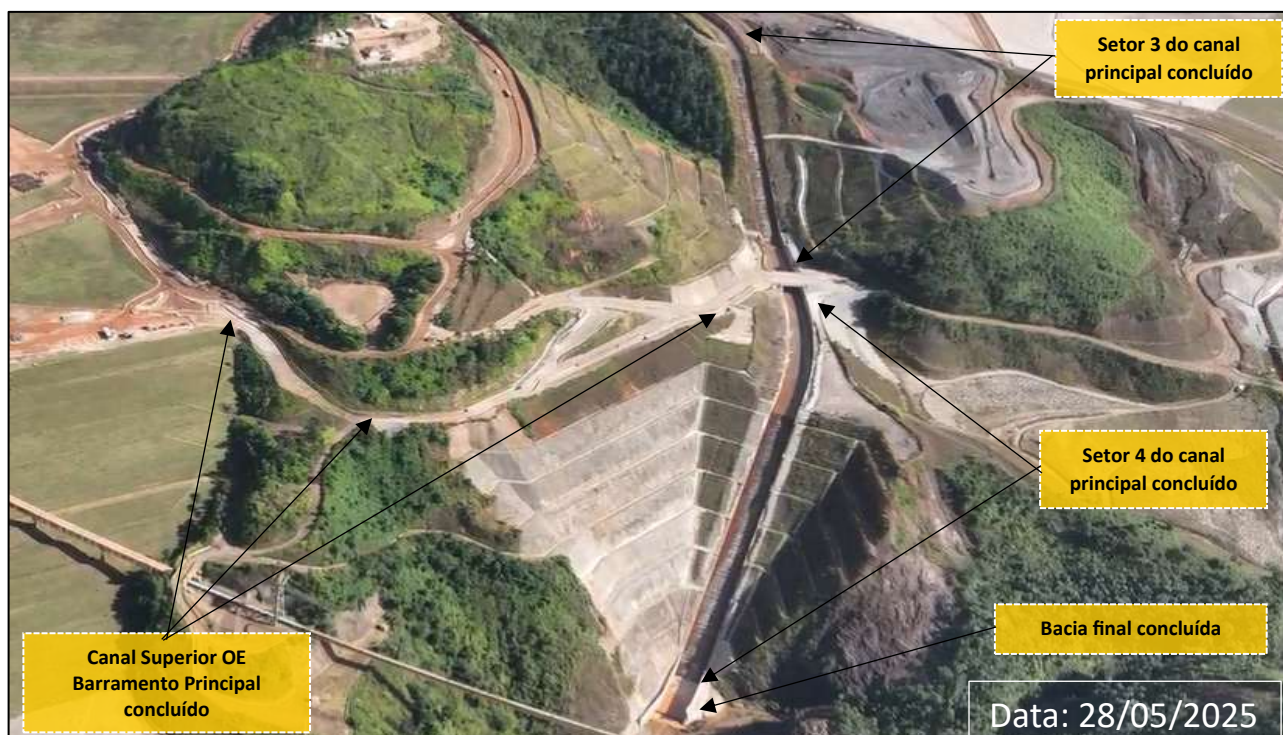


Foto 2: Vista dos Setores 3 / 4 e Bacia Final do Canal Principal Em Operação (Obras Concluídas)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Foto 3: Vista da Bacia Final do Canal Principal Em Operação (Obras Concluídas)

13.1.2 Berma de Reforço do Barramento Principal

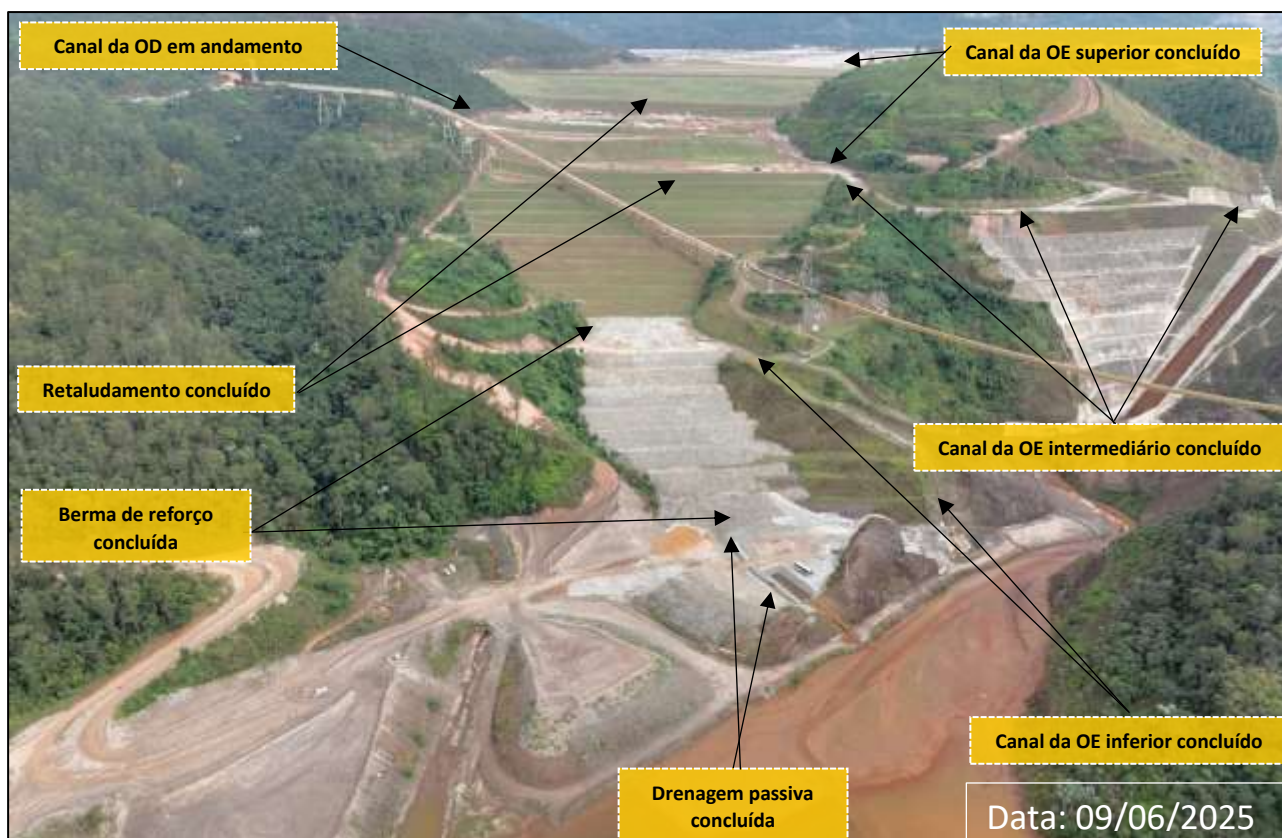


Foto 4: Vista da Berma de Reforço do Barramento Principal (Obras Concluídas)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



13.1.3 Barragem Eixo 1 e Vale do Fundão a montante do Eixo 1



Foto 5: Vista da Barragem Eixo 1 – Obras de Preenchimento e Drenagem Superficial Concluídas

13.1.4 Vale do Fundão em Selinha



Foto 6: Vista das Obras do Vale do Fundão a Montante da Barreira 3 e Seção AA Concluídas

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



13.1.5 Descaracterização do Dique Sela Tulipa e Dique Selinha



Foto 7: Regiões a Montante do Barramento Principal e dos Diques de Sela Tulipa e Selinha (Obras Concluídas)

13.1.6 Regrade – Regiões do Pinheirinho e Ferrovia



Foto 8: Regiões do Pinheirinho e Ferrovia (Obras do Canal de Drenagem Definitivo em Andamento)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



13.1.7 Regrade – Regiões a Montante do Barramento Principal e dos Diques Sela Tulipa/Selinha

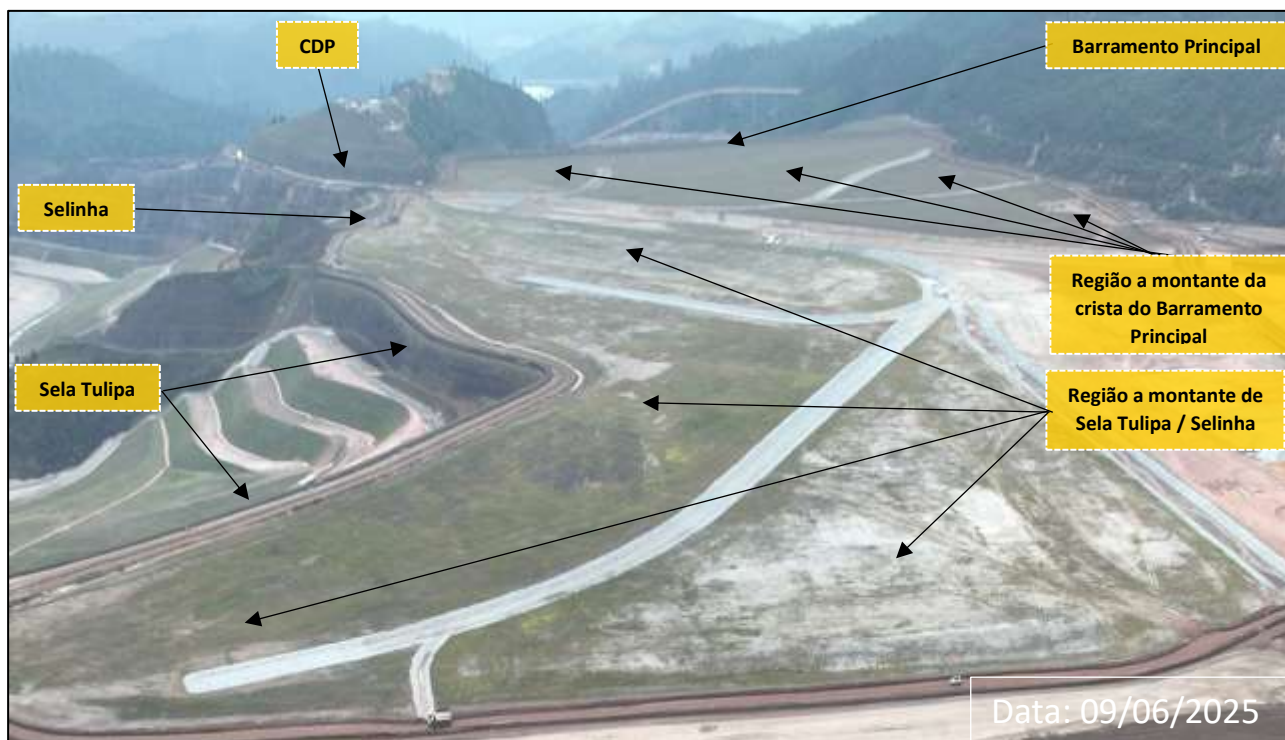


Foto 9: Regiões a Montante do Barramento Principal e dos Diques de Sela Tulipa / Selinha (Obras Concluídas)

13.1.8 Regrade – Região do Dique Auxiliar

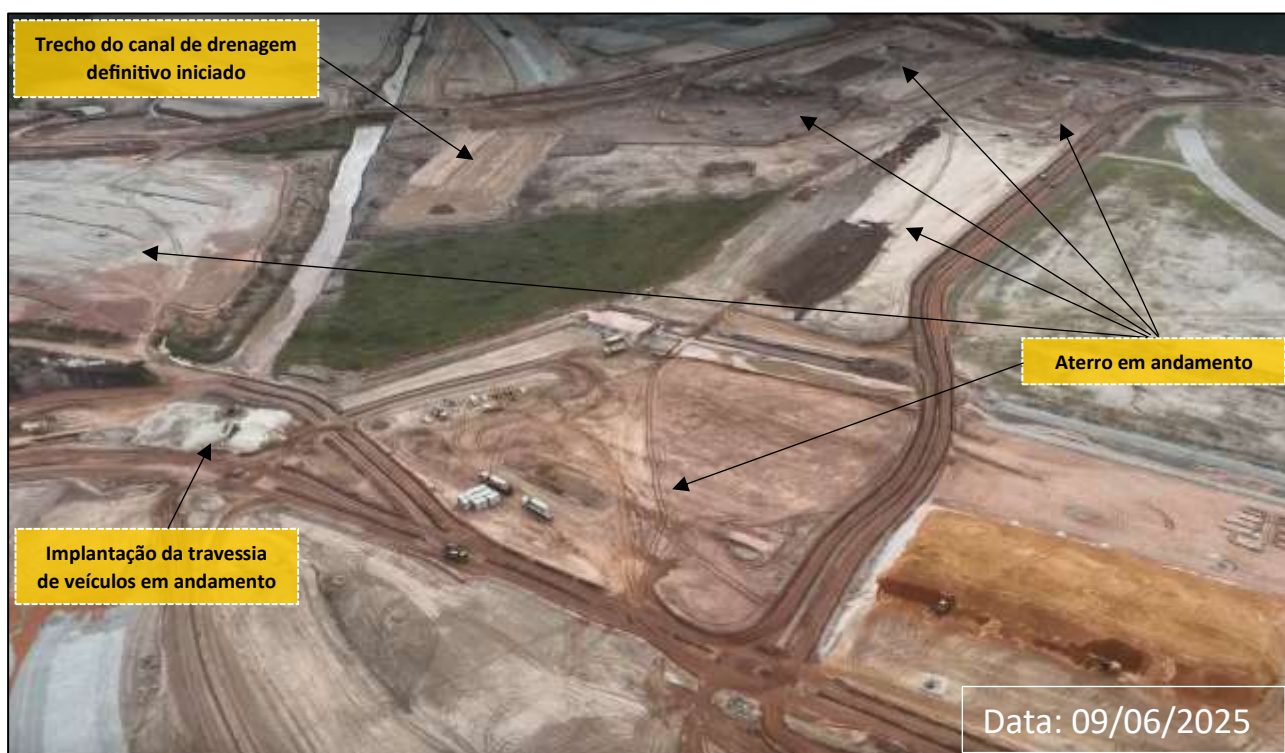


Foto 10: Região do Dique Auxiliar (Obras em Andamento)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



13.1.9 Regrade – Região da Baía 3



Foto 11: Região da Baía 3 (Obras de Aterro e Canal de Drenagem Definitivo em Andamento)

13.2 Descaracterização da Cava do Germano

13.2.1 Obras do Marco de Descaracterização da Cava – Vista Geral

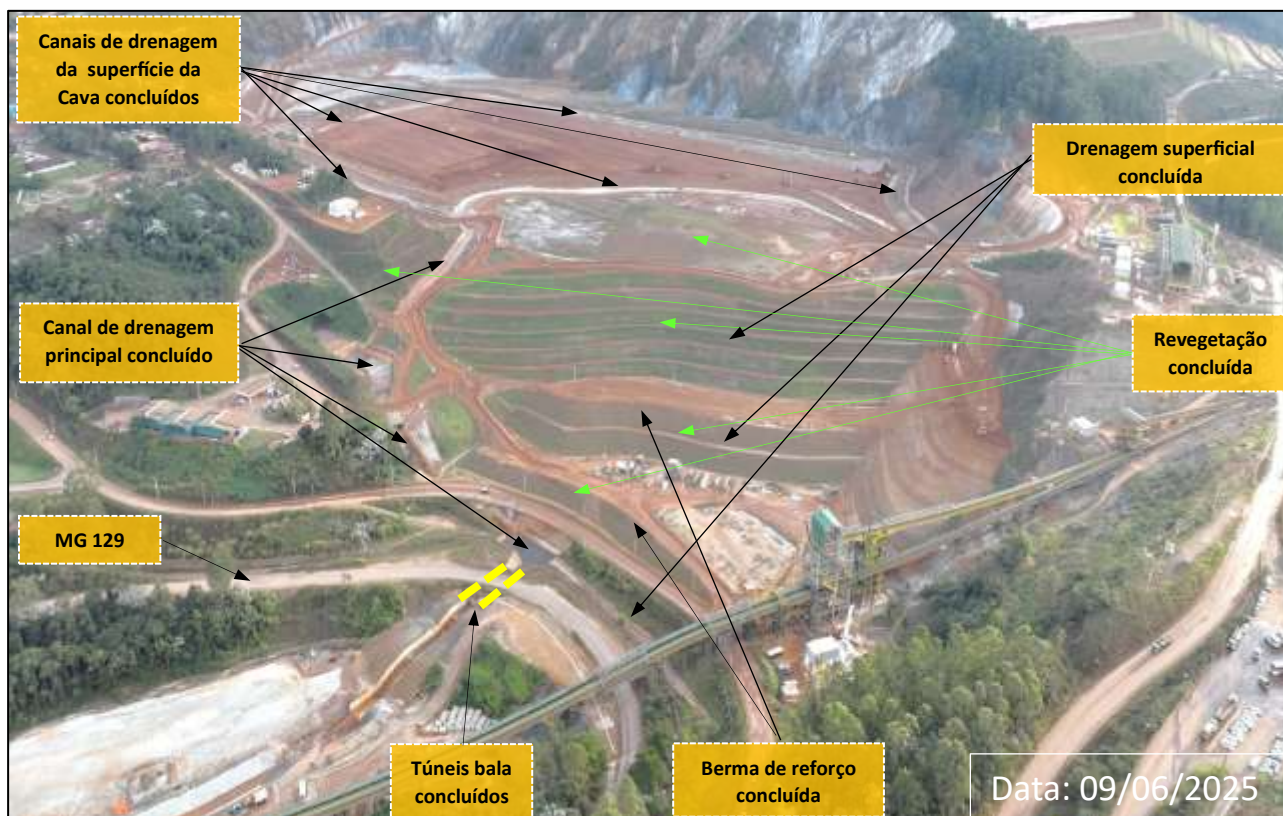


Foto 12: Berma de Reforço, Canal Principal, Drenagens Superficiais e Proteção Vegetal (Obras Concluídas)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



14.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Cronograma de Descaracterização da Barragem e Cava do Germano – Status de atualização em 23/06/2024 – Anexo III do presente Relatório.

Termo de Referência para Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método a Montante no Estado de Minas Gerais emitido pela FEAM - Encaminhado à Samarco em 03 de fevereiro de 2020, via ofício FEAM/NUBAR Nº 21/2020.

Termo de Compromisso de Descaracterização - Assinado em 25 de fevereiro de 2022, entre a Samarco, o Estado de Minas Gerais (representado pela SEMAD e FEAM), o Ministério Público Estadual e Federal e interveniência da ANM.

Termo de Referência do Governo do Estado de Minas Gerais (representado pela SEMAD e FEAM), encaminhado através do ofício FEAM/GERAM nº 484/22 em 25 de novembro de 2022.

Recomendações das Notas Técnicas da AECOM, emitidas em 17/01/2023, 10/10/2023, 15/12/2023, 02/08/2024, 31/01/2025 e 11/04/2025, encaminhadas pela FEAM via ofícios NUBAR 238/2023, GBM 1073/2023, GBM 125/2024, GBM 561/2024, GBM 95/2025 e GBM 401/2025, respectivamente.

Lei Federal nº 12.334/2010: Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000.

Lei Federal nº 14.066/2020: Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração).

Minas Gerais - Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019 - Institui a política estadual de segurança de barragens.

Minas Gerais - Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº 2.784, de 21 de março 2019 - Determina a descaracterização de todas as barragens de contenção de rejeitos e resíduos, alteadas pelo método a montante, provenientes de atividades minerárias, existentes em Minas Gerais e dá outras providências.

Decreto nº 48.140/2021 - Regulamenta dispositivos da Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens, estabelece medidas para aplicação do art. 29 da Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, e dá outras providências.

Resolução ANM nº 95 - Consolida os atos normativos que dispõem sobre segurança de barragens de mineração, 7 de fevereiro de 2022.

Resolução ANM nº 130 - Altera a Resolução ANM nº 95, de 7 de fevereiro de 2022, e dá outras providências, 24 de fevereiro de 2023.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15. APÊNDICES

15.1 APÊNDICE I – Descaracterização do Dique Sela Tulipa (Histórico)

15.1.1 Objetivo do Apêndice I

Informar detalhadamente sobre a etapa de obras de descaracterização, bem como o andamento da etapa de monitoramento ativo do Dique Sela Tulipa, estrutura geotécnica alteada a montante associada ao reservatório da Barragem do Germano, a fim de garantir a estabilidade de longo prazo, bem como a reconformação final do seu reservatório (*regrade*) e a recuperação ambiental da área.

15.1.2 Contextualização

O Dique Sela Tulipa está situado no flanco nordeste do reservatório da Barragem do Germano, no extremo oeste do Vale do Fundão. Sua implantação foi iniciada em 1995, em decorrência do alteamento do Barramento Principal até a elevação 894,0m, e em função da existência de duas selas topográficas de mesmo nome.

Com a elevação do nível dos rejeitos no interior do reservatório da Barragem do Germano, foram executados três alteamentos na área do Dique Sela Tulipa, além do fechamento de uma nova sela topográfica com a implantação do Dique Selinha em 2006. O Dique Sela Tulipa, assim como o Dique Selinha, estabeleceram a separação entre os vales do córrego Germano e do córrego Fundão, tendo a montante o reservatório da Barragem do Germano.

A estrutura possui extensão de 774,0m, com crista de largura 14,0m na elevação 917,5m, formada por três zonas principais: o núcleo a montante, o dreno central e o espaldar de jusante.

O ponto de partida da porção esquerda do Dique Sela Tulipa, antes chamado de “Sela”, foi projetado pela empresa Figueiredo Ferraz, com crista na elevação 890,0m e seção homogênea em aterro compactado. Posteriormente, a estrutura “Sela” recebeu outros quatro alteamentos, projetados pela Pimenta de Ávila Consultoria, entre os anos de 1996 e 2011. Em 2013, o alteamento final foi projetado pela LPS Consultoria em 2 fases: Fase 1 até a elevação 917,0m e Fase 2 até a elevação 920,0m. A construção da Fase 2 não foi implantada e o último alteamento foi realizado com solo reforçado até a elevação 917,0m, acima da crista do barramento, sobre camada espessa de “oversize”.

Já o ponto de partida da porção direita do Dique Sela Tulipa, antes chamado de “Tulipa”, foi projetado pela Pimenta de Ávila Consultoria e implantado entre os anos de 1999 e 2001 durante o alteamento para montante da porção de “Sela”, para preenchimento de uma depressão de sela adjacente, com uma ombreira comum entre “Sela” e “Tulipa”. A estrutura de partida de “Tulipa” foi apoiada em terreno natural, em seção homogênea de solo compactado. Posteriormente, “Tulipa” recebeu três alteamentos.

Após o colapso de Fundão, a BVP Engenharia elaborou o Projeto de Reforço do Dique Sela Tulipa, realizando também o Acompanhamento Técnico de Obra (ATO). O projeto de reforço foi dividido e executado em 3 fases, entre abril de 2016 e setembro de 2017, a saber:

- Fase 1: Reforço da ombreira comum e adequação/construção de novo sistema extravasor;

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Fase 2: Execução de um maciço de enrocamento (denominado berma de proteção) para contenção dos rejeitos remanescentes na base do Dique Sela Tulipa;
- Fase 3: Regularização e estabilização dos rejeitos remanescentes entre a elevação da crista da berma de proteção (aproximadamente na elevação 850,0m) e a base do Dique Sela Tulipa (entre as elevações 867,0m e 868,0m).

Visando ao atendimento de fator de segurança mínimo exigido pela Resolução Nº 4 da ANM publicada em 18 de fevereiro de 2019 ($FS \geq 1,3$ para análise não-drenada), a BVP Engenharia elaborou a 4ª fase do Projeto de Estabilização do Dique Sela Tulipa. Nesse sentido, foi implantado aterro constituído de rejeito arenoso seco compactado mecanicamente, com coroamento na elevação 890,0m, junto à ombreira comum, abrangendo todo o maciço a jusante da estrutura.

Ao final da implantação do referido reforço, a avaliação de estabilidade das principais seções geológico-geotécnicas indicou condição satisfatória em relação ao critério de aceitabilidade preconizado pela Resolução Nº 4 da ANM (posteriormente revogada e substituída pela Resolução Nº 13 da ANM).

O projeto de descaracterização do Dique Sela Tulipa tem como cenário de partida o preenchimento do Vale do Fundão ao final do ano de 2019.

Resumidamente, o cenário compreende:

- Barragem Eixo 1 implantada com crista na elevação 820,3m e reservatório na elevação 817,0m;
- Preenchimento da região entre a enseadeira e a Barragem Eixo 1, utilizando rejeito arenoso disposto mecanicamente até a elevação 809,0m;
- Contrapilhamento do Vale do Fundão implantado até a elevação 840,0m na região do Dique Sela Tulipa e elevação 836,0m na região do Dique Selinha com rejeito arenoso disposto mecanicamente;
- ADME removida;
- Reforços do Dique Sela Tulipa e do Dique Selinha (Fase 4) implantados; trata-se dos reforços efetuados para o atendimento ao FS mínimo de 1,3 para o cenário de análise não-drenada, conforme descrito anteriormente (iniciado e concluído em 2019).

Atualmente, as obras de descaracterização do Dique Sela Tulipa encontram-se finalizadas. A jusante da estrutura, as obras da berma de reforço da estrutura foram concluídas em 10/10/24 (ver atividade 5442A6110). A drenagem superficial e proteção vegetal foram terminadas em 31/12/24. A Montante da estrutura, as obras do regrade foram concluídas em 16/01/25.

A *Punch List* da drenagem superficial e serviços de proteção vegetal foi finalizada em 15/02/25. Com isso, a Samarco empenhou todos os esforços requeridos e concluiu as obras de descaracterização desta estrutura que integra o sistema do reservatório da Barragem do Germano antecipadamente em relação à respectiva previsão de conclusão (06/03/25) que consta no Termo de Compromisso.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Ademais, a Samarco protocolou em janeiro de 2025, junto à FEAM, o relatório de conclusão das obras de descaracterização do Dique Sela Tulipa.

15.1.3 Identificação

- 15.1.3.1 Nome da Barragem e da Mina, Conforme Bancos de Dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e da Agência Nacional de Mineração – ANM, Quando Couber (Item 1.1 – Subitem I do TR da FEAM)

Tabela 47: Identificação do Dique Sela Tulipa

Nome da Estrutura	Dique Sela Tulipa (Barragem do Germano)
Mina	Mina do Germano

- 15.1.3.2 Coordenadas Geográficas do Ponto Central da Barragem Antes do Início das Obras de Descaracterização, Referenciadas no Datum SIRGAS-2000 (Item 1.1 – Subitem II do TR da FEAM)

O Dique Sela Tulipa é uma estrutura associada do reservatório da Barragem do Germano e está situado na Mina do Germano, ou “Complexo do Germano”. As coordenadas geográficas da estrutura indicam o ponto central da crista da barragem, antes do início das obras de descaracterização, referenciadas no Datum SIRGAS-2000 do cadastro SIGBM, conforme a tabela 48.

Tabela 48: Coordenadas do Dique Sela Tulipa

Latitude	-20°21'65.000"
Longitude	-43°46'79.444"

A localização e o acesso do Complexo do Germano são apresentados no Capítulo 3, item 3.3 do presente relatório. O acesso ao Dique Sela Tulipa pode ser realizado a partir da portaria da Barragem do Germano, localizada na margem direita da rodovia MG-129, sentido Mariana para Catas Altas. Da portaria, o Dique Sela Tulipa pode ser acessado por vias internas da Samarco conforme indicado na figura 195.

Figura 195: Mapa de Localização e acesso ao Dique Sela Tulipa no Complexo do Germano



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.1.3.3 Matriz de Classificação, com Base nos Critérios Estabelecidos nos Anexos I a IV do Decreto 48.140, de 25 de Fevereiro de 2021 (Item 1.1 – Subitem III do TR da FEAM)

A matriz de classificação do Dique Sela Tulipa, apresentada na tabela 49, foi reavaliada pelas auditorias de inspeção, monitoramento da instrumentação e análise de segurança realizadas no período e mantida conforme a última avaliação realizada pela projetista BVP em 10/03/2025 e aprovada em 24/03/2025, em conformidade com a legislação pertinente (Decreto Estadual 48.140 de 25 de fevereiro de 2021).

Tabela 49: Matriz de Classificação do Dique Sela Tulipa

Categoria de Risco - Resultado Da Avaliação: Baixo	
Resultado da Pontuação Total do CRI do Dique Sela Tulipa = 20 → Referência: CRI ≤ 37	
Potencial de Dano Ambiental - Resultado Da Avaliação: Alto	
Resultado da Pontuação Total do PDA do Dique Sela Tulipa = 26 → Referência: PDA ≥ 13	
Características Técnicas (CT) - Resultado Da Avaliação: $\sum CT = 20$	
Altura Atual (a)	31,50m máximo → Altura > 60m (7)
Comprimento (b)	815m → Comprimento > 600m (3)
Vazão de Projeto (c)	CMP (Cheia Máxima Provável) ou Decamilar (0)
Método Construtivo (d)	Alteamento a montante ou desconhecido (10)
Auscultação (e)	Existe instrumentação de acordo com o projeto técnico (0)
Estado de Conservação (EC) - Resultado Da Avaliação: $\sum EC = 0$	
Confiabilidade das Estruturas Extravasoras (f)	Estruturas civis bem mantidas e em operação normal / barragem sem necessidade de estruturas extravasoras (0)
Percolação (g)	Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem (0)
Deformações e Recalques (h)	Não existem deformações e recalques com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (0)
Deterioração dos Taludes / Paramentos (i)	Falhas proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva (0)
Plano de Segurança da Barragem (PSB) - Resultado Da Avaliação: $\sum PS = 0$	
Documentação de Projeto (j)	Projeto executivo e "como construído" (0)
Estrutura Organizacional e Qualificação dos Profissionais na Equipe de Segurança da Barragem (k)	Possui unidade administrativa com profissional técnico qualificado responsável pela segurança da barragem (0)
Manuais de Procedimentos para Inspeções de Segurança e Monitoramento (l)	Possui manuais de procedimentos para inspeção, monitoramento e operação (0)
Plano de Ação Emergencial - PAE (quando exigido pelo órgão fiscalizador) (m)	Possui PAE (0)
Relatórios de inspeção e monitoramento da instrumentação e de Análise de Segurança (n)	Emite regularmente relatórios de inspeção e monitoramento com base na instrumentação e de Análise de Segurança (0)
Potencial de Dano Ambiental (PDA) - Resultado Da Avaliação: $\sum PDA = 26$	
Volume Total do Reservatório (a)	129,6 milhões m ³ → Muito Grande ≥ 50 milhões m ³ (5)
Existência de população a jusante (b)	EXISTENTE (Existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem; portanto, vidas humanas poderão ser atingidas) (10)
Impacto ambiental (c)	SIGNIFICATIVO (Área afetada a jusante da barragem apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, excluídas APPs, e armazena apenas resíduos inertes (Classe II B segundo a NBR 10.004 da ABNT) (6)
Impacto socioeconômico (d)	ALTO (Existe alta concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância socioeconômica e cultural na área afetada a jusante da barragem) (5)
Enquadramento - Resultado Da Avaliação: Classe B	
Categoria de Risco	Baixo
Potencial de Dano Ambiental	Alto

15.1.3.4 Identificação do Empreendimento com Respectiva Razão Social, CNPJ, Endereço, Nome e Telefone do Representante Legal para Contato (Item 1.1 – Subitem IV do TR da FEAM)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 50: Identificação do Empreendimento – Dique Sela Tulipa

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	
Nome da estrutura	DIQUE SELA TULIPA
Finalidade	O Dique Sela Tulipa teve a finalidade de garantir o armazenamento dos rejeitos depositados no reservatório da Barragem de Germano. Atualmente, a Barragem do Germano e suas estruturas associadas estão em processo de descaracterização.
Empreendedor	Samarco Mineração S.A, Em Recuperação Judicial
CNPJ	16.628.281/0003-23
Endereço Mina do Germano	Rodovia MG-129 s/n, Zona Rural - Mariana / MG - CEP: 35420-970
Endereço Sede Administrativa	Ed. das Américas, Rua Paraíba, 1.122 - Andares 9º, 19º e 23º - Funcionários Belo Horizonte/MG CEP 30.130-141
Telefone Sede Administrativa	(31) 3559-5000
Diretoria	Gerência de Geotecnia
Complexo	Germano
Mina	Germano
Município	Mariana
Estado	Minas Gerais
Tipo de Minério	Ferro

15.1.3.5 Identificação do Empreendedor com Respectiva Razão Social, CNPJ, Endereço, Nome e Telefone do Representante Legal para Contato (Item 1.1 – Subitem V do TR da FEAM)

Tabela 51: Identificação do Empreendedor do Dique Sela Tulipa

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR	
Razão Social	Samarco Mineração S.A, Em Recuperação Judicial
CNPJ	16.628.281/0003-23
Endereço Sede Administrativa	Rua Paraíba, 1.122 - Andares 9º, 19º e 23º - Funcionários Belo Horizonte/MG CEP 30.130-141
Endereço Mina do Germano	Rodovia MG-129 s/n, Zona Rural - Mariana/MG CEP 35.420-970
Representante legal	Rodrigo Alvarenga Vilela
Formação	Engenheiro Metalurgista
CREA	27157-D BA
Cargo	Diretor Presidente
Telefone	(31) 3269-8808 / (31) 3269-8787
E-mail	rodrigo.vilela@samarco.com

15.1.3.6 Identificação do Responsável Técnico pela Barragem, com Formação Profissional, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido, Endereço do Correio Eletrônico, e Telefone para Contato (Item 1.1 – Subitem VI do TR da FEAM)

A identificação do responsável técnico pelo Dique Sela Tulipa, sua formação, cargo, responsabilidades, nº de registro em conselho de classe e endereço de correio eletrônico são apresentados na tabela 52.

Tabela 52: Responsável Técnico pelo Dique Sela Tulipa

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE BARRAGEM DO EMPREENDEDOR	
Nome	Ernesto Tadeu Bossi
Formação	Engenheiro Civil
Cargo	Gerente Geral de Geotecnia
Responsabilidades	Gerente geral responsável pelas operações/estruturas geotécnicas do Complexo do Germano
CREA	87931/D MG
RNP	1400165911
Telefone	(31) 3269-8683
E-mail	ernesto.bossi@samarco.com

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Obs.: A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com a atribuição do responsável técnico do Dique Sela Tulipa consta na pasta “Anexo I – ARTs_Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

15.1.3.7 Identificação da Equipe Técnica Responsável pelos Projetos de Descaracterização (Nome Completo, Formação Acadêmica, Áreas sob Sua Responsabilidade no Estudo, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido). A Anotação de Responsabilidade Técnica Deverá Ser Apresentada no Anexo I (Item 1.1 – Subitem VII do TR da FEAM)

A identificação da equipe técnica, com nome completo, formação, áreas sob sua responsabilidade no estudo e nº do registro em conselho de classe é apresentada a seguir nas tabelas 53 (Projetista) e 54 (Samarco).

Tabela 53: Equipe Técnica dos Projetistas Responsável Pelos Projetos de Descaracterização do Dique Sela Tulipa

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO - PROJETISTA BVP	
Razão social	BVP Engenharia e Projetos Ltda.
CNPJ	04.723.774/0001-00
Endereço	Rua Tomé de Souza 616 – Savassi Belo Horizonte/MG - CEP 30.140-131
Registro CREA (Empresa)	38070-MG
Responsável Técnico - Projeto	Paulo Roberto Costa Cella
Formação	Mestrado - EESC-USP Mestre em Engenharia - Área de Concentração: Geotecnia. Doutorado - E. Politécnica - USP: Doutor em Engenharia - Área de Concentração: Engenharia Mineral.
Responsabilidade no projeto	(1) Pareceres geológico-geotécnicos utilizados para as análises de estabilidade. Estruturas do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e Eixo 1. (2) Consultoria Geotécnica Barragem do Germano
CREA (Profissional)	06.0.0600697382 – RNP 2613925922
ART Cava e Barragem Germano	(1) 14201900000005153888 (2) MG20242931282

Obs.: As Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos de descaracterização do Dique Sela Tulipa constam na pasta “Anexo I – ARTs_Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

Tabela 54: Equipe Técnica da Samarco Responsável Pelo Acompanhamento dos Projetos de Descaracterização do Dique Sela Tulipa

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO - SAMARCO	
Nome	Alexandre Ângelo do Carmo Luiz da Silva
Formação	Engenheiro Ambiental e Mestre em recursos hídricos
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos hidrológicos e hidráulicos.
CREA	MG0000174587/D – RNP 1412886864
Nome	Anelisa Vasconcelos
Formação	Engenheira Civil e Mestre em geotecnia
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos geotécnicos.
CREA	MG0000091141/D – RNP 1400665574
Nome	José Bernardo Vasconcelos Rodrigues Oliveira
Formação	Engenheiro Civil e Mestre em geotecnia
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos geotécnicos.
CREA	MG0000065519/D
Nome	Lucas Samuel Santos Brasil
Formação	Engenheiro Civil e Mestre em recursos hídricos
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos hidrológicos e hidráulicos.
CREA	MG0000 85104/D

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.1.3.8 Identificação da Equipe Técnica Responsável pela Execução e/ou Acompanhamento da Obra de Descaracterização (Nome Completo, Formação Acadêmica, Áreas sob Sua Responsabilidade no Estudo, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido). A Anotação de Responsabilidade Técnica Deverá Ser Apresentada no Anexo I (Item 1.1 – Subitem VIII do TR da FEAM)

A identificação da equipe técnica, com nome completo, formação, áreas sob sua responsabilidade no estudo e nº do registro em conselho de classe é apresentada nas tabelas 55 (Samarco), 56 e 57 (Contratadas).

Tabela 55: Responsável Técnico (Samarco) Pelas Obras de Descaracterização do Dique Sela Tulipa

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO GERAL PELA EXECUÇÃO - SAMARCO	
Razão social	Samarco Mineração S/A, em Recuperação Judicial
Responsável Técnico - Obra	Eduardo Moreira Rodrigues
Formação	Engenheiro Civil
Cargo	Gerente Geral de Projetos e Retomada (GGPR)
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Exec. de obra / serviços / mineração / pilha de estéril. (2) Complementar – Aditivo de prazo.
CREA	MG04.0.0000072262/D – RNP 1408981297
ART	(3) 14202000000006351149 (4) MG20232390149

Tabela 56 : Responsáveis Técnicos (Contratadas) Pelas Obras de Descaracterização do Dique Sela Tulipa

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DESCARACTERIZAÇÃO – 2ª FASE DIQUE SELA TULIPA - CONTRATO 4300000595	
Razão social	Consórcio MRF
CNPJ	32.909.546/0001-56
Endereço	Rua Nossa Senhora de Lourdes, 262 - SI 01 - Olhos D'Água Belo Horizonte/MG CEP 30.390-530
Registro CREA (Empresa)	49483MG e 81683NAC
Responsável Técnico - Obra	Anderson Henrique Andrade Rigobello
Formação	Engenheiro de Produção
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de produção (atividades da área de engenharia de produção) gestão da produção para a Descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e Preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000284672/D – RNP 1419976990
ART	(1) MG 20221116308
Responsável Técnico - Obra	Antônio Carlos Pereira Vieira Júnior
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000087976/D – RNP 1400173396
ART	(1) MG 20221105288
Responsável Técnico - Obra	Leonardo Guimarães Mendes
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem, compactação, escavação, aterro) e obras de construção civil (materiais para construção civil: aplicação de concreto) para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000058753/D – RNP 1403078645
ART	(1) MG 20221079330

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Responsável Técnico - Obra	Marcus Veloso da Silveira Cassini
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) (2) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000080345/D – RNP 1403250111
ART	(1) MG 20221105295 (2) MG20253638617
Responsável Técnico - Obra	Matheus Mata Machado Ferreira de Siqueira
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000195065/D – RNP 1414611790
ART	(1) MG 20221136218
Responsável Técnico - Obra	William Perdigo Frade
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal - Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000006485/D – RNP 1409140350
ART	(1) MG 20221097378
Responsável Técnico - Obra	Diego Fernandes Pontes
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	DF0000014988D/MG – RNP 0704727889
ART	(1) MG20253638523
Responsável Técnico - Obra	Henrique César Rodrigues de Alvarenga
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	0400000066648MG – RNP 1403171033
ART	(1) MG20253638592
Responsável Técnico - Obra	Lucas Sobrinho Lauro
Formação	Engenheiro de Segurança do Trabalho
Responsabilidade na Obra	(1) Gestão de Segurança do Trabalho para as obras de descaracterização
CREA	MG0000142675D MG – RNP 1409973107
ART	(1) MG20253618999
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA DESCARACTERIZAÇÃO DO REGRADE A MONTANTE DE SELA TULIPA (REGRADINHO) - CONTRATO 4300001308	
Razão social	Construtora Apia S/A
CNPJ	17.155.391/0001-16
Endereço	Rua Tito Simões, 99 - Pilar Belo Horizonte/MG CEP 30.390-100
Registro CREA (Empresa)	36141-MG

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Responsável Técnico - Obra	Eduardo Menin Ferreira
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), de obras de concreto armado, de concretagens, de obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem) para obras civis do <i>Regrade</i> da superfície do reservatório da Barragem.
CREA	0400000048207MG– 1403794510
ART	(1) MG20253617797
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA DESCARACTERIZAÇÃO DO REGRADE A MONTANTE DE SELA TULIPA (REGRADINHO) - CONTRATO 4300001042	
Razão social	Consórcio Rio Doce (CRD)
CNPJ	41.668.789/0001-30
Endereço	Rua Helvio Moreira Moraes, nº 27, Sala 06, CEP: 35429-000
Registro CREA (Empresa)	966959-MG
Responsável Técnico - Obra	Pedro Júnior Vieira Rabbi
Formação	Engenheiro de Produção
Responsabilidade na Obra	(1) Gestão e planejamento de produção para as obras civis do <i>Regrade</i> da superfície do reservatório da Barragem – porção em Sela Tulipa.
CREA	284477DMG – 1419969307
ART	(1) MG20243123011
Responsável Técnico - Obra	Anderson Otoni Gomes
Formação	Engenheiro de Produção Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem e compactação), de obras de concreto armado, de concretagens, de obras hidráulicas e recursos hídricos (sistemas de drenagem) para obras civis do <i>Regrade</i> da superfície do reservatório da Barragem – porção em Sela Tulipa
CREA	0000098328/DMG – 1404839399
ART	(1) MG20243123104

Tabela 57 : Responsável Técnico pela Revegetação nas Áreas de Sela Tulipa

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA / RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REVEGETAÇÃO	
CONTRATO 4300000880	
Razão social	JM Reflorestamentos e Serviços Ltda.
CNPJ	08.011.784/0001-65
Endereço	Rua Joaquim Pacífico, 120 – Centro Santa Barbara/MG CEP 35.960-000
Registro CREA (Empresa)	19252-MG
Responsável Técnico - Obra	César Simões Soares
Formação	Engenheiro Florestal
Responsabilidade na Obra	(1) Gestão ambiental para a revegetação de Sela Tulipa.
CREA	MG0000108032/D – RNP 1406493775
ART	(1) MG20243540839

Obs.: As Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de todos os responsáveis técnicos envolvidos na execução das obras de descaracterização do Dique Sela Tulipa constam na pasta “Anexo I – ARTs_Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

15.1.4 Projeto de Descaracterização – Dique Sela Tulipa

15.1.4.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao Item 1.2, subitens I a IV do Termo de Referência da FEAM.

15.1.4.2 Descrever Sucintamente a Concepção do Projeto Adotada para Descaracterização da Barragem (Item 1.2 – Subitem I do TR)

Os projetos de descaracterização do Dique Sela Tulipa foram desenvolvidos pela projetista BVP em atendimento a Lei Estadual nº 23.291, publicada em fevereiro de 2019, visando à

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



estabilidade geotécnica da estrutura e à adoção de medidas para reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais e subterrâneas para o reservatório associado ao Dique Sela Tulipa, no longo prazo.

Considerando a estabilidade geotécnica de longo prazo, foi prevista a implantação de berma de reforço nos taludes de jusante da estrutura. Os projetos de descaracterização do Dique Sela Tulipa preveem o preenchimento do Vale do Fundão a jusante desta estrutura. O reforço no referido dique apresenta como estrutura de partida a região a montante da Barragem Eixo 1 preenchida. Como referência, o volume aproximado da berma de reforço e preenchimento a jusante de Sela Tulipa (obras concluídas) é de 861.512 m³.

Em relação à passagem de cheias, também visando ao longo prazo, o projeto de descaracterização prevê a implantação de sistema de canais de drenagem profunda e na superfície final do Dique Sela Tulipa, com a função de conduzir os fluxos captados na bacia de contribuição situada a montante desta estrutura, reduzindo o processo de infiltração para o interior dos depósitos e eliminando a formação de lago permanente.

15.1.4.3 Informar Todas as Alterações de Projetos Ocorridas no Período de Avaliação do Relatório de Acompanhamento, com Respectivas Justificativas (Item 1.2 – Subitem II do TR)

As informações referentes às alterações de projetos ocorridas no período de avaliação são apresentadas no Capítulo 4, Item 4.3 do presente relatório.

15.1.4.4 Caso as Obras de Descaracterização Ainda Não Tenham Sido Iniciadas, Informar as Ações e Obras Preparatórias Realizadas no Período, Tais Como: Realização de Estudos, Aquisição de Equipamentos, Construção de Estruturas de Contenção a Jusante, por Exemplo (Item 1.2 – Subitem III)

- *O cronograma atualizado de projeto e início efetivo da descaracterização deverá ser apresentado (Item 1.2 – Subitem III).*

Este item não se aplica (N/A) ao Projeto de Descaracterização do Dique Sela Tulipa, uma vez que as obras estão finalizadas.

15.1.4.5 Descrever e Informar os Riscos Geológicos Geotécnicos Associados, Especificamente, a Implantação do Projeto de Descaracterização (Item 1.2 – Subitem IV).

As informações referentes aos riscos geológicos e geotécnicos associados, especificamente, à implantação do Projeto de Descaracterização, são apresentadas no Capítulo 4, Item 4.5 do presente relatório.

15.1.5 Obras de Descaracterização – Dique Sela Tulipa

15.1.5.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao Item 1.3, subitens I a XIV do Termo de Referência da FEAM.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

15.1.5.2 Memorial Descritivo das Obras de Descaracterização da Barragem, Contendo os Seguintes Dados e Informações e Representações Gráficas em Escala Adequada (Item 1.3 – Subitem I do TR)

15.1.5.2.1 Memorial Descritivo e Desenhos das Estruturas Implantadas, Removidas ou Modificadas, ou Informações Equivalentes, Bem Como Dispositivos de Proteção Ambiental (Item 1.3 – Subitem I-a do TR)

Este item apresenta o descritivo das obras de descaracterização realizadas no do Dique Sela Tulipa, com foco nas estruturas implantadas, incluindo evidências do estágio atual da construção e dos dispositivos de proteção ambiental.

Memorial Descritivo – Sela Tulipa

O Programa Descaracterização do Germano previu o reforço da estrutura do Dique Sela Tulipa, o preenchimento do Vale do Fundão e o sistema de drenagem superficial associado, incluindo a Barragem Eixo 1. Estas obras podem ser identificadas na figura 196.

As obras de aterro compactado, de descaracterização desta estrutura (rejeito arenoso e estéril), do coroamento do contrapilamento, de reconformação do reservatório (*regradinho*) a montante da estrutura e o sistema de drenagem superficial associado estão concluídas.

Figura 196: Identificação das Obras do Programa Descaracterização (Sela Tulipa)



A figura 197 exibe uma vista das obras na região do Dique Sela Tulipa.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 197: Região de Sela Tulipa – Obras Concluídas



15.1.5.3 Memorial Descritivo e *Layout* das Soluções Geotécnicas Empregadas Durante as Obras, Incluindo a Necessidade de Esgotamento da Água Acumulada no Interior da Barragem e, caso haja, da Infraestrutura de Apoio das Frentes de Obras (Item 1.3 – Subitem I-b do TR)

As soluções geotécnicas empregadas nas obras do Programa Descaracterização do Germano também se aplicam ao Dique Sela Tulipa.

Essencialmente, a descaracterização de Sela Tulipa consiste de implantação de berma de reforço a jusante da estrutura; reconformação da superfície final (*regrade*) no reservatório situado a montante da estrutura através da implantação de superfícies inclinadas, com caimentos direcionados a canais de drenagem especialmente dimensionados para evitar acúmulo permanente de água no reservatório; e, finalmente, implantação dos respectivos canais de drenagem, dimensionados para verter as cheias decorrentes da Precipitação Máxima Provável (PMP).

Tendo em vista o longo prazo demandado para a implantação das obras de descaracterização do Dique Sela Tulipa, e também a necessidade de adoção de ações efetivas que garantiram a segurança da estrutura frente às temporadas chuvosas nos vários anos de obras, a Samarco concebeu um plano de chuvas para aplicação nos períodos chuvosos. A última versão do plano atualizado para o período entre outubro de 2024 e março de 2025 considera o sistema de drenagem superficial de Sela Tulipa finalizado e operável. O memorial descritivo é apresentado no Capítulo 5, subitem 5.2.1.3 do presente relatório e o referido plano é apresentado no Anexo 7.1 — Sistema de Drenagem _ Plano de Chuvas 24_25_AECOM na pasta “Anexo VII — Meio Ambiente”.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 198: Anexo 7.1 - Plano de Chuvas 2023-2024

Anexo 7.1-Sistema de Drenagem_Plano de Chuvas_24_25_AECOM

Em síntese, as obras de descaracterização do Dique Sela Tulipa encontram-se finalizadas. A jusante da estrutura, as obras da berma de reforço da estrutura foram concluídas em 10/10/24 (ver atividade 5442A6110). A drenagem superficial e proteção vegetal foram encerradas em 31/12/24. A Montante da estrutura, as obras do regrade foram concluídas em 16/01/25. A *Punch List* da drenagem superficial e serviços de proteção vegetal foi finalizada em 15/02/25.

15.1.5.4 Descrição das Estruturas e Layout dos Sistemas de Controle Ambiental dos Efluentes Líquidos, Emissões Atmosféricas e Resíduos Sólidos Gerados no Canteiro de Obras e Infraestrutura de Apoio das Frentes de Obras (Item 1.3 – Subitem I-c do TR)

A descrição das estruturas e *layout* dos sistemas de controle ambiental dos efluentes líquidos, emissões atmosféricas, resíduos sólidos gerados no canteiro de obras e infraestrutura de apoio das frentes de obras são apresentados no Capítulo 5, subitem 5.2.3 do presente relatório.

15.1.5.5 Descrição das Ações de Movimentação de Terra, Incluindo Localização e Caracterização das Áreas de Empréstimo e Bota-Fora Utilizadas (Item 1.3 – Subitem I-d do TR)

A descrição das ações de movimentação de terra, incluindo localização e caracterização das áreas de empréstimo e bota-fora utilizadas, são apresentadas no Capítulo 5, subitem 5.2.4 do presente relatório.

15.1.5.6 Apresentar Levantamentos Topográficos e Batimétricos, Quando Couber, da Barragem no Estado Atual das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem II do TR)

Levantamentos Topográficos

Os levantamentos do estado atual do empreendimento estão contemplados no Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico Obras Descaracterização Germano na pasta “Anexo IV – Execução” do presente relatório.

Figura 199: Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico

Anexo 4.1-Levant. Topografico Obras Descaract. Germano_Jun_25

Levantamentos Batimétricos

Este item não se aplica, pois no Complexo do Germano o curso d'água é superficial (não há reservatórios); assim sendo, não é possível realizar levantamentos batimétricos no Dique Sela Tulipa, incluindo o respectivo *regrade* a montante da estrutura.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.1.5.7 No Caso de Remoção do Maciço e do Reservatório, Apresentar as Medidas Adotadas Para a Execução Deste Procedimento e Um Quantitativo dos Materiais Retirados (Item 1.3 – Subitem III do TR)

Este item não se aplica, pois o Projeto de Descaracterização não prevê remoção dos maciços das estruturas, nem dos seus respectivos reservatórios.

15.1.5.8 Apresentar as Medidas Adotadas Para a Redução do Nível do Lençol Freático no Reservatório, Quando Couber, Bem Como Informar o Seu Nível no Estágio Atual das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem IV do TR)

As referidas medidas são apresentadas no Capítulo 5, subitem 5.2.7 do presente relatório.

15.1.5.9 Apresentar Análises de Estabilidade nas Condições Drenada e Não-Drenada, e Levando em Consideração as Solicitações Sísmicas Que Possam Atuar Sobre a Estrutura, Avaliando as Resistências de Pico e Residual Para a Geometria da Barragem na Atual Etapa da Obra (Item 1.3 – Subitem V do TR)

Nota: Os Fatores de Segurança mínimos a serem atendidos são de 1,5 para rupturas drenadas; 1,5 para rupturas não-drenadas na situação de pico, e 1,1 na situação residual. Ressalta-se que estes valores poderão ser revisados conforme as diretrizes técnicas emanadas de órgãos regulamentadores competentes.

As análises de estabilidade no período estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT525_R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT526_R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT527_R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 4 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 200: Recomendação 4 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

04	Apresentar os relatórios contemplando os estudos de análises de estabilidade relativos à Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), à Barragem do Eixo 1, e à Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios contemplando os estudos de análises de estabilidade referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- ✓ G102400-O-2RT469_R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT470_R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT471_R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT522_R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT523_R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT524_R00_Mar_25.

15.1.5.10 Apresentar o Andamento das Medidas de Estabilização e/ou Reforço Para Atingir no Mínimo os Fatores de Segurança Estabelecidos no item V, Bem Como das Medidas de Contingências Adotadas Caso a Estabilidade da Estrutura Durante as Obras Não Possa Ser Garantida (Item 1.3 – Subitem VI do TR)

Para as medidas de estabilização ou reforço visando a atingir 1,5 para condição drenada; 1,5 para condição não-drenada de pico, e 1,1 para a condição residual, informa-se:

- Todas as estruturas que integram o Programa Descaracterização do Germano possuem declaração de estabilidade. A declaração para o Dique Sela Tulipa é apresentada na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório.
- As obras de reforço do Dique Sela Tulipa foram iniciadas em abril de 2022 com o preenchimento do fundo do vale imediatamente a jusante. No flanco de Sela Tulipa, a berma de reforço na elevação 865,0m foi finalizada em dezembro de 2022, bem como a instalação de instrumentos em 2024. O coroamento da estrutura e as respectivas drenagem superficial e proteção vegetal foram finalizadas em dezembro de 2024. A execução do regrade a montante da estrutura e a *Punch List* foram concluídas em janeiro e fevereiro de 2025 respectivamente.

15.1.5.11 Apresentar o Andamento das Obras Para (Item 1.3 – Subitem VII)

a) Remoção das infraestruturas associadas à Barragem, exceto aquelas destinadas à garantia da segurança da estrutura (Item 1.3 – Subitem VII-a)

Apresentado no Capítulo 5, subitem 5.2.10 do presente relatório.

b) Reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais e subterrâneas para o reservatório (Item 1.3 – Subitem VII-b)

Apresentado no Capítulo 5, subitens 5.2.7 e 5.2.10 do presente relatório.

Plano de chuvas e dispositivos provisórios

A Samarco utiliza sistemas de drenagem definitivo e/ou provisório para manejo das águas superficiais durante as obras. O manejo é apresentado nos Anexos 4.2 (Manejo das Águas de acordo com o Plano de Chuvas 2024-2025) e 4.3 (Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024-2025 - Final) na pasta “Anexo IV – Execução” do presente relatório. Importante ressaltar que as obras de drenagem definitiva de Sela Tulipa foram concluídas, atendendo às ações previstas para o plano de chuvas.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 201: Anexos 4.2 (Manejo das Águas) e 4.3 (Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024-2025)

	Anexo 4.2-Manejo das Águas Germano_Jun_25
	Anexo 4.3-Status_Implantação_Plano_Chuvas 2024-2025_Jun_25

c) Garantir a estabilidade física e química de longo prazo das estruturas que permanecerem no local (Item 1.3 – Subitem VII-c)

As obras para garantir a estabilidade física e química de longo prazo do Dique Sela Tulipa estão finalizadas. Além do Dique Sela Tulipa, o reservatório da Barragem do Germano é composto do Barramento Principal, da estrutura associada Dique Selinha, de seu próprio reservatório e do novo canal de drenagem principal.

Estabilidade física do Dique Sela Tulipa

As obras de implantação da berma de reforço e do contrapilamento da estrutura, bem como as do regrade a montante do dique, previstas no projeto de descaracterização do Dique Sela Tulipa, encontram-se concluídas (ver figura 202). O volume total de aterro compactado (estéril e arenoso) e agregados é da ordem de 1.002.822,30m³ para a região a jusante e de 1.704.451,10m³ para a região a montante da estrutura, totalizando 2.707.273,40m³, visando à estabilidade de longo prazo.

Figura 202: Dique Sela Tulipa – Berma de Reforço e Regrade a Montante da Estrutura (Obras Concluídas)




Para melhor entendimento, a figura 203 apresenta o arranjo geral (ano 5), contemplando o Dique Sela Tulipa e demais estruturas com as respectivos quantidades de serviços realizados na implantação das obras de descaracterização, separados por região.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025


Figura 203: Ano 5 Arranjo Geral – Volumes (Estéril, Arenoso e Agregados) Finais por Região



Controle hidráulico

Neste aspecto, a montante dos diques Sela Tulipa e Selinha existe uma fração do *Regrade* total do reservatório do Germano associada à descaracterização destas estruturas. As áreas indicadas nas figuras 204 (cor magenta) e 205 (tracejado amarelo) representam o limite de bateria do *Regrade* que integra a descaracterização destes diques.

Figura 204: Delimitação da Área do Regrade Associada à Descaracterização dos Diques Sela Tulipa e Selinha



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




Na área do *Regrade* indicada na figura 204 (cor magenta), o projeto de descaracterização previu a implantação de superfícies suavemente inclinadas, voltadas para um sistema de canais de drenagem superficial especificamente concebido para coletar e transportar o fluxo decorrente da precipitação máxima provável (PMP) até o canal de aproximação do *Regrade* do reservatório do Germano e, em seguida, até o emboque do Canal de Drenagem Principal (CDP) da descaracterização da Barragem do Germano.

Como referência, a área total do reservatório da Barragem do Germano é de 2.963.806 m². Assim sendo, a superfície do *Regrade* a montante de Sela Tulipa e Selinha abrange área com aproximadamente 395.000 m², o que representa 13,5% da superfície total.

Nesta região, ao final da obra, a Samarco executou um volume de aterro compactado da ordem de 1.704.451,10m³, bem como a implantação dos respectivos canais de drenagem associados a esta área, o que elimina acúmulo permanente de água no local.

Figura 205: Regrade da Bacia Hidrológica dos Diques de Sela Tulipa e Selinha (Obras Concluídas)



Descaracterização do Dique Sela Tulipa

O cronograma referente a realização das obras é apresentado na figura 206.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 206: Cronograma das Obras de Descaracterização de Sela Tulipa (Obras Concluídas)

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442_23_03_2025	Descaracterização Barragem Germano - 23-03-2021	100%	100%	1548.86d	01/10/20 A	27/12/24 A	01/10/20	27/12/24	01/10/20	06/03/25
5442_23_03_2025.1	MARCOS DO PROJETO	0%	0%	0.00d	30/03/22 A	30/03/22 A	30/03/22	30/03/22	30/03/22	30/03/22
5442_23_03_2025.2	ENGENHARIA	100%	100%	653.81d	01/10/20 A	19/05/23 A	01/10/20	19/05/23	01/10/20	29/08/22
5442_23_03_2025.2.1	G1024 - BARRAGEM DO GERMANO	100%	100%	653.81d	01/10/20 A	19/05/23 A	01/10/20	19/05/23	01/10/20	29/08/22
5442_23_03_2025.2.1.1	G1000 - GERAL	100%	100%	239.88d	01/10/20 A	17/09/21 A	01/10/20	17/09/21	01/10/20	17/09/21
5442_23_03_2025.2.1.6	G10249405 - DIQUES DE SELA + EIXO 1	100%	100%	490.00d	31/05/21 A	19/05/23 A	31/05/21	19/05/23	31/05/21	29/08/22
5442_23_03_2025.3	SUPRIMENTOS	100%	100%	1040.44d	21/02/22 A	27/12/24 A	21/02/22	27/12/24	21/02/22	12/02/25
5442_23_03_2025.3.2	MATERIAIS	100%	100%	1040.44d	21/02/22 A	27/12/24 A	21/02/22	27/12/24	21/02/22	12/02/25
5442_23_03_2025.3.2.2	PACOTE G-MID-01A - MANTA GEOTEXTIL (FECHAMENTO BARRAGENS)	100%	100%	53.00d	27/08/22 A	19/08/22 A	27/08/22	19/08/22	27/08/22	29/08/22
5442_23_03_2025.3.2.4	PACOTE G-MO-02B - CONTRATAÇÃO DE AGREGADOS - SELA E TULIPA	100%	100%	1040.44d	21/02/22 A	27/12/24 A	21/02/22	27/12/24	21/02/22	12/02/25
5442_23_03_2025.3.3	EQUIPAMENTOS	100%	100%	36.00d	27/06/22 A	22/08/22 A	27/06/22	22/08/22	27/06/22	28/08/22
5442_23_03_2025.3.3.2	PACOTE G-EI-996 - INSTRUMENTOS DE BARRAGEM - SELINHA SELA TI	100%	100%	36.00d	27/06/22 A	22/08/22 A	27/06/22	22/08/22	27/06/22	28/08/22
5442_23_03_2025.4	CONSTRUÇÃO	100%	100%	912.13d	12/04/22 A	10/10/24 A	12/04/22	10/10/24	12/04/22	06/03/25
5442_23_03_2025.4.5	Descaracterização do Dique de Selinha, Sela/Tulipa e Preenchimento	100%	100%	912.13d	12/04/22 A	10/10/24 A	12/04/22	10/10/24	12/04/22	06/03/25
5442_23_03_2025.4.5.1	G1000 - GERAL	0%	0%	720.00d	12/04/22 A	01/04/24 A	12/04/22	01/04/24	12/04/22	02/04/23
5442_23_03_2025.4.5.1.1	G100000 - MARCOS DO PROJETO	0%	0%	720.00d	12/04/22 A	01/04/24 A	12/04/22	01/04/24	12/04/22	02/04/23
5442_23_03_2025.4.5.1.1.1	SUBÁREA 5442-24-04 - BERMAS DE REFORÇO SELA E TULIPA	0%	0%	720.00d	12/04/22 A	01/04/24 A	12/04/22	01/04/24	12/04/22	02/04/23
5442_23_03_2025.4.5.1.1.1.1	GERAL	0%	0%	0.00d	12/04/22 A	12/04/22 A	12/04/22	12/04/22	12/04/22	12/04/22
5442_23_03_2025.4.5.1.1.1.2	BERMA DE PROTEÇÃO	0%	0%	672.00d	30/05/22 A	01/04/24 A	30/05/22	01/04/24	30/05/22	02/04/23
5442_23_03_2025.4.5.2	ÁREA 5442-24 - BARRAGEM DO GERMANO	100%	100%	912.00d	12/04/22 A	10/10/24 A	12/04/22	10/10/24	12/04/22	06/03/25
5442_23_03_2025.4.5.2.2	SUBÁREA 5442-24-04 - BERMAS DE REFORÇO SELA E TULIPA	100%	100%	912.00d	12/04/22 A	10/10/24 A	12/04/22	10/10/24	12/04/22	06/03/25
5442_23_03_2025.4.5.2.2.1	GERAL	100%	100%	143.59d	12/04/22 A	17/11/22 A	12/04/22	17/11/22	12/04/22	16/05/24
5442_23_03_2025.4.5.2.2.2	BERMA DE PROTEÇÃO	100%	100%	226.13d	03/05/22 A	15/12/22 A	03/05/22	15/12/22	03/05/22	02/04/23
5442_23_03_2025.4.5.2.2.3	CONTRAPLANAMENTO	100%	100%	688.13d	22/11/22 A	10/10/24 A	22/11/22	10/10/24	20/11/22	06/03/25
5442_23_03_2025.4.6	Regrade - Etapas 2 E 3	100%	100%	524.69d	16/08/22 A	22/01/24 A	16/08/22	22/01/24	16/08/22	26/09/23
5442_23_03_2025.4.6.1	REGRADA ETAPA 2 (GCT010)	100%	100%	524.69d	16/08/22 A	22/01/24 A	16/08/22	22/01/24	16/08/22	26/09/23
5442_23_03_2025.4.6.1.3	REGRADA - ETAPA 2	100%	100%	524.69d	16/08/22 A	22/01/24 A	16/08/22	22/01/24	16/08/22	26/09/23
5442_23_03_2025.4.6.1.3.1	SELA & TULIPA	100%	100%	524.69d	16/08/22 A	22/01/24 A	16/08/22	22/01/24	16/08/22	26/09/23
5442_23_03_2025.4.6.1.3.1.1	GERAL	100%	100%	524.69d	16/08/22 A	22/01/24 A	16/08/22	22/01/24	16/08/22	03/01/23
54426890	SERVIÇOS PRELIMINARES SELA & TULIPA	100%	100%	4.25d	16/08/22 A	19/08/22 A	16/08/22	19/08/22	16/08/22	14/09/22
54426900	INSTALAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO	100%	100%	162.38d	04/04/23 A	16/09/23 A	04/04/23	16/09/23	21/09/23	11/12/22
5442_23_03_2025.4.6.1.3.3.1.4	DRENAGEM	100%	100%	222.01d	17/05/23 A	22/01/24 A	17/05/23	22/01/24	26/09/22	03/01/23
5442_23_03_2025.4.6.1.3.3.1.4.2	CANAL SECUNDÁRIO	100%	100%	222.01d	17/05/23 A	22/01/24 A	17/05/23	22/01/24	26/09/22	03/01/23
5442_23_03_2025.4.6.1.3.3.1.4.3	CRESTA DO DIQUE DE SELA	100%	100%	182.50d	06/12/22 A	16/09/23 A	06/12/22	16/09/23	23/06/23	26/09/23
5442_23_03_2025.4.6.1.3.3.1.4.1	TERRAPLENAGEM	100%	100%	182.50d	06/12/22 A	16/09/23 A	06/12/22	16/09/23	23/06/23	26/09/23
5442_23_03_2025.4.6.1.3.3.6	EMBOQUE CANAL DE APROXIMAÇÃO	100%	100%	154.13d	28/03/23 A	27/08/23 A	28/03/23	27/08/23	07/04/23	01/05/23
5442_23_03_2025.4.6.1.3.3.6.1	TERRAPLENAGEM	100%	100%	154.13d	28/03/23 A	27/08/23 A	28/03/23	27/08/23	07/04/23	01/05/23

15.1.5.12 Apresentar a Análise dos Resultados das Inspeções Visuais Realizadas na Estrutura no Período Avaliado em Relação às Obras de Descaracterização, Informando a Periodicidade das Inspeções (Item 1.3 – Subitem VIII do TR)

Nota: Deverão ser apresentadas as medidas adotadas para corrigir as anomalias registradas durante as inspeções visuais, inclusive aquelas iniciadas em períodos anteriores ao do relatório apresentado, até sua efetiva conclusão

As análises dos resultados das inspeções visuais realizadas no período estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT525-R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT526-R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT527-R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 5 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 207: Recomendação 5 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

05	Apresentar os relatórios de inspeção mensais relativos à Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), à Barragem do Eixo 1, e à Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	---	---	---	---	---	---	--------

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Os relatórios contemplando as inspeções visuais referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT469-R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT470-R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT471-R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT522-R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT523-R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT524-R00_Mar_25.

15.1.5.13 Apresentar as Leituras da Instrumentação Instalada na Barragem, Informando a Periodicidade Adotada Para as Leituras e a Relação dos Níveis Registrados Pelos Instrumentos Com os Níveis de Controle de Segurança Estabelecidos Para a Estrutura (Item 1.3 – Subitem IX do TR)

As leituras da instrumentação no período instaladas estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT525_R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT526_R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT527_R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 6 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 208: Recomendação 6 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

06	Apresentar os relatórios técnicos contendo as leituras da instrumentação instalada na Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), na Barragem do Eixo 1, e na Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios técnicos contemplando as leituras da instrumentação instalada, referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT469_R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT470_R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT471_R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT522_R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT523_R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT524_R00_Mar_25.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.1.5.14 Apresentar as Leituras e a Avaliação de Desempenho da Instrumentação Empregada Especificamente, Caso Houver, para o Período das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem X)

As leituras e análises de desempenho da instrumentação empregada para o período das obras de descaracterização estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT525_R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT526_R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT527_R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 7 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 209: Recomendação 7 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

07	Apresentar os relatórios técnicos contendo as leituras da instrumentação empregada especificamente para o período das obras de descaracterização na Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), na Barragem do Eixo 1, e na Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios técnicos contemplando as leituras de instrumentação empregada especificamente para o período das obras de descaracterização referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT469_R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT470_R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT471_R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT522_R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT523_R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT524_R00_Mar_25.

15.1.5.15 Informar os Períodos de Interrupção dos Trabalhos, Devidamente Justificados (Ex.: Período Chuvoso), se Pertinente (Item 1.3 – Subitem XI)

A quantidade de horas praticáveis para as atividades é apresentada no Capítulo 5, subitem 5.2.14 do presente relatório.

Dique Sela Tulipa (Histórico)

A execução das obras seguiu conforme o plano de ação implementado (plano A das obras da Barragem do Germano para o período chuvoso).

Em 2022, foi implementado o plano para o período chuvoso 2022–2023 para receber todos os recursos de terraplenagem do Canal de Drenagem Principal (CDP) que foram suspensos durante as chuvas.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




O plano para o período chuvoso 2023-2024 foi executado com o objetivo de manter o sistema de drenagem operável e os recursos de terraplenagem mobilizados no período chuvoso. Durante as chuvas, as obras de coroamento da estrutura, bem como a drenagem superficial, foram executadas conforme praticabilidade, e estão atualmente finalizadas.

15.1.5.16 Apresentar os Protocolos Adotados Para Garantir a Segurança dos Trabalhadores Durante as Obras (Item 1.3 – Subitem XII do TR da FEAM)

Apresentados no Capítulo 11 – Saúde e Segurança do Trabalho do presente relatório. Os protocolos da documentação de referência constam na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

Figura 210: Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho



15.1.5.17 Descrição e Registros Fotográficos de Cada Atividade já Concluída ou Em Andamento Para a Descaracterização da Barragem (Item 1.3 – Subitem XIII do TR da FEAM)

Apresentados no subitem 15.1.13 – Relatório Fotográfico do Andamento das Obras do Dique Sela Tulipa do presente apêndice.

15.1.5.18 Apresentar Cronograma Atualizado, Detalhando a Data de Início e Conclusão (ou Previsão) de Cada Atividade Realizada ou a Realizar Para a Descaracterização da Estrutura. Detalhar as Atividades Realizadas no Período, Percentual de Avanço da Descaracterização, Cumprimento das Ações Previstas na Respectiva Etapa do Cronograma (Item 1.3 – Subitem XIV do TR)


Atendimento à Nota Técnica 17/01/23, Item 4 – Recomendações da AECOM

Figura 211: Item 4 – Recomendações da AECOM – 17/01/23

04	Incluir no relatório o cronograma no formato de diagrama de Gantt, com as atividades previstas no escopo, bem como a indicação do caminho crítico do Programa de Descaracterização em adição e/ou substituição ao cronograma esquemático apresentado no Item 4.3.	3	1	2	6	Alerta
----	---	---	---	---	---	--------

O cronograma detalhado das obras, contemplando todo o escopo necessário à completa execução da descaracterização do Dique Sela Tulipa, é apresentado como anexo na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

Figura 212: Anexo II – Cronograma das Obras de Descaracterização de Sela Tulipa



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Atividades Realizadas no Período

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

Cumprimento das Ações Previstas na Respectiva Etapa do Cronograma

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.1.6 Escopo das Obras de Descaracterização – Dique Sela Tulipa

15.1.6.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente à Nota Técnica 17/01/23, Item 9 – Recomendações da AECOM.

15.1.6.2 Escopo

O plano de execução do Dique Sela Tulipa foi dividido de acordo com as três etapas principais: Engenharia, Suprimentos e Construção.

Engenharia (status: 100% concluída):

- Estudos e Levantamento de Campo – **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Básico – **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – **CONCLUÍDO ✓**.

Suprimentos (status: 100% concluído):

- Serviço: Obras Civas /Terraplenagem – **CONCLUÍDO ✓**;
- Materiais: Agregados – **CONCLUÍDO ✓**;
- Equipamentos: Instrumentos de Barragem – **CONCLUÍDO ✓**.

Construção (status: 100% concluída):

- Serviços preliminares, limpeza e acessos – **CONCLUÍDO ✓**;
- Alçamento da berma de proteção etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Alçamento da berma de proteção etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Prolongamento da drenagem interna – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Prolongamento da drenagem interna – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Preenchimento a montante da berma – etapa 1 solo – **CONCLUÍDO ✓**;
- Preenchimento a montante da berma – etapa 2 arenoso – **CONCLUÍDO ✓**;
- Preenchimento a montante da berma – etapa 3 solo – **CONCLUÍDO ✓**;
- Instalação de instrumentação da berma de proteção – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Instalação de instrumentação da berma de proteção – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Instalação de instrumentação do contrapilhamento de Sela Tulipa – **CONCLUÍDO ✓**;
- Coroamento da berma de proteção até elevação final – **CONCLUÍDO ✓**.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.1.7 Desempenho da Execução – Dique Sela Tulipa


15.1.7.1 Objetivo do Capítulo

Atendimento ao Item 1.3, subitem XIV do Termo de Referência da FEAM e às recomendações 3 e 4 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/2023.

15.1.7.2 Avanço Físico Acumulado do Dique Sela Tulipa – Previsto x Realizado

Apresentado na EAP da Figura 213. A estrutura está dividida em Engenharia, Suprimentos e Construção.

Figura 213: EAP do Projeto de Descaracterização do Dique Sela Tulipa (Histórico)

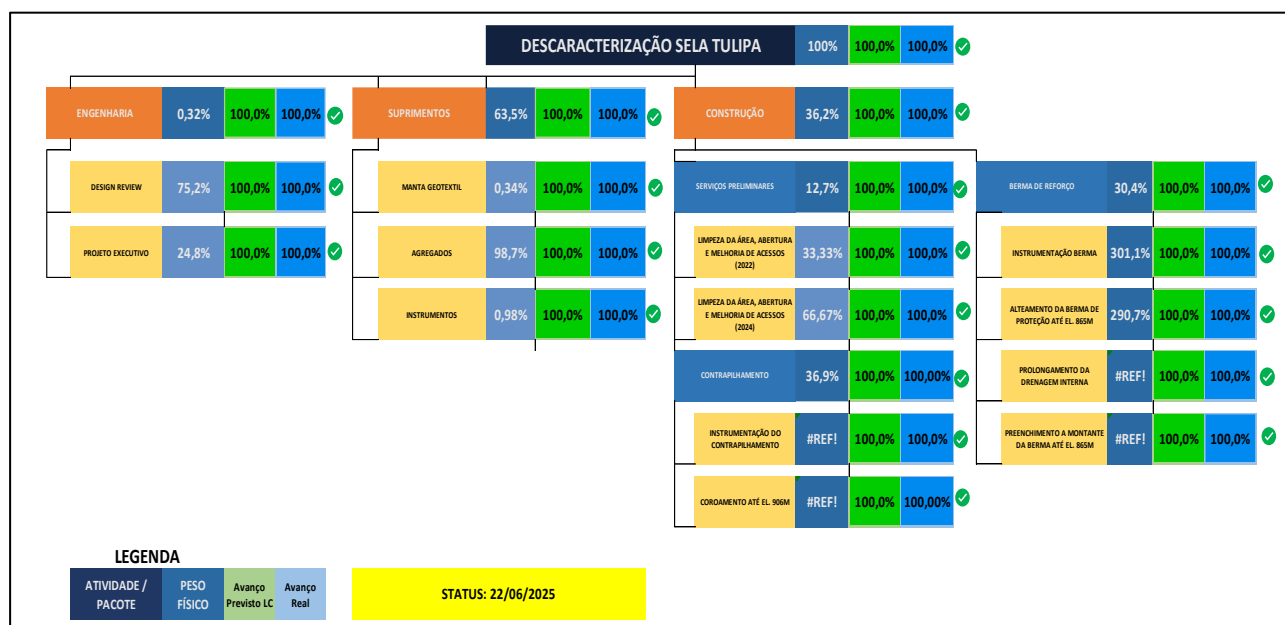

15.1.7.3 Tabela Resumo de Desempenho no Trimestre e Acumulado

Tabela 58: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados no Período – Dique Sela Tulipa (Histórico)

Programa Descaracterização	Etapa	Peso % (\$) IPR 2021	Peso % (\$) L. Corrente Até Ago/21	2º Trimestre 2025 %			Acumulado Geral %		
				Planejado Corrente	Real	Desvio Corrente	Planejado Corrente	Real	Desvio Corrente
Descaracterização do Dique Sela Tulipa	Engenharia	0,34%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Suprimentos	66,43%	66,43%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Construção	33,23%	33,23%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Total	11,01%	11,01%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Nota: Etapa de obras de descaracterização finalizada. Atualmente, a estrutura encontra-se na etapa de monitoramento ativo.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




15.1.7.4 Desempenho do Projeto de Descaracterização – Dique Sela Tulipa

Curva S Geral da Descaracterização – Dique Sela Tulipa

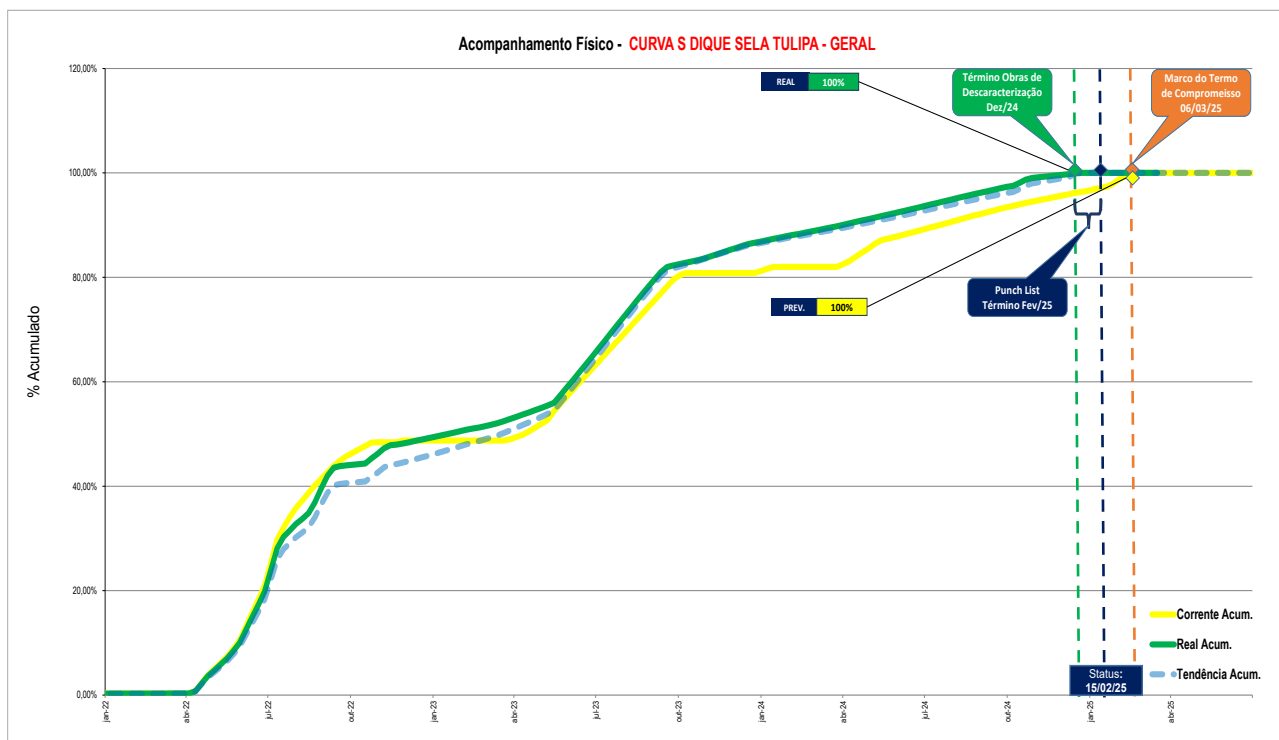

Curva S Geral da Construção – Dique Sela Tulipa

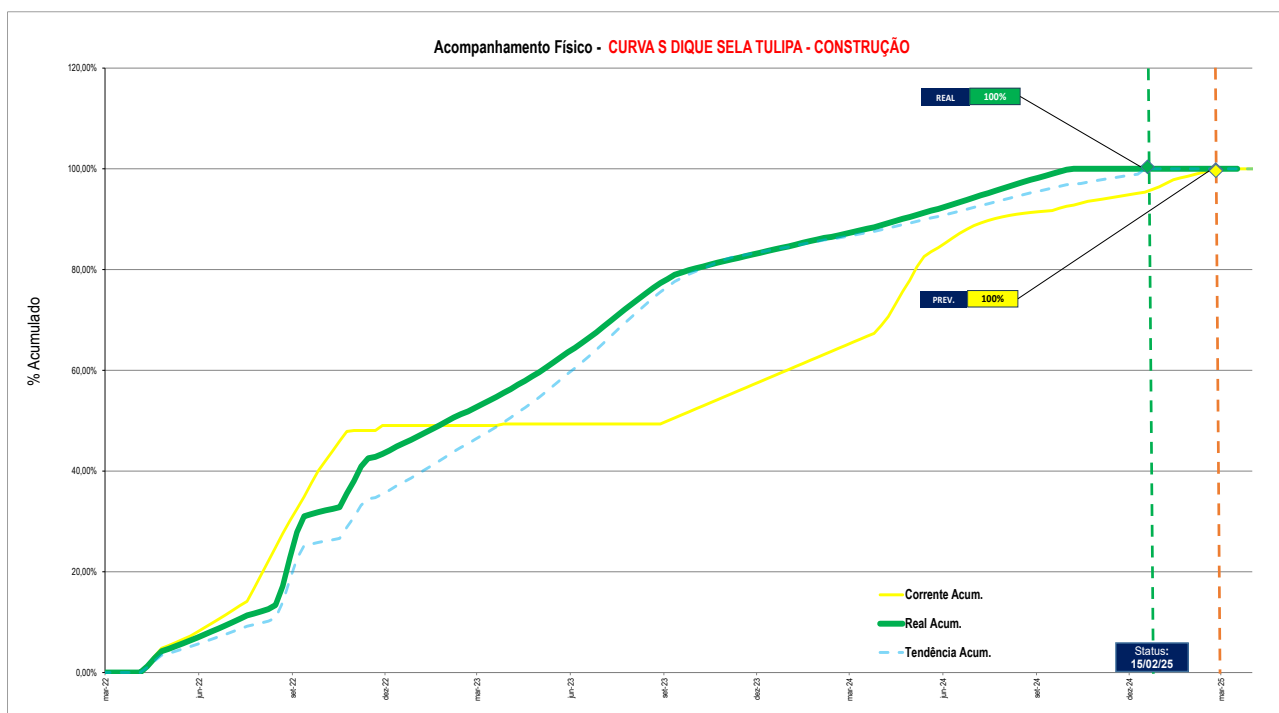


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Curva S Geral de Suprimentos – Dique Sela Tulipa

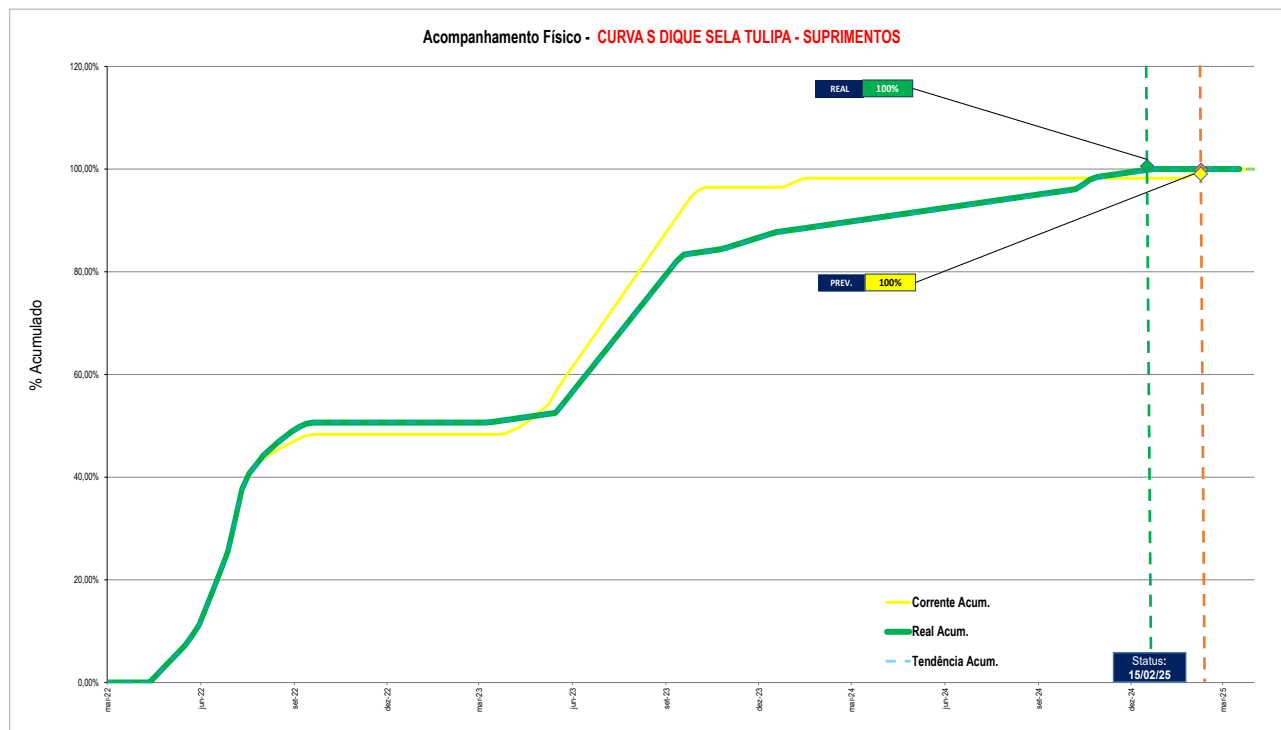

Curva S Geral da Engenharia – Dique Sela Tulipa

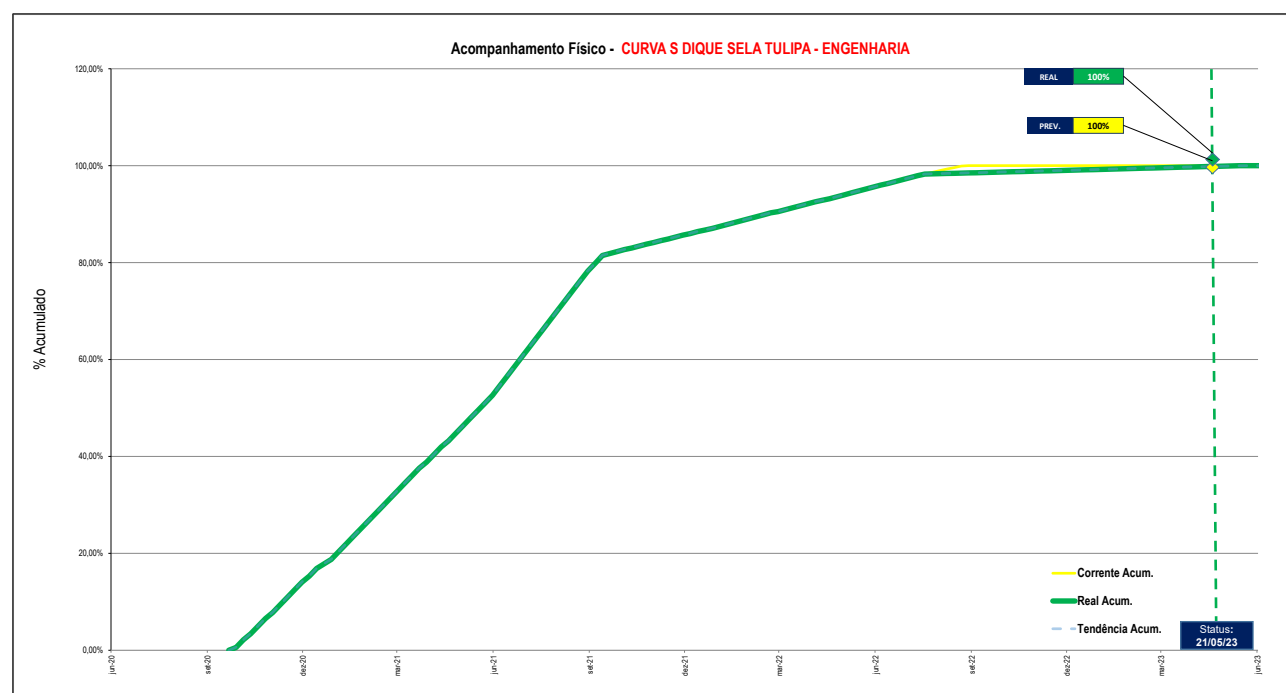

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.1.7.5 Cronograma Detalhado – Descaracterização Dique Sela Tulipa
Disponibilizado na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

Figura 214: Cronogramas da Descaracterização do Dique Sela Tulipa

Anexo 2.5-Cronog. Detalhado Dique Sela Tulipa_Status_2025_06_22 (final)

15.1.7.6 Caminho Crítico

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.1.7.7 Análise do Caminho Crítico – Dique Sela Tulipa

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.1.8 Desempenho da Construção – Dique Sela Tulipa

15.1.8.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao Item 1.3, subitem XIV do Termo de Referência da FEAM e às recomendações 2, 6 e 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23.

15.1.8.2 Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes da Construção

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.1.8.3 Atividades Principais – Obras Executadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

Descaracterização do Dique Sela Tulipa
• Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. • Monitoramento ativo da estrutura pós-obra.

15.1.8.4 Atividades Principais – Obras Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

Descaracterização do Dique Sela Tulipa
• Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. • Monitoramento ativo da estrutura pós-obra.

Nota: O monitoramento ativo entra em sua fase específica de confirmar as premissas de projeto e sazonalidade hidrogeotécnica, uma vez que todas as configurações de obras de descaracterização do Dique Sela Tulipa foram atingidas no ano de 2024.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.1.8.5 Atividades Principais – Obras Previstas para o 2º Trimestre de 2025 no Relatório Anterior x Realizadas

Tabela 59: Avaliação das Atividades do Dique Sela Tulipa Realizadas no Trimestre x Planejadas

ATIVIDADES PREVISTAS NO RT ANTERIOR	STATUS DA ATIVIDADE	COMENTÁRIOS
DESCARACTERIZAÇÃO DO DIQUE SELA TULIPA		
Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal.	Rotina	Conforme planejamento.
Monitoramento ativo da estrutura pós-obra.	Rotina	Conforme planejamento.

15.1.8.6 Quantidades dos Serviços (Histórico)

Gráfico 47: Status da Execução do Aterro a Jusante de Sela Tulipa (Concluído)


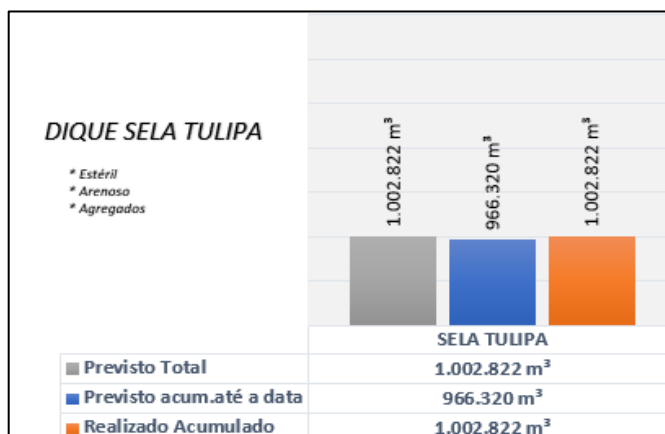


Gráfico 48: Status da Execução do Aterro a Montante de Sela Tulipa (Concluído)

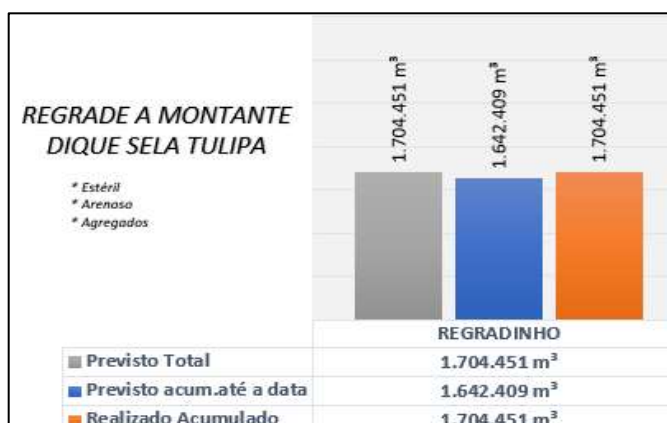

15.1.8.7 Histogramas das Obras (Histórico)

As forças de trabalho indireta e direta, bem como os equipamentos, estão inclusos nos histogramas do Contrato 4300000595 – Consórcio MRF, apresentado no Capítulo 8, subitem 8.7.9 do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.1.9 Desempenho de Suprimentos – Dique Sela Tulipa

15.1.9.1 Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes de Suprimentos

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.1.9.2 Atividades Principais de Suprimentos Executadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.1.9.3 Atividades Principais de Suprimentos Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.1.9.4 Principais Materiais – Fornecimento

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.1.10 Desempenho da Engenharia – Dique Sela Tulipa

Além do atendimento ao Termo de Compromisso, este item também se destina a atender às Recomendações 2, 6, 7 e 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23.

Os itens relacionados à integração entre as engenharias, tramitação de documentação técnica e registros de adequações são apresentados no Capítulo 10, Itens 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, respectivamente, do presente relatório.

As listas de projetos revisados e aprovados para atendimento à Recomendação 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23 constam na pasta “Anexo III – Engenharia” do presente relatório.

O desenvolvimento da engenharia do Projeto de Descaracterização do Dique Sela Tulipa foi concluído em maio de 2023.

15.1.10.1 Atividades Principais de Engenharia Realizadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

Descaracterização do Dique Sela Tulipa
Acompanhamento do monitoramento ativo da estrutura pós-obras.

15.1.10.2 Atividades Principais de Engenharia Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

Descaracterização do Dique Sela Tulipa
Acompanhamento do monitoramento ativo da estrutura pós-obras.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.1.11 Saúde e Segurança do Trabalho

Tem a finalidade de atender integralmente ao Item 1.3, subitem XII do Termo de Referência da FEAM.

Os assuntos relacionados a Saúde e Segurança do Trabalho são apresentados no Capítulo 11 do presente relatório.

15.1.12 Aspectos Ambientais das Obras de Descaracterização

Para atender integralmente ao Item 1.3, subitens I a V do Termo de Referência da FEAM.

Também serve para informar o andamento das obras do Projeto de Descaracterização do Dique Sela Tulipa no aspecto do controle ambiental, bem como apresentar as ações implementadas e os resultados obtidos na gestão ambiental no período.

Os aspectos ambientais das obras de descaracterização são apresentados no Capítulo 12 do presente relatório.

15.1.13 Relatório Fotográfico do Andamento das Obras – Dique de Sela Tulipa

15.1.13.1 Drenagem Superficial e Proteção Vegetal

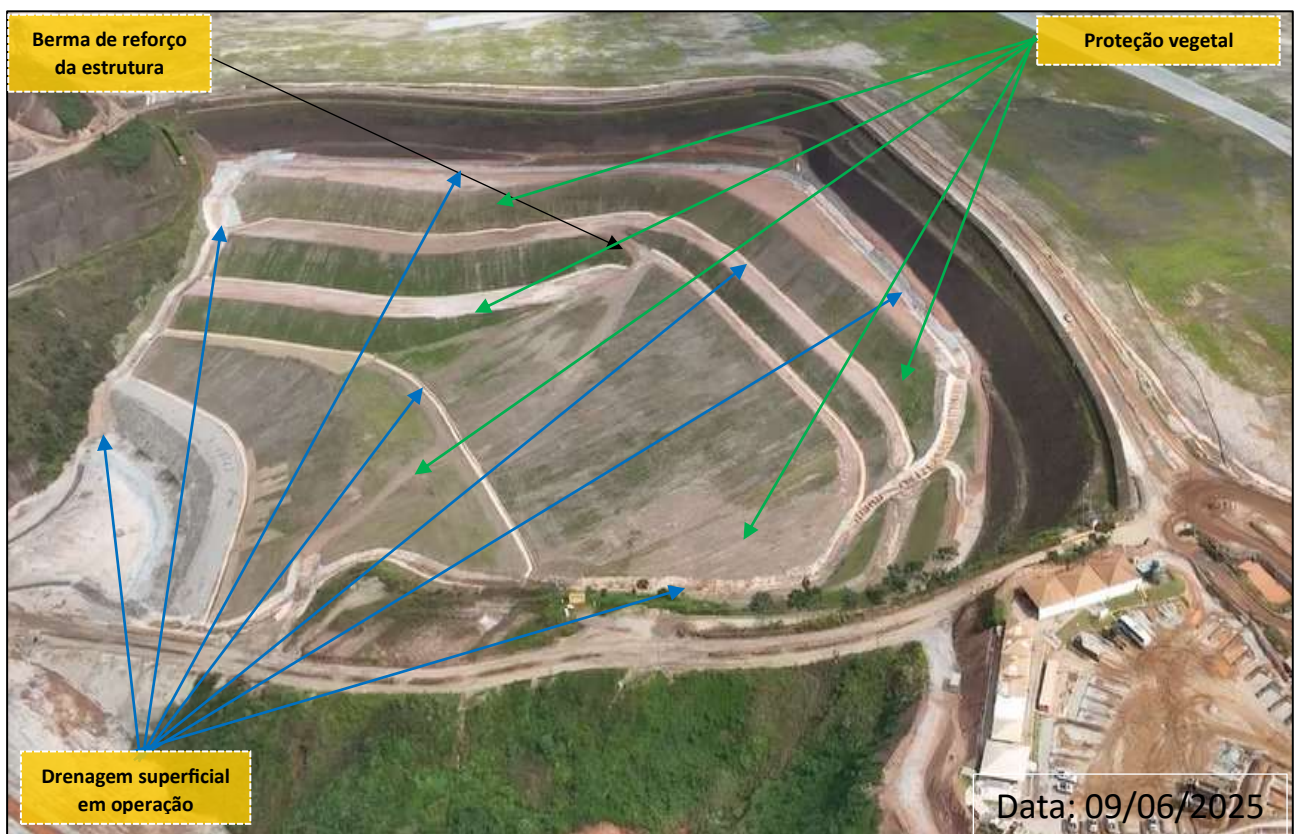


Foto 13: Vista da do Dique Sela Tulipa com a Berma de Reforço, Drenagem Superficial e Proteção Vegetal Concluídas

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.1.13.2 Regrade a Montante de Sela Tulipa e Selinha

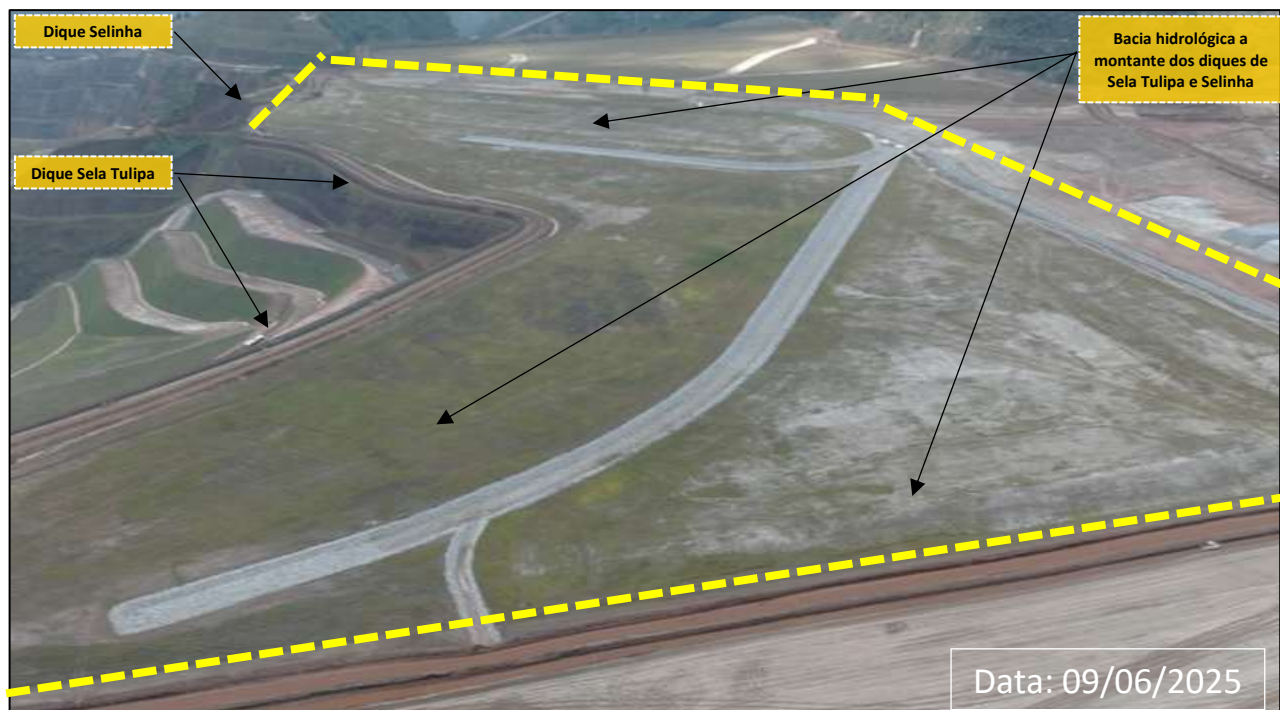


Foto 14: Regrade a Montante de Sela Tulipa e Selinha Concluído

15.1.13.3 Visão Geral de Sela Tulipa



Foto 15: Visão Geral de Sela Tulipa – Obras de Descaracterização Concluídas

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.2 APÊNDICE II – Descaracterização do Dique Selinha

15.2.1 Objetivo do Apêndice II

Informar detalhadamente sobre a etapa de obras de descaracterização, bem como o andamento da etapa de monitoramento ativo do Dique Selinha, estrutura geotécnica alteada a montante associada ao reservatório da Barragem do Germano, a fim de garantir a estabilidade de longo prazo, bem como a reconformação final do Vale do Fundão (*regrade*) a montante da Barreira 3 para implantação da Pilha de Disposição de Estéril e Rejeitos Arenosos – PDER Eixo 1.

15.2.2 Contextualização

O Dique Selinha está situado no flanco nordeste do reservatório da Barragem do Germano, no extremo oeste do Vale do Fundão. Sua implantação foi iniciada em 2006 em decorrência do alteamento do Barramento Principal.

Com a elevação do nível dos rejeitos no interior do reservatório da Barragem de Germano, foram executados três alteamentos no Dique Selinha por linha de centro. Atualmente, a crista está posicionada na elevação 919,0m.

O Dique Selinha, assim como o Dique Sela Tulipa, estabeleceu separação entre os vales do córrego Germano e do córrego Fundão, tendo a montante o reservatório da Barragem do Germano.

O ponto de partida do Dique Selinha foi projetado pela Pimenta de Ávila Consultoria e construído entre os anos de 2006 e 2008. O projeto inclui estrutura de aterro compactado até a elevação 910,0m, com filtro vertical e tapete drenante de areia para direcionamento da percolação para o pé do maciço. A estrutura possui 187,0m de extensão, com crista na elevação 919,0m.

Após o colapso de Fundão, a BVP Engenharia elaborou o projeto de reforço do Dique Selinha, realizando também o Acompanhamento Técnico de Obra (ATO). A obra de reforço dispôs de volume da ordem de 65.000m³ de blocos, gerando nova conformação geométrica para a estrutura. Após a conclusão do reforço, foi realizado preenchimento a jusante do aterro de conquista com lançamento de blocos com finos, a fim de controlar os processos erosivos. Posteriormente, esse local passou a ser utilizado como acesso à região imediatamente a montante do Eixo 1.

Em setembro de 2016, a BVP Engenharia elaborou projeto para adequação e estabilização do talude do acesso inferior situado a jusante da estrutura (região onde foram lançados blocos para conter erosões). Em 2017, em atendimento a uma das recomendações do ITRB, a BVP Engenharia elaborou projeto de berma complementar na região acima do aterro de conquista, aproximadamente à elevação 858,0m. Neste projeto foi prevista berma composta de blocos com finos, situada entre as elevações 858,0m e 865,0m.

Visando ao atendimento de fator de segurança mínimo exigido pela Resolução Nº 4 da ANM publicada em 18 de fevereiro de 2019 ($FS \geq 1,3$ para análise não-drenada), a BVP Engenharia desenvolveu o projeto de reforço complementar na elevação 904,0m, que

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



previu a implantação de aterro em blocos com finos, com taludes de declividade 1V:2H e bermas nas elevações 895,0m, 899,0m e 904,0m (coroamento), com largura de 4,5m, exceto para a berma de coroamento que foi projetada com largura de 9,4m.

Ao final da implantação do referido reforço em março de 2019, a avaliação de estabilidade das principais seções geológico-geotécnicas indicou condição satisfatória em relação ao critério de aceitabilidade preconizado pela Resolução Nº 4 da ANM (posteriormente revogada e substituída pela Resolução Nº 13 da ANM).

Visando à adequação das condições de segurança da região a jusante do Dique Selinha frente ao cenário de pós-liquefação dos rejeitos remanescentes, a BVP Engenharia elaborou o projeto de reforço desta região que previu:

- aterro de estabilização;
- instalação de drenos verticais pré-fabricados (geodreno/fibroquímicos);
- desvio do vertedouro do Dique Sela Tulipa para o pé do Dique Selinha via canal provisório em concreto Canvas (concreto em rolo). Este canal foi removido durante as obras de descaracterização.

O projeto contemplando a solução de estabilização (reforço) da região a jusante do Dique Selinha foi subdividido nas seguintes etapas:

- Etapa 1: execução do dreno de fundo (20% aproximados) do aterro de estabilização e implantação dos drenos fibroquímicos entre as Barreiras 2 e 3;
- Etapa 2: execução de outros (40% aproximados) do reforço previsto;
- Etapa 3: execução dos demais (40% aproximados) do reforço previsto.

As obras de estabilização da Etapa 1 foram realizadas entre agosto e dezembro de 2018. A Etapa 2 foi executada entre abril e dezembro de 2019. As obras da Etapa 3 foram concluídas em 2020.

O Projeto de Descaracterização do Dique Selinha tem como cenário de partida o preenchimento do Vale do Fundão ao final do ano de 2019, compreendendo a execução de aterro em rejeito arenoso disposto mecanicamente no fundo do Vale do Fundão, de forma a contrapilhar o pé do dique e elevar a condição de estabilidade e a segurança local. Este contrapilhamento foi previsto para ser implantado em 3 etapas, atingindo a elevação 840,0m no fundo do vale ao final da 3ª etapa.

Resumidamente, o cenário compreende:

- Barragem Eixo 1 implantada (crista na elevação 820,3m e reservatório na elevação 817,0m);
- Preenchimento da região entre a enseadeira e a Barragem Eixo 1, utilizando rejeito arenoso disposto mecanicamente até a elevação 809,0m;
- Contrapilhamento do Vale do Fundão, implantado utilizando rejeito arenoso disposto mecanicamente até a elevação 840,0m na região do Dique Sela Tulipa, e elevação 836,0m na região do Dique Selinha;

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- ADME removida;
- Reforços do Dique Sela Tulipa e do Dique Selinha (Fase 4) implantados: trata-se dos reforços efetuados para o atendimento ao FS mínimo de 1,3 para o cenário de análise não-drenada, conforme descrito anteriormente (iniciado e concluído em 2019).

Atualmente, as obras de descaracterização do Dique Selinha encontram-se finalizadas.

As obras de preenchimento a montante da Barreira 3 / Seção AA (porção Vale do Fundão em Selinha) foram concluídas em 26/11/24 (ver atividade 5442A5970). A execução da berma de reforço / contrapilamento da estrutura foi finalizada em 22/12/24. A drenagem superficial em pedra argamassada, drenagem superficial e proteção vegetal foram concluídas em 31/12/24 (ver atividade 5442A6020).

A *Punch List* da drenagem superficial e serviços de proteção vegetal finalizada em 15/02/25.

Com isso, a Samarco empenhou todos os esforços requeridos e concluiu as obras de descaracterização desta estrutura que integra o sistema do reservatório da Barragem do Germano antecipadamente em relação à respectiva previsão de conclusão (10/04/25) que consta no Termo de Compromisso.

Ademais, a Samarco protocolou em janeiro de 2025, junto à FEAM, o relatório de conclusão das obras de descaracterização do Dique Selinha.

15.2.3 Identificação

- 15.2.3.1 Nome da Barragem e da Mina, Conforme Bancos de Dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e da Agência Nacional de Mineração – ANM, Quando Couber (Item 1.1 – Subitem I do TR da FEAM)

Tabela 60: Identificação do Dique Selinha

Nome da Estrutura	Dique Selinha (Barragem do Germano)
Mina	Mina do Germano

- 15.2.3.2 Coordenadas Geográficas do Ponto Central da Barragem Antes do Início das Obras de Descaracterização, Referenciadas no Datum SIRGAS-2000 (Item 1.1 – Subitem II do TR da FEAM)

O Dique Selinha é uma estrutura associada ao reservatório da Barragem do Germano e está situado na Mina do Germano, ou “Complexo do Germano”. As coordenadas geográficas da estrutura indicam o ponto central da crista da barragem, antes do início das obras de descaracterização, referenciadas no Datum SIRGAS-2000 do cadastro SIGBM, conforme a tabela 61.

Tabela 61: Coordenadas do Dique Selinha

Latitude	-20°21'65.000"
Longitude	-43°46'79.444"

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

A localização e o acesso do Complexo do Germano são apresentados no Capítulo 3, item 3.3 do presente relatório.

O acesso ao Dique Selinha pode ser realizado a partir da portaria da Barragem do Germano, localizada na margem direita da rodovia MG-129, sentido Mariana para Catas Altas. Da portaria, o Dique Selinha pode ser acessado por vias internas da Samarco conforme indicado na figura 215.

Figura 215: Mapa de Localização e acesso ao Dique Selinha no Complexo do Germano



15.2.3.3 Matriz de Classificação, com Base nos Critérios Estabelecidos nos Anexos I a IV do Decreto 48.140, de 25 de Fevereiro de 2021 (Item 1.1 – Subitem III do TR da FEAM)

A matriz de classificação do Dique Selinha, apresentada na tabela 62, foi reavaliada pelas auditorias de inspeção, monitoramento da instrumentação e análise de segurança realizadas no período e mantida conforme a última avaliação realizada pela projetista BVP em 10/03/2025 e aprovada em 24/03/2025, em conformidade com a legislação pertinente (Decreto Estadual 48.140 de 25 de fevereiro de 2021).

Tabela 62: Matriz de Classificação do Dique Selinha

Categoria de Risco - Resultado Da Avaliação: Baixo	
Resultado da Pontuação Total do CRI do Dique Selinha = 10 → Referência: CRI ≤ 37	
Potencial de Dano Ambiental - Resultado Da Avaliação: Alto	
Resultado da Pontuação Total do PDA do Dique Selinha = 26 → Referência: PDA ≥ 13	
Características Técnicas (CT) - Resultado Da Avaliação: $\sum CT = 10$	
Altura Atual (a)	60m máximo → 30m < Altura ≤ 60m (4)
Comprimento (b)	187m → 50 < Comprimento ≤ 200m (1)
Vazão de Projeto (c)	CMP (Cheia Máxima Provável) ou Decamilenar (0)
Método Construtivo (d)	Alteamento por linha de centro (5)
Auscultação (e)	Existe instrumentação de acordo com o projeto técnico (0)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Estado de Conservação (EC) - Resultado Da Avaliação: $\sum EC = 0$	
Confiabilidade das Estruturas Extravasoras (f)	Estruturas civis bem mantidas e em operação normal / barragem sem necessidade de estruturas extravasoras (0)
Percolação (g)	Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem (0)
Deformações e Recalques (h)	Não existem deformações e recalques com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (0)
Deterioração dos Taludes / Paramentos (i)	Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva (0)
Plano de Segurança da Barragem (PSB) - Resultado Da Avaliação: $\sum PS = 0$	
Documentação de Projeto (j)	Projeto executivo e "como construído" (0)
Estrutura Organizacional e Qualificação dos Profissionais na Equipe de Segurança da Barragem (k)	Possui unidade administrativa com profissional técnico qualificado responsável pela segurança da barragem (0)
Manuais de Procedimentos para Inspeções de Segurança e Monitoramento (l)	Possui manuais de procedimentos para inspeção, monitoramento e operação (0)
Plano de Ação Emergencial - PAE (quando exigido pelo órgão fiscalizador) (m)	Possui PAE (0)
Relatórios de inspeção e monitoramento da instrumentação e de Análise de Segurança (n)	Emite regularmente relatórios de inspeção e monitoramento com base na instrumentação e de Análise de Segurança (0)
Potencial de Dano Ambiental (PDA) - Resultado Da Avaliação: $\sum PDA = 26$	
Volume Total do Reservatório (a)	129,6 milhões m ³ → Muito Grande ≥ 50 milhões m ³ (5)
Existência de população a jusante (b)	EXISTENTE (Existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem; portanto, vidas humanas poderão ser atingidas) (10)
Impacto ambiental (c)	SIGNIFICATIVO (Área afetada a jusante da barragem apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, excluídas APPs, e armazena apenas resíduos inertes (Classe II B segundo a NBR 10.004 da ABNT) (6)
Impacto socioeconômico (d)	ALTO (Existe alta concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância socioeconômica e cultural na área afetada a jusante da barragem) (5)
Enquadramento - Resultado Da Avaliação: Classe B	
Categoria de Risco	Baixo
Potencial de Dano Ambiental	Alto

15.2.3.4 Identificação do Empreendimento com Respectiva Razão Social, CNPJ, Endereço, Nome e Telefone do Representante Legal para Contato (Item 1.1 – Subitem IV do TR da FEAM)

Tabela 63: Identificação do Empreendimento – Dique Selinha

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	
Nome da estrutura	DIQUE SELINHA
Finalidade	O Dique Selinha teve a finalidade de permitir o aumento da capacidade do reservatório da Barragem do Germano, garantindo o armazenamento dos rejeitos depositados nesta estrutura, operação essa que não mais ocorre. Atualmente, a Barragem do Germano e suas estruturas associadas estão em processo de descaracterização.
Empreendedor	Samarco Mineração S.A, Em Recuperação Judicial
CNPJ	16.628.281/0003-23
Endereço Mina do Germano	Rodovia MG-129 s/n, Zona Rural - Mariana/MG - CEP: 35.420-970
Endereço Sede Administrativa	Ed. das Américas, Rua Paraíba, 1.122 - Andares 9º, 19º e 23º - Funcionários Belo Horizonte/MG CEP 30.130-141
Telefone Sede Administrativa	(31) 3559-5000
Diretoria	Gerência de Geotecnia
Complexo	Germano
Mina	Germano
Município	Mariana
Estado	Minas Gerais
Tipo de Minério	Ferro

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.2.3.5 Identificação do Empreendedor com Respectiva Razão Social, CNPJ, Endereço, Nome e Telefone do Representante Legal para Contato (Item 1.1 – Subitem V do TR da FEAM)

Tabela 64: Identificação do Empreendedor do Dique Selinha

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR	
Razão Social	Samarco Mineração S.A, Em Recuperação Judicial
CNPJ	16.628.281/0003-23
Endereço Sede Administrativa	Rua Paraíba, 1.122 - Andares 9º, 19º e 23º - Funcionários Belo Horizonte/MG CEP 30.130-141
Endereço Mina do Germano	Rodovia MG-129 s/n, Zona Rural - Mariana/MG CEP 35.420-970
Representante legal	Rodrigo Alvarenga Vilela
Formação Profissional	Engenheiro Metalurgista
CREA	27157-D BA
Cargo	Diretor Presidente
Telefone	(31) 3269-8808 / (31) 3269-8787
E-mail	rodrigo.vilela@samarco.com

15.2.3.6 Identificação do Responsável Técnico pela Barragem, com Formação Profissional, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido, Endereço do Correio Eletrônico, e Telefone para Contato (Item 1.1 – Subitem VI do TR da FEAM)

A identificação do responsável técnico pelo Dique Selinha, sua formação, cargo, responsabilidades, nº de registro em conselho de classe e endereço do correio eletrônico são apresentados na tabela 65.

Tabela 65: Responsável Técnico pelo Dique Selinha

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE BARRAGEM DO EMPREENDEDOR	
Nome	Ernesto Tadeu Bossi
Formação	Engenheiro Civil
Cargo	Gerente Geral de Geotecnia
Responsabilidades	Gerente geral responsável pelas operações/estruturas geotécnicas do Complexo do Germano
CREA	87931/D MG
RNP	1400165911
Telefone	(31) 3269-8683
E-mail	ernesto.bossi@samarco.com

Obs.: A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com a atribuição do responsável técnico do Dique Selinha consta na pasta “Anexo I – ARTs _Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

15.2.3.7 Identificação da Equipe Técnica Responsável pelos Projetos de Descaracterização (Nome Completo, Formação Acadêmica, Áreas sob Sua Responsabilidade no Estudo, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido). A Anotação de Responsabilidade Técnica Deverá Ser Apresentada no Anexo I (Item 1.1 – Subitem VII do TR da FEAM)

A identificação da equipe técnica, com nome completo, formação, áreas sob sua responsabilidade no estudo e nº do registro em conselho de classe é apresentada a seguir nas tabelas 66 (Projetista) e 67 (Samarco).

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 66: Equipe Técnica dos Projetistas Responsável Pelos Projetos de Descaracterização do Dique Selinha

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO - PROJETISTA BVP	
Razão social	BVP Engenharia e Projetos Ltda.
CNPJ	04.723.774/0001-00
Endereço	Rua Tomé de Souza 616 – Savassi Belo Horizonte/MG - CEP 30.140-131
Registro CREA (Empresa)	38070-MG
Responsável Técnico - Projeto	Paulo Roberto Costa Cella
Formação	Mestrado - EESC-USP Mestre em Engenharia - Área de Concentração: Geotecnia. Doutorado - E. Politécnica - USP: Doutor em Engenharia - Área de Concentração: Engenharia Mineral.
Responsabilidade no projeto	(1) Pareceres geológico-geotécnicos utilizados para as análises de estabilidade. Estruturas do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e Eixo 1. (2) Consultoria Geotécnica Barragem do Germano
CREA (Profissional)	06.0.0600697382 – RNP 2613925922
ART Cava e Barragem Germano	(1) 14201900000005153888 (2) MG20242931282

Obs.: As Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos de descaracterização do Dique Selinha constam na pasta “Anexo I – ARTs_Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

Tabela 67: Equipe Técnica da Samarco Responsável Pelo Acompanhamento dos Projetos de Descaracterização do Dique Selinha

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO - SAMARCO	
Nome	Alexandre Ângelo do Carmo Luiz da Silva
Formação	Engenheiro Ambiental e Mestre em recursos hídricos
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos hidrológicos e hidráulicos.
CREA	MG0000174587/D – RNP 1412886864
Nome	Anelisa Vasconcelos
Formação	Engenheira Civil e Mestre em geotecnia
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos geotécnicos.
CREA	MG0000091141/D – RNP 1400665574
Nome	José Bernardo Vasconcelos Rodrigues Oliveira
Formação	Engenheiro Civil e Mestre em geotecnia
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos geotécnicos.
CREA	MG0000065519/D
Nome	Lucas Samuel Santos Brasil
Formação	Engenheiro Civil e Mestre em recursos hídricos
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos hidrológicos e hidráulicos.
CREA	MG0000 85104/D

15.2.3.8 Identificação da Equipe Técnica Responsável pela Execução e/ou Acompanhamento da Obra de Descaracterização (Nome Completo, Formação Acadêmica, Áreas sob Sua Responsabilidade no Estudo, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido). A Anotação de Responsabilidade Técnica Deverá Ser Apresentada no Anexo I (Item 1.1 – Subitem VIII do TR da FEAM)

A identificação da equipe técnica, com nome completo, formação, áreas sob sua responsabilidade no estudo e nº do registro em conselho de classe é apresentada nas tabelas 68 (Samarco), 69 e 70 (Contratadas).

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 68: Responsável Técnico (Samarco) Pelas Obras de Descaracterização do Dique Selinha

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO GERAL PELA EXECUÇÃO - SAMARCO	
Razão social	Samarco Mineração S/A, em Recuperação Judicial
Responsável Técnico - Obra	Eduardo Moreira Rodrigues
Formação	Engenheiro Civil
Cargo	Gerente Geral de Projetos e Retomada (GGPR)
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Exec. de obra / serviços / mineração / pilha de estéril. (2) Complementar – Aditivo de prazo.
CREA	MG04.0.0000072262/D – RNP 1408981297
ART	(5) 14202000000006351149 (6) MG20232390149

Tabela 69 : Responsáveis Técnicos (Contratada) Pelas Obras de Descaracterização do Dique Selinha

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DESCARACTERIZAÇÃO – 2ª FASE DIQUE SELINHA - CONTRATO 4300000595	
Razão social	Consórcio MRF
CNPJ	32.909.546/0001-56
Endereço	Rua Nossa Senhora de Lourdes, 262 - SI 01 - Olhos D'Água Belo Horizonte/MG CEP 30.390-530
Registro CREA (Empresa)	49483MG e 81683NAC
Responsável Técnico - Obra	Anderson Henrique Andrade Rigobello
Formação	Engenheiro de Produção
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de produção (atividades da área de engenharia de produção) gestão da produção para a Descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e Preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000284672/D – RNP 1419976990
ART	(1) MG 20221116308
Responsável Técnico - Obra	Antônio Carlos Pereira Vieira Júnior
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000087976/D – RNP 1400173396
ART	(1) MG 20221105288
Responsável Técnico - Obra	Leonardo Guimarães Mendes
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem, compactação, escavação, aterro) e obras de construção civil (materiais para construção civil: aplicação de concreto) para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000058753/D – RNP 1403078645
ART	(1) MG 20221079330
Responsável Técnico - Obra	Marcus Veloso da Silveira Cassini
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) (2) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000080345/D – RNP 1403250111
ART	(1) MG 20221105295 (2) MG20253638617

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Responsável Técnico - Obra	Matheus Mata Machado Ferreira de Siqueira
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000195065/D – RNP 1414611790
ART	(1) MG 20221136218
Responsável Técnico - Obra	William Perdigão Frade
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal - Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000006485/D – RNP 1409140350
ART	(1) MG 20221097378
Responsável Técnico - Obra	Diego Fernandes Pontes
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	DF0000014988D/MG – RNP 0704727889
ART	(1) MG20253638523
Responsável Técnico - Obra	Henrique César Rodrigues de Alvarenga
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	0400000066648MG – RNP 1403171033
ART	(1) MG20253638592
Responsável Técnico - Obra	Lucas Sobrinho Lauro
Formação	Engenheiro de Segurança do Trabalho
Responsabilidade na Obra	(1) Gestão de Segurança do Trabalho para as obras de descaracterização
CREA	MG0000142675D MG – RNP 1409973107
ART	(1) MG20253618999

Tabela 70 : Responsável Técnico pela Revegetação nas Áreas de Selinha

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA / RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REVEGETAÇÃO	
CONTRATO 4300000880	
Razão social	JM Reflorestamentos e Serviços Ltda.
CNPJ	08.011.784/0001-65
Endereço	Rua Joaquim Pacífico, 120 – Centro Santa Barbara/MG CEP 35.960-000
Registro CREA (Empresa)	19252-MG
Responsável Técnico - Obra	César Simões Soares
Formação	Engenheiro Florestal
Responsabilidade na Obra	(1) Gestão ambiental para a revegetação de Sela Tulipa.
CREA	MG0000108032/D – RNP 1406493775
ART	(1) MG20243540839

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Obs.: As Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de todos os responsáveis técnicos envolvidos na execução das obras de descaracterização do Dique Selinha constam na pasta “Anexo I – ARTs _ Operações _ Projetos _ Obras” do presente relatório.

15.2.4 Projeto de Descaracterização – Dique Selinha

15.2.4.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao item 1.2, subitens I ao IV do Termo de Referência da FEAM.

15.2.4.2 Descrever Sucintamente a Concepção do Projeto Adotada para Descaracterização da Barragem (Item 1.2 – Subitem I do TR)

Os projetos de descaracterização do Dique Selinha foram desenvolvidos pela projetista BVP em atendimento à Lei Estadual nº 23.291, publicada em fevereiro de 2019, visando à estabilidade geotécnica da estrutura e à adoção de medidas para reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais e subterrâneas para o reservatório associado ao Dique Selinha, no longo prazo.

Considerando a estabilidade geotécnica de longo prazo, foi prevista a implantação de berma de reforço nos taludes de jusante da estrutura. Os projetos de descaracterização do Dique Selinha preveem o preenchimento do Vale do Fundão a montante da Barreira 3. O reforço no referido dique apresenta como estrutura de partida a região a montante da Barragem Eixo 1 preenchida. Como referência, o volume aproximado da berma de reforço e preenchimento (estéril, arenoso e agregado) a jusante de Selinha é de 3.076.326,40m³ (obras concluídas).

Em relação à passagem de cheias, também visando ao longo prazo, o projeto de descaracterização prevê a implantação de sistema de canais de drenagem profunda e na superfície final do Dique Selinha, com a função de conduzir os fluxos captados na bacia de contribuição situada a montante desta estrutura, reduzindo o processo de infiltração para o interior dos depósitos e eliminando a formação de lago permanente.

15.2.4.3 Informar Todas as Alterações de Projetos Ocorridas no Período de Avaliação do Relatório de Acompanhamento, com Respectivas Justificativas (Item 1.2 – Subitem II do TR)

As informações referentes às alterações de projetos ocorridas no período de avaliação são apresentadas no Capítulo 4, Item 4.3 do presente relatório.

15.2.4.4 Caso as Obras de Descaracterização Ainda Não Tenham Sido Iniciadas, Informar as Ações e Obras Preparatórias Realizadas no Período, Tais Como: Realização de Estudos, Aquisição de Equip, Construção de Estruturas de Contenção a Jusante, por Exemplo (Item 1.2 – Subitem III)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- *O cronograma atualizado de projeto e início efetivo da descaracterização deverá ser apresentado (Item 1.2 – Subitem III).*

Este item não se aplica (N/A) ao Projeto de Descaracterização do Dique Selinha, uma vez que as obras estão finalizadas.

15.2.4.5 Descrever e Informar os Riscos Geológicos Geotécnicos Associados, Especificamente, a Implantação do Projeto de Descaracterização (Item 1.2 – Subitem IV)

As informações referentes aos riscos geológicos e geotécnicos associados, especificamente, à implantação do Projeto de Descaracterização, são apresentadas no Capítulo 4, Item 4.5 do presente relatório.

15.2.5 Obras de Descaracterização – Dique Selinha

15.2.5.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao item 1.3, subitens I ao XIV do Termo de Referência da FEAM.

15.2.5.2 Memorial Descritivo das Obras de Descaracterização da Barragem, Contendo os Seguintes Dados e Informações e Representações Gráficas em Escala Adequada (Item 1.3 – Subitem I do TR)

15.2.5.2.1 Memorial Descritivo e Desenhos das Estruturas Implantadas, Removidas ou Modificadas, ou Informações Equivalentes, Bem Como Dispositivos de Proteção Ambiental (Item 1.3 – Subitem I-a do TR)

Este item apresenta o descritivo das obras de descaracterização realizadas do Dique Selinha, com foco nas estruturas implantadas, incluído evidências do estágio atual da construção e dos dispositivos de proteção ambiental.

Memorial Descritivo – Selinha

O Programa de Descaracterização do Germano previu o reforço da estrutura do Dique Selinha, o preenchimento do Vale do Fundão e o sistema de drenagem superficial associado, incluindo a Barragem Eixo 1. Estas obras podem ser identificadas na figura 216.

As obras de aterro compactado de descaracterização desta estrutura (rejeito arenoso e estéril), com preenchimentos a montante da Barreira 3 / Seção AA (porção Vale do Fundão em Selinha), de implantação dos canais de drenagem em pedra argamassada, do sistema de drenagem superficial associado, bem como a proteção vegetal, foram concluídas.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 216: Identificação das Obras do Programa Descaracterização (Selinha)



A figura 217 exibe uma vista das obras concluídas na região a jusante dos diques Selinha e Sela Tulipa. O sistema de drenagem superficial em questão conduz o fluxo de água até os canais principais.

Figura 217: Região a Jusante de Selinha e Sela Tulipa – Obras Concluídas



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.2.5.3 Memorial Descritivo e Layout das Soluções Geotécnicas Empregadas Durante as Obras, Incluindo a Necessidade de Esgotamento da Água Acumulada no Interior da Barragem e, caso haja, da Infraestrutura de Apoio das Frentes de Obras (Item 1.3 – Subitem I-b do TR)


As soluções geotécnicas empregadas nas obras do Programa de Descaracterização do Germano também se aplicam ao Dique Selinha.

Essencialmente, a descaracterização de Selinha consiste de implantação de bermas de reforço a jusante da estrutura; reconformação da superfície final (*regrade*) no vale, também situado a jusante da estrutura, através da implantação de superfícies inclinadas, com caimentos direcionados a canais de drenagem especialmente dimensionados para evitar acúmulo permanente de água no reservatório; e, finalmente, implantação dos respectivos canais de drenagem, dimensionados para verter as cheias decorrentes da Precipitação Máxima Provável (PMP).

No Vale do Fundão, o manejo das águas é feito pelo sistema de drenagem superficial que vem sendo implantado desde 2018 para conduzir o fluxo aos canais de drenagem sobre o aterro compactado implantado, e até os canais periféricos do Eixo 1.

A figura 218 ilustra o *layout* do arranjo. As setas azuis representam o fluxo das águas através dos canais superficiais e as setas amarelas representam os canais de drenagem principais implantados.

Figura 218: Layout do Manejo das Águas – Vale do Fundão



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tendo em vista o longo prazo demandado para a implantação das obras de descaracterização do Dique Selinha, e também a necessidade de adoção de ações efetivas que garantiram a segurança da estrutura frente às temporadas chuvosas nos vários anos de obras, a Samarco concebeu um plano de chuvas para aplicação nos períodos chuvosos. A última versão do plano atualizado para o período entre outubro de 2024 e março de 2025 considera o sistema de drenagem superficial de Selinha finalizado e operável. O memorial descritivo é apresentado no Capítulo 5, subitem 5.2.1.3 do presente relatório e o referido plano é apresentado no Anexo 7.1 — Sistema de Drenagem _ Plano de Chuvas 24_25_AECOM na pasta “Anexo VII — Meio Ambiente”.

Figura 219: Anexo 7.1 - Plano de Chuvas 2024-2025



As obras de descaracterização do Dique Selinha encontram-se finalizadas. Os preenchimentos a montante da Barreira 3 / Seção AA (porção Vale do Fundão em Selinha) foram concluídas em 26/11/24 (ver atividade 5442A5970). A implantação da berma de reforço / contrapilhamento da estrutura foi finalizada em 22/12/24. A drenagem superficial em pedra argamassada, drenagem superficial e proteção vegetal foram concluídas em 31/12/24 (ver atividade 5442A6020). A *Punch List* da drenagem superficial e serviços de proteção vegetal foi finalizada em 15/02/25.

15.2.5.4 Descrição das Estruturas e Layout dos Sistemas de Controle Ambiental dos Efluentes Líquidos, Emissões Atmosféricas e Resíduos Sólidos Gerados no Canteiro de Obras e Infraestrutura de Apoio das Frentes de Obras (Item 1.3 – Subitem I-c do TR)

A descrição das estruturas e *layout* dos sistemas de controle ambiental dos efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos gerados no canteiro de obras e infraestrutura de apoio das frentes de obras são apresentados no Capítulo 5, subitem 5.2.3 do presente relatório.

15.2.5.5 Descrição das Ações de Movimentação de Terra, Incluindo Localização e Caracterização das Áreas de Empréstimo e Bota-Fora Utilizadas (Item 1.3 – Subitem I-d do TR)

A descrição das ações de movimentação de terra, incluindo localização e caracterização das áreas de empréstimo e bota-fora utilizadas, são apresentadas no Capítulo 5, subitem 5.2.4 do presente relatório.

15.2.5.6 Apresentar Levantamentos Topográficos e Batimétricos, Quando Couber, da Barragem no Estado Atual das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem II do TR)

Levantamentos Topográficos

Os levantamentos do estado atual do empreendimento estão contemplados no Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico Obras Descaracterização Germano na pasta “Anexo IV – Execução” do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 220: Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico

Anexo 4.1-Levant. Topografico Obras Descaract. Germano_Jun_25

Levantamentos Batimétricos

Este item não se aplica, pois no Complexo do Germano o curso d'água é superficial (não há reservatórios); assim sendo, não é possível realizar levantamentos batimétricos no Dique Selinha, incluindo o Vale do Fundão na região a montante da Barreira 3.

15.2.5.7 No Caso de Remoção do Maciço e do Reservatório, Apresentar as Medidas Adotadas Para a Execução Deste Procedimento e Um Quantitativo dos Materiais Retirados (Item 1.3 – Subitem III do TR)

Este item não se aplica, pois o Projeto de Descaracterização não prevê remoção dos maciços das estruturas, nem dos seus respectivos reservatórios.

15.2.5.8 Apresentar as Medidas Adotadas Para a Redução do Nível do Lençol Freático no Reservatório, Quando Couber, Bem Como Informar o Seu Nível no Estágio Atual das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem IV do TR)

As referidas medidas são apresentadas no Capítulo 5, subitem 5.2.7 do presente relatório.

15.2.5.9 Apresentar Análises de Estabilidade nas Condições Drenada e Não-Drenada, e Levando em Consideração as Solicitações Sísmicas Que Possam Atuar Sobre a Estrutura, Avaliando as Resistências de Pico e Residual Para a Geometria da Barragem na Atual Etapa da Obra (Item 1.3 – Subitem V do TR)

Nota: Os Fatores de Segurança mínimos a serem atendidos são de 1,5 para rupturas drenadas; 1,5 para rupturas não-drenadas na situação de pico, e 1,1 na situação residual. Ressalta-se que estes valores poderão ser revisados conforme as diretrizes técnicas emanadas de órgãos regulamentadores competentes.

As análises de estabilidade no período estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT537_R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT538_R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT539_R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 4 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 221: Recomendação 4 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

04	Apresentar os relatórios contemplando os estudos de análises de estabilidade relativos à Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), à Barragem do Eixo 1, e à Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Os relatórios contemplando os estudos de análises de estabilidade referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT481_R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT482_R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT483_R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT534_R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT535_R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT536_R00_Mar_25.

15.2.5.10 Apresentar o Andamento das Medidas de Estabilização e/ou Reforço Para Atingir no Mínimo os Fatores de Segurança Estabelecidos no item V, Bem Como das Medidas de Contingências Adotadas Caso a Estabilidade da Estrutura Durante as Obras Não Possa Ser Garantida (Item 1.3 – Subitem VI do TR)

Para as medidas de estabilização ou reforço visando a atingir 1,5 para condição drenada; 1,5 para condição não-drenada de pico, e 1,1 para a condição residual, informa-se:

- Todas as estruturas que integram o Programa Descaracterização do Germano possuem declaração de estabilidade. A declaração para o Dique Selinha é apresentada na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório.
- As obras de reforço do Dique Selinha foram iniciadas em novembro de 2022 com a implantação dos canais de drenagem em pedra argamassada e, na sequência, a primeira etapa do preenchimento do fundo do vale imediatamente a montante da Seção AA, bem como a execução dos ramais de drenagem. Esta etapa de obras foi concluída em 2023.
- Atualmente, as obras de descaracterização do Dique Selinha encontram-se finalizadas. Os preenchimentos a montante da Barreira 3 / Seção AA (porção Vale do Fundão em Selinha) foram concluídas em 26/11/24 (ver atividade 5442A5970). A implantação da berma de reforço / contrapilamento da estrutura foi finalizada em 22/12/24. A drenagem superficial em pedra argamassada, drenagem superficial e proteção vegetal foram concluídas em 31/12/24 (ver atividade 5442A6020). A *Punch List* da drenagem superficial e serviços de proteção vegetal foi finalizada em 15/02/25.

15.2.5.11 Apresentar o Andamento das Obras Para (Item 1.3 – Subitem VII)

a) Remoção das infraestruturas associadas à Barragem, exceto aquelas destinadas à garantia da segurança da estrutura (Item 1.3 – Subitem VII-a)

Apresentado no Capítulo 5, subitem 5.2.10 do presente relatório.

b) Reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais e subterrâneas para o reservatório (Item 1.3 – Subitem VII-b)

Apresentado no Capítulo 5, subitens 5.2.7 e 5.2.10 do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Plano de chuvas e dispositivos provisórios

A Samarco utiliza sistemas de drenagem definitivo e/ou provisório para manejo das águas superficiais. O manejo é apresentado nos Anexos 4.2 (Manejo das Águas de acordo com o Plano de Chuvas 2024-2025) e 4.3 (Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024-2025 - Final) na pasta “Anexo IV – Execução” do presente relatório. Importante ressaltar que as obras de drenagem definitiva de Selinha foram concluídas, atendendo às ações previstas para o plano de chuvas.

Figura 222: Anexos 4.2 (Manejo das Águas) e 4.3 (Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024-2025)



c) Garantir a estabilidade física e química de longo prazo das estruturas que permanecerem no local (Item 1.3 – Subitem VII-c)

As obras para garantir a estabilidade física e química de longo prazo do Dique Selinha estão em curso. Além do Dique Selinha, o reservatório da Barragem do Germano é composto do Barramento Principal, da estrutura associada Dique Sela Tulipa, de seu próprio reservatório e do novo canal de drenagem principal.

Estabilidade física do Dique Selinha

As obras de implantação da berma de reforço e do contrapilamento da estrutura, bem como a de preenchimento a montante da Barreira 3 (porção do Vale do Fundão em Selinha), previstas no projeto de descaracterização do Dique Selinha, encontram-se concluídas (ver figura 223). O volume total de aterro compactado (estéril e arenoso) e agregados é da ordem de 3.076.326,40m³, visando à estabilidade de longo prazo.

Figura 223: Berma de Reforço / Contrapilamento da Estrutura, Drenagens e Proteção Vegetal (Obras Concluídas)




PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Para melhor entendimento, a figura 224 apresenta o arranjo geral (ano 5), contemplando o Dique Selinha e demais estruturas com as respectivos quantidades de serviços realizados na implantação das obras de descaracterização, separados por região.


Figura 224: Ano 5 Arranjo Geral – Volumes (Estéril, Arenoso e Agregados) Finais por Região



Controle hidráulico

Neste aspecto, a montante dos diques Selinha e Sela Tulipa existe uma fração do *Regrade* total do reservatório do Germano associada à descaracterização destas estruturas. As áreas são indicadas nas figuras 225 (cor magenta) e 226 (tracejado amarela) representam o limite de bateria do *Regrade* que integra a descaracterização destes diques.

Figura 225: Delimitação da Área do Regrade Associada à Descaracterização dos Diques Selinha e Sela Tulipa



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Na área do *Regrade* indicada na figura 225 (cor magenta), o projeto de descaracterização previu a implantação de superfícies suavemente inclinadas voltadas para um sistema de canais de drenagem superficial especificamente concebido para coletar e transportar o fluxo decorrente da precipitação máxima provável (PMP) até o canal de aproximação do *Regrade* do reservatório do Germano e, em seguida, até o emboque do Canal de Drenagem Principal (CDP) da descaracterização da Barragem do Germano.

Como referência, a área total do reservatório da Barragem do Germano é de 2.963.806 m². Assim sendo, a superfície do *Regrade* a montante de Sela Tulipa e Selinha abrange área com aproximadamente 395.000 m², o que representa 13,5% da superfície total.

Nesta região, ao final da obra, a Samarco executou um volume de aterro compactado da ordem de 1.704.451,10m³, bem como a implantação dos respectivos canais de drenagem associados a esta área, o que elimina acúmulo permanente de água no local.

Figura 226: Regrade da Bacia Hidrológica dos Diques de Selinha e Sela Tulipa (Obras Concluídas)



Descaracterização do Dique Selinha

O cronograma das obras, considerando a tendência de antecipação para o corrente ano, é apresentado na figura 227.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 227: Cronograma das Obras de Descaraterização de Selinha (Obras Concluídas)

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442_22_06_2025	Descaracterização Barragem Germano - 22-06-2025	100%	100%	1701.88d	05/05/20 A	31/12/24 A	05/05/20	31/12/24	05/05/20	10/04/25
5442_22_06_2025.1	MARCOS DO PROJETO	0%	0%	1654.00d	21/06/20 A	31/12/24 A	21/06/20	31/12/24	21/06/20	10/04/25
5442_22_06_2025.1.1	GOVERNANÇA	0%	0%	0.00d	21/06/20 A	21/06/20 A	21/06/20	21/06/20	21/06/20	21/06/20
5442_22_06_2025.1.5	IMPLANTAÇÃO	0%	0%	0.00d	31/12/24 A	31/12/24 A	31/12/24	31/12/24	10/04/25	10/04/25
5442_22_06_2025.2	ENGENHARIA	100%	100%	758.20d	05/05/20 A	19/05/23 A	05/05/20	19/05/23	05/05/20	22/08/22
5442_22_06_2025.2.1	G1024 - BARRAGEM DO GERMANO	100%	100%	758.20d	05/05/20 A	19/05/23 A	05/05/20	19/05/23	05/05/20	22/08/22
5442_22_06_2025.2.1.1	G1000 - GERAL	100%	100%	238.60d	01/10/20 A	17/09/21 A	01/10/20	17/09/21	01/10/20	17/09/21
5442_22_06_2025.2.1.6	G102404005 - DIQUES DE SELA + EIXO 1	100%	100%	758.20d	05/05/20 A	19/05/23 A	05/05/20	19/05/23	05/05/20	22/08/22
5442_22_06_2025.3	SUPRIMENTOS	100%	100%	955.75d	11/04/22 A	22/11/24 A	11/04/22	22/11/24	11/04/22	22/11/24
5442_22_06_2025.3.2	MATERIAIS	100%	100%	955.75d	11/04/22 A	22/11/24 A	11/04/22	22/11/24	11/04/22	22/11/24
5442_22_06_2025.3.2.2	PACOTE G-MO-01A - MANTA GEOTEXTIL (FECHAMENTO BARRAGEM	100%	100%	38.00d	11/07/22 A	19/08/22 A	11/07/22	19/08/22	11/07/22	28/08/22
5442_22_06_2025.3.2.8	PACOTE G-MO-02F - CONTRATAÇÃO DE AGREGADOS - SELINHA	100%	100%	955.75d	11/04/22 A	22/11/24 A	11/04/22	22/11/24	11/04/22	22/11/24
5442_22_06_2025.3.3	EQUIPAMENTOS	100%	100%	70.00d	27/06/22 A	05/09/22 A	27/06/22	05/09/22	27/06/22	29/09/22
5442_22_06_2025.3.3.2	PACOTE G-FI-00B - INSTRUMENTOS DE BARRAGEM - SELINHA SELA	100%	100%	70.00d	27/06/22 A	05/09/22 A	27/06/22	05/09/22	27/06/22	29/09/22
5442_22_06_2025.4	CONSTRUÇÃO	100%	100%	905.00d	11/07/22 A	31/12/24 A	11/07/22	31/12/24	11/07/22	10/04/25
5442_22_06_2025.4.5	Descaracterização do Dique de Selinha, SelaTulipa e Preenchin	100%	100%	905.00d	11/07/22 A	31/12/24 A	11/07/22	31/12/24	11/07/22	10/04/25
5442_22_06_2025.4.5.1	G1000 - GERAL	100%	100%	905.00d	11/07/22 A	31/12/24 A	11/07/22	31/12/24	11/07/22	22/11/24
5442_22_06_2025.4.5.2	ÁREA 5442-24 - BARRAGEM DO GERMANO	100%	100%	784.50d	08/11/22 A	31/12/24 A	08/11/22	31/12/24	01/04/23	10/04/25
5442_22_06_2025.4.5.2.1	SUBÁREA 5442-24-05 - BERMA DE REFORÇO SELINHA	100%	100%	784.50d	08/11/22 A	31/12/24 A	08/11/22	31/12/24	01/04/23	10/04/25
5442_22_06_2025.4.5.2.1.1	GERAL	100%	100%	518.94d	13/12/22 A	15/05/24 A	13/12/22	15/05/24	01/04/23	27/08/23
5442_22_06_2025.4.5.2.1.2	PREENCHIMENTO MONTANTE DA BARREIRA 3	100%	100%	459.56d	04/07/23 A	28/08/24 A	04/07/23	28/08/24	19/06/23	30/09/24
5442_22_06_2025.4.5.2.1.3	PREENCHIMENTO MONTANTE DA SEÇÃO A-A	100%	100%	659.13d	06/02/23 A	26/11/24 A	06/02/23	26/11/24	23/05/23	30/09/24
5442_22_06_2025.4.5.2.1.4	CONTRAPILAMENTO (CORDAMENTO)	100%	100%	124.75d	20/08/24 A	22/12/24 A	20/08/24	22/12/24	27/07/24	06/11/24
5442_22_06_2025.4.5.2.1.5	DRENAGEM	100%	100%	784.50d	08/11/22 A	31/12/24 A	08/11/22	31/12/24	18/09/23	10/04/25

15.2.5.12 Apresentar a Análise dos Resultados das Inspeções Visuais Realizadas na Estrutura no Período Avaliado em Relação às Obras de Descaracterização, Informando a Periodicidade das Inspeções (Item 1.3 – Subitem VIII do TR)

Nota: Deverão ser apresentadas as medidas adotadas para corrigir as anomalias registradas durante as inspeções visuais, inclusive aquelas iniciadas em períodos anteriores ao do relatório apresentado, até sua efetiva conclusão.

As análises dos resultados das inspeções visuais realizadas no período estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT537-R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT538-R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT539-R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 5 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 228: Recomendação 5 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

05	Apresentar os relatórios de inspeção mensais relativos à Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), à Barragem do Eixo 1, e à Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	---	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios contemplando as inspeções visuais referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- ✓ G102400-O-2RT481-R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT482-R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT483-R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT534-R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT535-R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT536-R00_Mar_25.

15.2.5.13 Apresentar as Leituras da Instrumentação Instalada na Barragem, Informando a Periodicidade Adotada Para as Leituras e a Relação dos Níveis Registrados Pelos Instrumentos Com os Níveis de Controle de Segurança Estabelecidos Para a Estrutura (Item 1.3 – Subitem IX do TR)

As leituras da instrumentação no período instaladas estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT537_R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT538_R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT539_R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 6 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 229: Recomendação 6 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

06	Apresentar os relatórios técnicos contendo as leituras da instrumentação instalada na Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), na Barragem do Eixo 1, e na Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios técnicos contemplando as leituras da instrumentação instalada, referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT481_R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT482_R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT483_R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT534_R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT535_R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT536_R00_Mar_25.

15.2.5.14 Apresentar as Leituras e a Avaliação de Desempenho da Instrumentação Empregada Especificamente, Caso Houver, para o Período das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem X)

As leituras e análises de desempenho da instrumentação empregada para o período das obras de descaracterização estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL N°14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- ✓ G102400-O-2RT537_R00_Abr_25;
- ✓ G102400-O-2RT538_R00_Mai_25;
- ✓ G102400-O-2RT539_R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 7 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 230: Recomendação 7 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

07	Apresentar os relatórios técnicos contendo as leituras da instrumentação empregada especificamente para o período das obras de descaracterização na Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), na Barragem do Eixo 1, e na Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios técnicos contemplando as leituras de instrumentação empregada especificamente para o período das obras de descaracterização referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

- ✓ G102400-O-2RT481_R00_Out_24;
- ✓ G102400-O-2RT482_R00_Nov_24;
- ✓ G102400-O-2RT483_R00_Dez_24;
- ✓ G102400-O-2RT534_R00_Jan_25;
- ✓ G102400-O-2RT535_R00_Fev_25;
- ✓ G102400-O-2RT536_R00_Mar_25.

15.2.5.15 Informar os Períodos de Interrupção dos Trabalhos, Devidamente Justificados (Ex.: Período Chuvoso), se Pertinente (Item 1.3 – Subitem XI)

A quantidade de horas praticáveis para as atividades é apresentada no Capítulo 5, subitem 5.2.14 do presente relatório.

Dique Selinha (Histórico)

A execução das obras seguiu conforme o plano de ação implementado (plano B das obras da Barragem do Germano para o período chuvoso 2022-2023), em função da inviabilidade das obras do plano A (Dique Sela Tulipa), em decorrência das chuvas naquela frente.

O plano para o período chuvoso 2023-2024 foi implementado com o objetivo de manter o sistema de drenagem operável e os recursos de terraplenagem mobilizados no período chuvoso. Considerando a declividade dos acessos / topografia, nas ocorrências de chuvas que inviabilizaram a continuidade das obras do Dique Selinha, os recursos foram direcionados às obras do *Regrade* (plano C da Barragem). Estas ações evitaram a desmobilização / remobilização dos recursos, que estão escassos na região.

As obras de implantação dos ramais de drenagem a montante da Barreira 3 e na Seção AA, bem como a execução da primeira etapa dos canais em pedra argamassada, foram concluídas em 2023.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Durante os períodos chuvosos 2023–2024 e 2024–2025, as obras de preenchimento a montante da Barreira 3 e na Seção AA, bem como a drenagem superficial, foram executadas conforme praticabilidade e estão atualmente finalizadas.

O plano para o período chuvoso 2024-2025 para o Dique Sela Tulipa foi elaborado e considera o sistema de drenagem definitivo operável conforme previsto no projeto de implantação.

15.2.5.16 Apresentar os Protocolos Adotados Para Garantir a Segurança dos Trabalhadores Durante as Obras (Item 1.3 – Subitem XII do TR da FEAM)

Apresentados no Capítulo 11 – Saúde e Segurança do Trabalho do presente relatório. Os protocolos da documentação de referência constam na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

Figura 231: Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho

	Anexo 6.3-PCRC-Padrão_Control_Risco_Critico
	Anexo 6.1-Edital_SST_Contratação_Fornecedores Rev.5.pdf
	Anexo 6.2-APP-Análise Preliminar Perigos_Rev8.pdf
	Anexo 6.4-Índice_Procedimentos_Segurança.pdf

15.2.5.17 Descrição e Registros Fotográficos de Cada Atividade já Concluída ou Em Andamento Para a Descaracterização da Barragem (Item 1.3 – Subitem XIII do TR da FEAM)

Apresentados no subitem 15.2.13 – Relatório Fotográfico do Andamento das Obras do Dique Selinha do presente apêndice.

15.2.5.18 Apresentar Cronograma Atualizado, Detalhando a Data de Início e Conclusão (ou Previsão) de Cada Atividade Realizada ou a Realizar Para a Descaracterização da Estrutura. Detalhar as Atividades Realizadas no Período, Percentual de Avanço da Descaracterização, Cumprimento das Ações Previstas na Respectiva Etapa do Cronograma (Item 1.3 – Subitem XIV do TR)

Atendimento a Nota Técnica 17/01/23, Item 4 – Recomendações da AECOM

Figura 232: Item 4 – Recomendações da AECOM – 17/01/23

04	Incluir no relatório o cronograma no formato de diagrama de Gantt, com as atividades previstas no escopo, bem como a indicação do caminho crítico do Programa de Descaracterização em adição e/ou substituição ao cronograma esquemático apresentado no Item 4.3.	3	1	2	6	Alerta
----	---	---	---	---	---	--------

O cronograma detalhado das obras, contemplando todo o escopo necessário à completa execução da descaracterização do Dique Selinha, é apresentado como anexo na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 233: Anexo 2 – Cronograma das Obras de Descaracterização de Selinha

Anexo 2.6-Cronog. Detalhado Dique Selinha_Status_2025_06_22 (final)

Atividades Realizadas no Período

Não mais aplicável à Selinha, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

Cumprimento das Ações Previstas na Respectiva Etapa do Cronograma

Não mais aplicável à Selinha, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.2.6 Escopo das Obras de Descaracterização – Dique Selinha

15.2.6.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente à Nota Técnica 17/01/23, Item 9 – Recomendações da AECOM.

15.2.6.2 Escopo do Projeto

O plano de execução do Dique Selinha foi dividido de acordo com as três etapas principais: Engenharia, Suprimentos e Construção.

Engenharia (status: 100% concluída):

- Estudos e Levantamento de Campo – **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Básico – **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – **CONCLUÍDO ✓**.

Suprimentos (status: 100% concluída):

- Serviço: Obras Cíveis /Terraplenagem – **CONCLUÍDO ✓**;
- Materiais: Agregados – **CONCLUÍDO ✓**;
- Equipamentos: Instrumentos de Barragem – **CONCLUÍDO ✓**.

Construção (status: 100% concluída):

- Serviços preliminares, limpeza e acessos – etapa 2023 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Inst. instrumentação a montante da barreira 3 e seção AA – **CONCLUÍDO ✓**;
- Ramal de drenagem a montante da barreira 3 e seção AA – **CONCLUÍDO ✓**;
- Preenchimento a montante da barreira 3 – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Preenchimento a montante da barreira 3 – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Preenchimento a montante da barreira 3 – etapa 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Preenchimento a montante da seção AA – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Preenchimento a montante da seção AA – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Instalação da instrumentação do contrapilamento de Selinha – **CONCLUÍDO ✓**;
- Contrapilamento do Dique Selinha – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canais de drenagem em pedra argamassada - etapa 2023 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canais de drenagem em pedra argamassada - etapa 2024 – **CONCLUÍDO ✓**.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.2.7 Desempenho da Execução – Dique Selinha


15.2.7.1 Objetivo do Capítulo

Atendimento ao item 1.3, subitem XIV do Termo de Referência da FEAM e às recomendações 3 e 4 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/2023.

15.2.7.2 Avanço Físico Acumulado do Dique Selinha – Previsto x Realizado

Apresentado na EAP da Figura 234. A estrutura está dividida em Engenharia, Suprimentos e Construção.

Figura 234: EAP do Projeto de Descaracterização do Dique Selinha

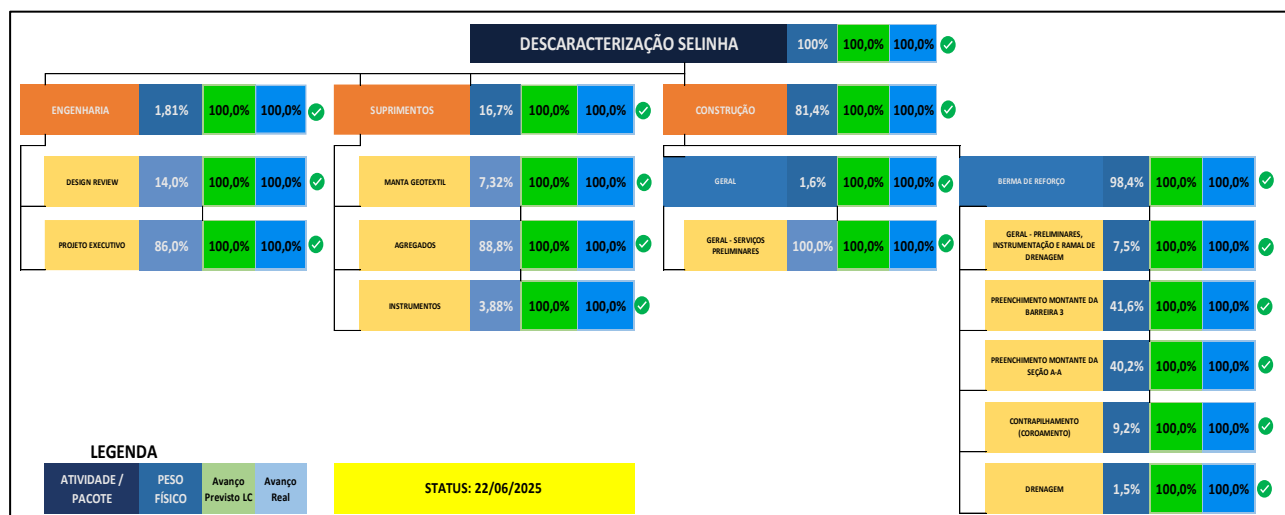

15.2.7.3 Tabela Resumo de Desempenho no Trimestre e Acumulado

Tabela 71: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados No Período – Dique Selinha

Programa Descaracterização	Etapa	Peso % (\$) IPR 2021	Peso % (\$) L. Corrente Até Ago/21	2º Trimestre 2025 %			Acumulado Geral %		
				Planejado	Real	Desvio Corrente	Planejado	Real	Desvio
				Corrente			Corrente		Corrente
Descaracterização do Dique Selinha	Engenharia	1,81%	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Suprimentos	16,74%	16,74%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Construção	81,44%	81,44%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Total	11,01%	11,01%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Nota: Etapa de obras de descaracterização finalizada. Atualmente, a estrutura encontra-se na etapa de monitoramento ativo.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL N°14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




15.2.7.4 Desempenho do Projeto de Descaracterização – Dique Selinha

Curva S Geral da Descaracterização – Dique Selinha

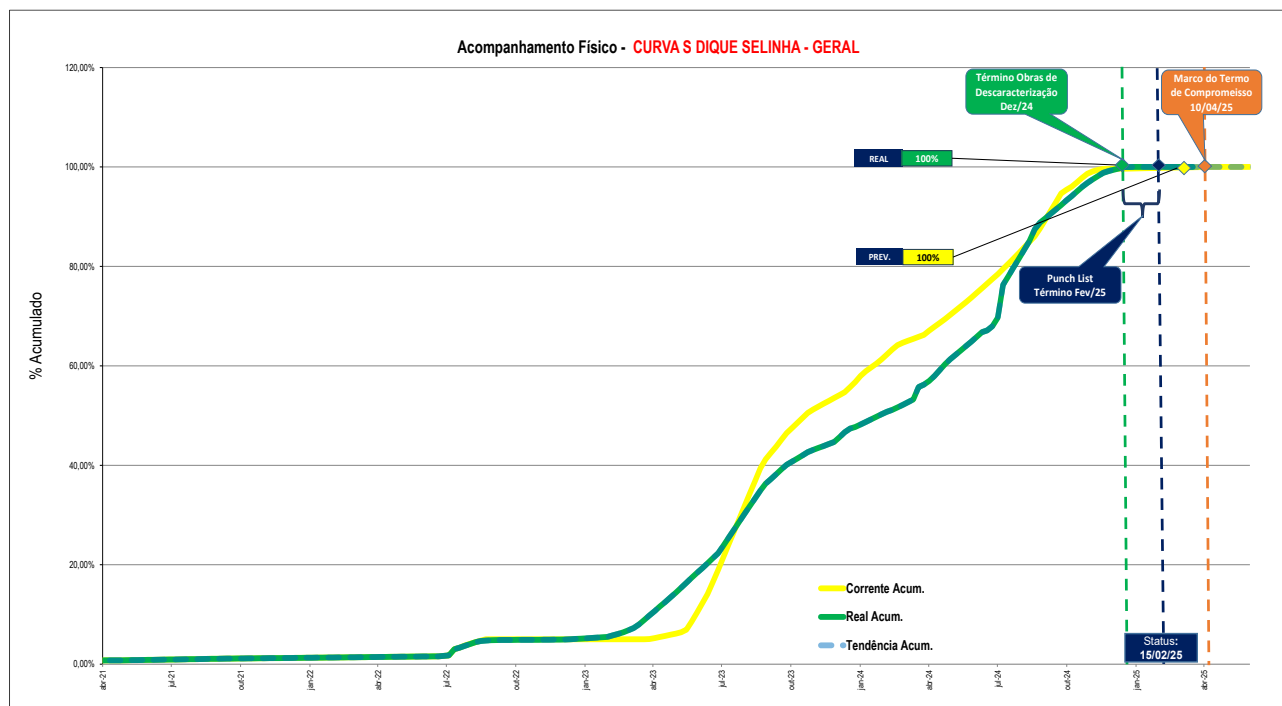

Curva S Geral da Construção – Dique Selinha

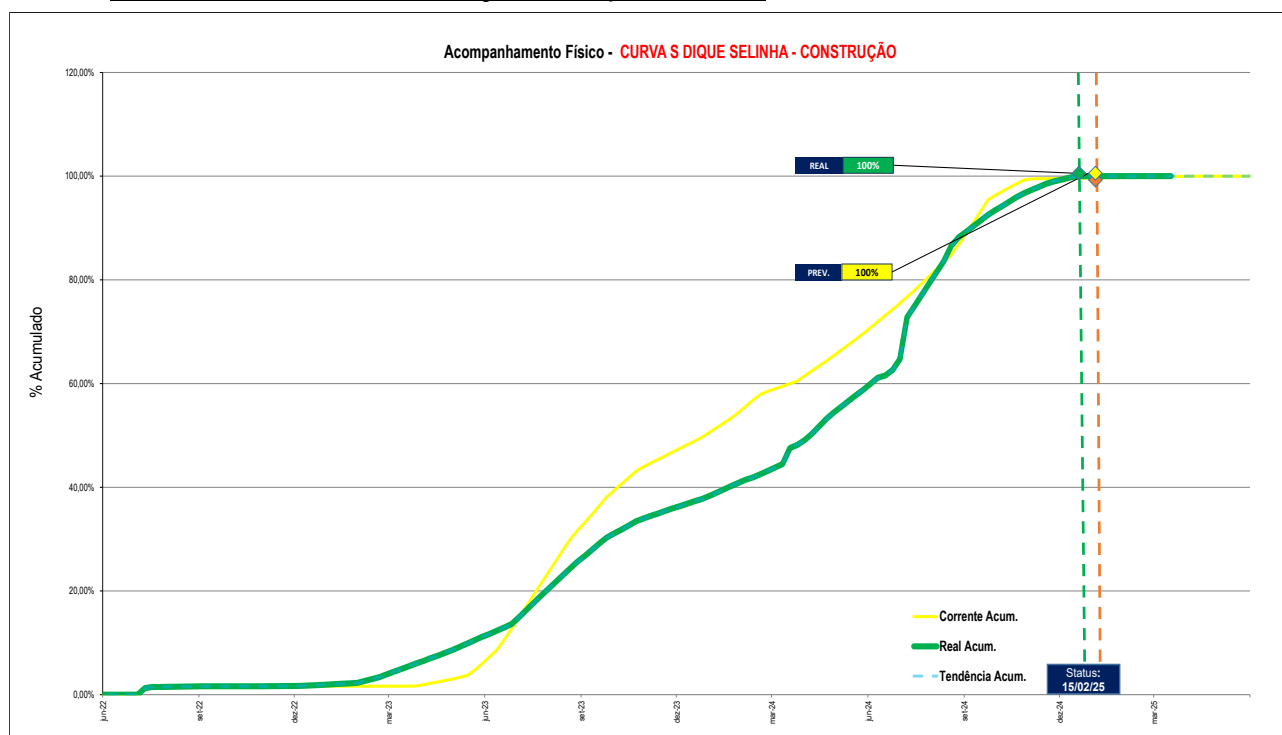


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Curva S Geral de Suprimentos – Dique Selinha

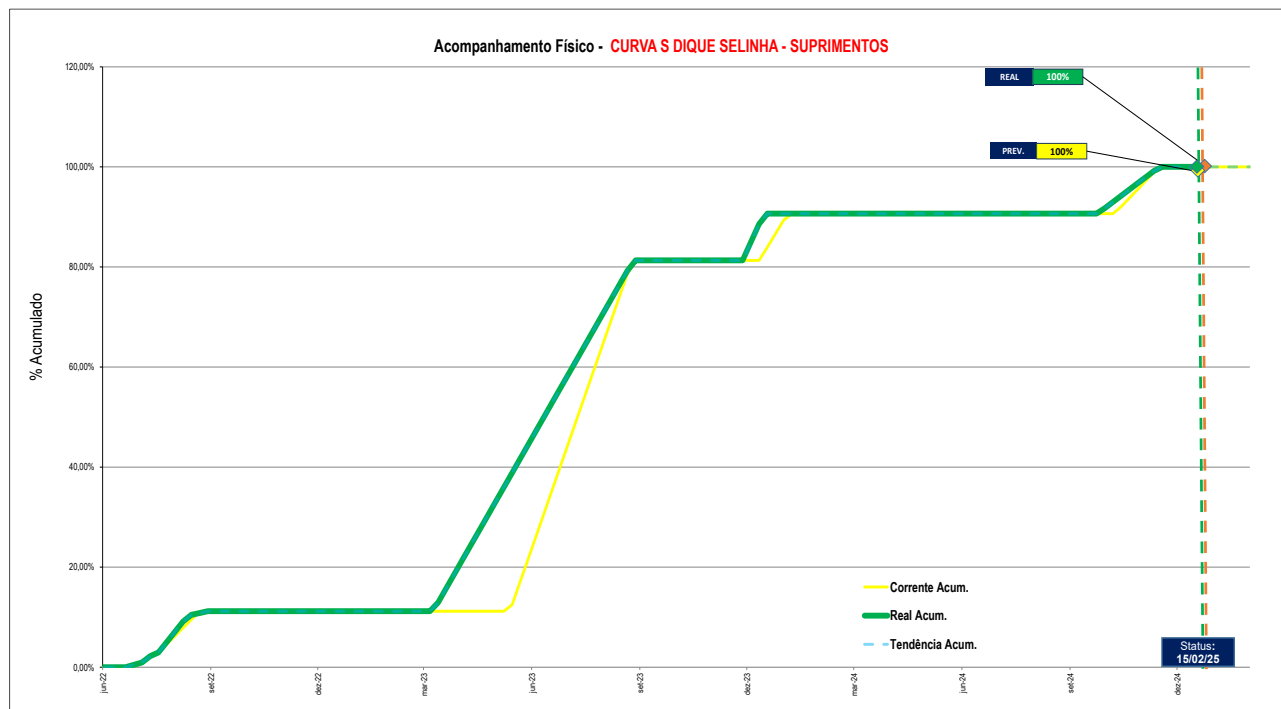

Curva S Geral da Engenharia – Dique Selinha

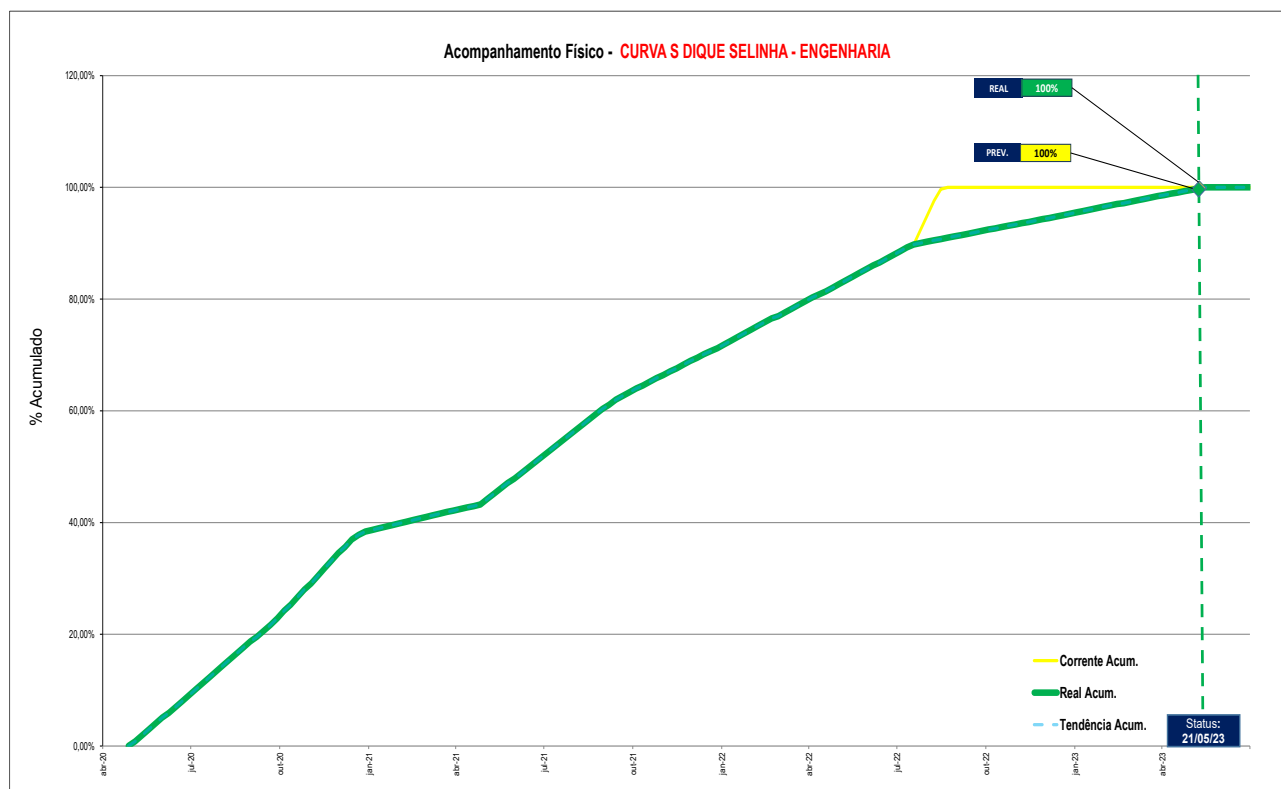

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.2.7.5 Cronograma Detalhado – Descaracterização do Dique Selinha
Disponibilizado na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

Figura 235: Cronogramas da Descaracterização do Dique Selinha

Anexo 2.6-Cronog. Detalhado Dique Selinha_Status_2025_06_22 (final)

15.2.7.6 Caminho Crítico

Não mais aplicável à Selinha, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.2.7.7 Análise do Caminho Crítico – Dique Selinha

Não mais aplicável à Selinha, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.2.8 Desempenho da Construção – Dique Selinha

15.2.8.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao Item 1.3, subitem XIV do Termo de Referência da FEAM e às recomendações 2, 6 e 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23.

15.2.8.2 Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes da Construção

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.2.8.3 Atividades Principais – Obras Executadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

Descaracterização do Dique Selinha
• Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. • Monitoramento ativo da estrutura pós-obra.

15.2.8.4 Atividades Principais – Obras Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

Descaracterização do Dique Selinha
• Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. • Monitoramento ativo da estrutura pós-obra.

Nota: O monitoramento ativo entra em sua fase específica de confirmar as premissas de projeto e sazonalidade hidrogeotécnica, uma vez que todas as configurações de obras de descaracterização do Dique Selinha foram atingidas no ano de 2024.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




15.2.8.5 Atividades Principais – Obras Previstas para o 2º Trimestre de 2025 no Relatório Anterior x Realizadas

Tabela 72: Avaliação das Atividades do Dique Selinha Realizadas no Trimestre x Planejadas

ATIVIDADES PREVISTAS NO RT ANTERIOR	STATUS DA ATIVIDADE	COMENTÁRIOS
Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal.	Rotina	Conforme planejamento.
Monitoramento ativo da estrutura pós-obra.	Rotina	Conforme planejamento.

15.2.8.6 Quantidades dos Serviços em Andamento

Gráfico 49: Status dos Aterros a Montante da Barreira 3, Seção AA e Contrapilamento (Concluídos)



15.2.8.7 Histogramas das Obras (Histórico)

As forças de trabalho indireta e direta, bem como os equipamentos, estão inclusos nos histogramas do Contrato 4300000595 – Consórcio MRF, apresentado no Capítulo 8, subitem 8.7.9 do presente relatório.

15.2.9 Desempenho de Suprimentos – Dique Selinha

15.2.9.1 Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes de Suprimentos

Não mais aplicável à Selinha, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.2.9.2 Atividades Principais de Suprimentos Executadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

Não mais aplicável à Selinha, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.2.9.3 Atividades Principais de Suprimentos Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

Não mais aplicável à Selinha, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.2.9.4 Principais Materiais – Fornecimento

Não mais aplicável à Selinha, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.2.10 Desempenho da Engenharia – Dique Selinha

Além do atendimento ao Termo de Compromisso, este item também se destina a atender às Recomendações 2, 6, 7 e 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23.

Os itens relacionados à integração entre as engenharias, tramitação de documentação técnica e registros de adequações são apresentados no Capítulo 10, Itens 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, respectivamente, do presente relatório.

As listas dos projetos revisados e aprovados para atendimento à Recomendação 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23 constam na pasta “Anexo III – Engenharia” do presente relatório.

O desenvolvimento da engenharia do Projeto de Descaracterização do Dique Selinha foi concluído em maio de 2023.

15.2.10.1 Atividades Principais de Engenharia Realizadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

Descaracterização Dique Selinha
Acompanhamento do monitoramento ativo da estrutura pós-obras.

15.2.10.2 Atividades Principais de Engenharia Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

Descaracterização Dique Selinha
Acompanhamento do monitoramento ativo da estrutura pós-obras.

15.2.11 Saúde e Segurança do Trabalho

Tem a finalidade de atender integralmente ao Item 1.3, subitem XII do Termo de Referência da FEAM.

Os assuntos relacionados a Saúde e Segurança do Trabalho são apresentados no Capítulo 11 do presente relatório.

15.2.12 Aspectos Ambientais das Obras de Descaracterização

Para atender integralmente ao Item 1.3, subitens I a V do Termo de Referência da FEAM.

Também serve para informar o andamento das obras do Projeto de Descaracterização do Dique Selinha no aspecto do controle ambiental, bem como apresentar as ações implementadas e os resultados obtidos na gestão ambiental no período.

Os aspectos ambientais das obras de descaracterização são apresentados no Capítulo 12 do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

15.2.13 Relatório Fotográfico do Andamento das Obras – Dique Selinha

15.2.13.1 Berma de Reforço / Contrapilamento, Drenagem Superficial e Proteção Vegetal da Estrutura



Foto 16: Dique Selinha - Berma de Reforço, Drenagem Superficial e Proteção Vegetal Concluídas

15.2.13.2 Região a Montante da Seção AA (Vale do Fundão)




Foto 17: Vale do Fundão (Porção em Selinha) – Preenchimento, Drenagem Superficial e Proteção Vegetal Concluídos

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.2.13.3 Vista Geral de Selinha



Foto 18: Vista Geral da Região do Dique Selinha, Montante da Barreira (Obras Concluídas)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.3 APÊNCICE III – Descaracterização da Barragem Eixo 1

15.3.1 Objetivo do Apêndice III

Informar detalhadamente sobre a etapa de obras de descaraterização, bem como o andamento da etapa de monitoramento ativo da Barragem Eixo 1, estrutura geotécnica situada a jusante do Vale do Fundão e ponto de partida para a descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha, estruturas associadas ao reservatório da Barragem do Germano, a fim de garantir a estabilidade de longo prazo, bem como a reconformação final do Vale do Fundão (*regrade*) a montante do Eixo 1 para implantação da Pilha de Disposição de Estéril e Rejeitos Arenosos – PDER Eixo 1.

15.3.2 Contextualização da Barragem Eixo 1

A Barragem Eixo 1 está localizada a jusante dos diques Sela Tulipa e Selinha, no extremo oeste do Vale do Fundão. Sua implantação teve o objetivo de conter o rejeito remanescente, após o colapso da Barragem do Fundão, evitando que ocorra o carreamento a jusante.

O barramento foi projetado pela BVP Engenharia em 2018 e construído em enrocamento com núcleo argiloso, apresentando altura máxima de 41,0m, inclinação do talude de jusante de 1,8H:1,0V, crista na elevação 820,3m, comprimento de 338,0m e largura de 38,0m.

As obras de implantação do barramento foram divididas em duas fases:

- Primeira fase (2018)
Construção da barragem até a elevação 801,5m; execução de canal provisório com soleira na elevação 799,5m para adequar a estrutura ao período chuvoso 2018-2019. Na sequência, foram elaborados “As-Built” parcial da estrutura e Projeto Executivo para retomada das obras da segunda fase no ano seguinte.
- Segunda fase (2019)
Implantação do extravasor da Barragem Eixo 1 com emboque na elevação 817,0m, localizado na ombreira direita do barramento; coroamento na elevação 820,3m com formação de reservatório na elevação 817,0m (NA Normal - soleira do extravasor) e na elevação 820,2m (NA máximo *maximorum* associado à passagem da PMP).

A Barragem Eixo 1 integra o projeto de descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha, considerando como ponto de partida:

- implantação da crista da estrutura na elevação 820,0m;
- reservatório na elevação 817,0m;
- preenchimento da região entre a ensecadeira e o Eixo 1, utilizando rejeito arenoso disposto mecanicamente, até a elevação 809,0m.

O projeto de descaracterização foi desenvolvido pela BVP Engenharia e a implantação das obras foi estruturada em 5 anos. Resumidamente, a implantação compreendeu as seguintes obras:

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Ano de 2020:

- Preenchimentos entre do Eixo 1 e a ensecadeira principal até elevação 817 m;
- Preenchimentos a montante da ensecadeira principal até elevação 817 m;
- Execução de ensecadeira até a elevação 822 m;
- Adequação das paredes do extravasor do Eixo 1;
- Obras do plano de chuvas 2020/2021.

Ano de 2021

- Implantação do colchão drenante entre o Eixo 1 e a ensecadeira principal;
- Preenchimentos na região da ensecadeira da Vale;
- Preenchimentos e ramais de drenagem a montante da ensecadeira principal;
- Obras de preenchimentos a jusante do Eixo 1;
- Obras do plano de chuva 2021/2022.

Ano de 2022

- Obras do canal da ombreira esquerda do Eixo 1;
- Prolongamento do colchão drenante;
- Proteção do colchão drenante e implantação dos ramais de drenagem principal e secundários.

Ano de 2023

- Preenchimentos a montante do Eixo 1 até as elevações 825 m e 833 m;
- Conexão e prolongamento do colchão drenante na elevação 825 m;
- Implantação dos ramais de drenagem principal e secundários;
- Implantação dos canais de drenagem superficial principal e secundários.

Ano de 2024:

- Conclusão da proteção do prolongamento do colchão drenante;
- Conclusão da conexão do colchão drenante na elevação 825 m;
- Conclusão da implantação dos ramais secundários;
- Conclusão dos preenchimentos entre as elevações 825,0m e 830,0m (Eixo 1 – Barreira 4) e 830,0m e 833,0m (a montante da Barreira 4);
- Conclusão dos canais de drenagem em pedra argamassada e canal da obreira esquerda; e
- Instalação de instrumentos.

Com intuito de permitir a transição de função da estrutura Eixo 1 de barragem para pilha, foi implantado um novo canal de drenagem (definitivo) na ombreira esquerda do Eixo 1. Para execução da calha do novo canal, foi realizado o revestimento em blocos pré-moldados de concreto. O emboque e a bacia de dissipação foram implantados em concreto estrutural moldado in-loco.

Atualmente, as obras de descaracterização da Barragem encontram-se finalizadas. As obras de preenchimentos a montante do Eixo 1 / Barreira 4 (porção Vale do Fundão da

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Barragem Eixo 1) foram finalizadas em 10/10/24 (ver atividade 5442A9240), do ramal de drenagem subsuperficial principal foram concluídas em 20/10/24 (ver atividade 5442A9510), dos ramais de drenagem subsuperficial secundários e canais das obreiras esquerda / direita encerradas em 26/11/24 (ver atividades 5442A8990 e 5442A6310). As obras do Eixo 1, contemplando o colchão drenante, foram concluídas em 30/12/24 (ver atividade 5442A6260) e dos canais de drenagem superficial em pedra argamassada finalizadas em 31/12/24 (ver atividade 5442A6290). A *Punch List* da drenagem superficial e serviços de proteção vegetal foi finalizada em 15/02/25.

Com isso, a Samarco concluiu as obras de descaracterização desta estrutura que integra a descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha, antecipadamente em relação à respectiva previsão de conclusão (03/06/25) que consta no Termo de Compromisso.

Ademais, a Samarco protocolou em janeiro de 2025, junto à FEAM, o relatório de conclusão das obras de descaracterização da Barragem Eixo 1.

15.3.3 Identificação

- 15.3.3.1 Nome da Barragem e da Mina, Conforme Bancos de Dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e da Agência Nacional de Mineração – ANM, Quando Couber (Item 1.1 – Subitem I do TR da FEAM)

Tabela 73: Identificação da Estrutura da Barragem Eixo 1

Nome da Estrutura	Barragem Eixo 1
Mina	Mina do Germano

- 15.3.3.2 Coordenadas Geográficas do Ponto Central da Barragem Antes do Início das Obras de Descaracterização, Referenciadas no Datum SIRGAS-2000 (Item 1.1 – Subitem II do TR da FEAM)

A Barragem Eixo 1 é o ponto de partida para a descaracterização dos diques de Sela Tulipa e Selinha e está situada na Mina do Germano, ou “Complexo do Germano”. As coordenadas geográficas da estrutura indicam o ponto central da crista da barragem, antes do início das obras de descaracterização, referenciadas no Datum SIRGAS-2000 do cadastro SIGBM, conforme a tabela 74.

Tabela 74: Coordenadas da Barragem Eixo 1

Latitude	-20°12'37.720"
Longitude	-43°27'36.410"

A localização e o acesso do Complexo do Germano são apresentados no Capítulo 3, item 3.3 do presente relatório.

O acesso à Barragem Eixo 1 pode ser realizado a partir da portaria da Barragem do Germano, localizada na margem direita da rodovia MG-129, sentido Mariana para Catas Altas. Da portaria, a Barragem Eixo 1 pode ser acessada por vias internas da Samarco conforme indicado na figura 236.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 236: Mapa de Localização e acesso à Barragem Eixo 1 no Complexo do Germano



15.3.3.3 Matriz de Classificação, com Base nos Critérios Estabelecidos nos Anexos I a IV do Decreto 48.140, de 25 de Fevereiro de 2021 (Item 1.1 – Subitem III do TR da FEAM)

A matriz de classificação da Barragem Eixo 1, apresentada na tabela 75, foi reavaliada pelas auditorias de inspeção, monitoramento da instrumentação e análise de segurança realizadas no período e mantida conforme a última avaliação realizada pela projetista BVP em 10/03/2025 e aprovada em 24/03/2025, em conformidade com a legislação pertinente (Decreto Estadual 48.140 de 25 de fevereiro de 2021).

Tabela 75: Matriz de Classificação da Barragem Eixo 1

Categoria de Risco - Resultado Da Avaliação: Baixo	
Resultado da Pontuação Total do CRI do Barragem Eixo 1 = 6 → Referência: CRI ≤ 37	
Potencial de Dano Ambiental - Resultado Da Avaliação: Alto	
Resultado da Pontuação Total do PDA do Barragem Eixo 1 = 20 → Referência: PDA ≥ 13	
Características Técnicas (CT) - Resultado Da Avaliação: $\sum CT = 6$	
Altura Atual (a)	41m máximo → 30m < Altura ≤ 60m (4)
Comprimento (b)	388m → 200 < Comprimento ≤ 600m (2)
Vazão de Projeto (c)	CMP (Cheia Máxima Provável) ou Decamilenar (0)
Método Construtivo (d)	Etapa única (0)
Auscultação (e)	Existe instrumentação de acordo com o projeto técnico (0)
Estado de Conservação (EC) - Resultado Da Avaliação: $\sum EC = 0$	
Confiabilidade das Estruturas Extravasoras (f)	Estruturas civis bem mantidas e em operação normal / barragem sem necessidade de estruturas extravasoras (0)
Percolação (g)	Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem (0)
Deformações e Recalques (h)	Não existem deformações e recalques com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (0)
Deterioração dos Taludes / Paramentos (i)	Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva (0)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Plano de Segurança da Barragem (PSB) - Resultado Da Avaliação: $\sum PS = 0$	
Documentação de Projeto (j)	Projeto executivo e "como construído" (0)
Estrutura Organizacional e Qualificação dos Profissionais na Equipe de Segurança da Barragem (k)	Possui unidade administrativa com profissional técnico qualificado responsável pela segurança da barragem (0)
Manuais de Procedimentos para Inspeções de Segurança e Monitoramento (l)	Possui manuais de procedimentos para inspeção, monitoramento e operação (0)
Plano de Ação Emergencial - PAE (quando exigido pelo órgão fiscalizador) (m)	Possui PAE (0)
Relatórios de inspeção e monitoramento da instrumentação e de Análise de Segurança (n)	Emite regularmente relatórios de inspeção e monitoramento com base na instrumentação e de Análise de Segurança (0)
Potencial de Dano Ambiental (PDA) - Resultado Da Avaliação: $\sum PDA = 20$	
Volume Total do Reservatório (a)	810.000 m ³ → MUITO PEQUENO ≤ 1 milhão m ³ (1)
Existência de população a jusante (b)	EXISTENTE (Existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem; portanto, vidas humanas poderão ser atingidas) (10)
Impacto ambiental (c)	SIGNIFICATIVO (Área afetada a jusante da barragem apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, excluídas APPs, e armazena apenas resíduos inertes (Classe II B segundo a NBR 10.004 da ABNT) (6)
Impacto socioeconômico (d)	MÉDIO (Existe moderada concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância socioeconômico – cultural na área afetada a jusante da barragem) (3)
Enquadramento - Resultado Da Avaliação: Classe B	
Categoria de Risco	Baixo
Potencial de Dano Ambiental	Alto

15.3.3.4 Identificação do Empreendimento com Respectiva Razão Social, CNPJ, Endereço, Nome e Telefone do Representante Legal para Contato (Item 1.1 – Subitem IV do TR da FEAM)

Tabela 76: Identificação do Empreendimento – Barragem Eixo 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	
Nome da estrutura	BARRAGEM EIXO 1
Finalidade	A Barragem Eixo 1 tem por objetivo conter o rejeito remanescente no Vale do Fundão, evitando que ocorra o seu carreamento a jusante.
Empreendedor	Samarco Mineração S.A, Em Recuperação Judicial
CNPJ	16.628.281/0003-23
Endereço Mina do Germano	Rodovia MG-129 s/n, Zona Rural - Mariana/MG - CEP: 35.420-970
Endereço Sede Administrativa	Ed. das Américas, Rua Paraíba, 1.122 - Andares 9º, 19º e 23º - Funcionários Belo Horizonte/MG CEP 30.130-141
Telefone Sede Administrativa	(31) 3559-5000
Diretoria	Gerência de Geotecnia
Complexo	Germano
Mina	Germano
Município	Mariana
Estado	Minas Gerais
Tipo de Minério	Ferro

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.3.3.5 Identificação do Empreendedor com Respectiva Razão Social, CNPJ, Endereço, Nome e Telefone do Representante Legal para Contato (Item 1.1 – Subitem V do TR da FEAM)

Tabela 77: Identificação do Empreendedor – Barragem Eixo 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR	
Razão Social	Samarco Mineração S.A, Em Recuperação Judicial
CNPJ	16.628.281/0003-23
Endereço Sede Administrativa	Rua Paraíba, 1.122 - Andares 9º, 19º e 23º - Funcionários Belo Horizonte/MG CEP 30.130-141
Endereço Mina do Germano	Rodovia MG-129 s/n, Zona Rural - Mariana/MG CEP 35.420-970
Representante legal	Rodrigo Alvarenga Vilela
Formação	Engenheiro Metalurgista
CREA	27157-D BA
Cargo	Diretor Presidente
Telefone	(31) 3269-8808 / (31) 3269-8787
E-mail	rodrigo.vilela@samarco.com

15.3.3.6 Identificação do Responsável Técnico pela Barragem, com Formação Profissional, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido, Endereço do Correio Eletrônico, e Telefone para Contato (Item 1.1 – Subitem VI do TR da FEAM)

A identificação do responsável técnico pela Barragem Eixo 1, sua formação, cargo, responsabilidades, nº de registro em conselho de classe e endereço do correio eletrônico são apresentados na tabela 78.

Tabela 78: Responsável Técnico – Barragem Eixo 1

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE BARRAGEM DO EMPREENDEDOR	
Nome	Ernesto Tadeu Bossi
Formação	Engenheiro Civil
Cargo	Gerente Geral de Geotecnia
Responsabilidades	Gerente geral responsável pelas operações/estruturas geotécnicas do Complexo do Germano
CREA	87931/D MG
RNP	1400165911
Telefone	(31) 3269-8683
E-mail	ernesto.bossi@samarco.com

Obs.: A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com a atribuição do responsável técnico da Barragem Eixo 1 consta na pasta “Anexo I – ARTs_Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

15.3.3.7 Identificação da Equipe Técnica Responsável pelos Projetos de Descaracterização (Nome Completo, Formação Acadêmica, Áreas sob Sua Responsabilidade no Estudo, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido). A Anotação de Responsabilidade Técnica Deverá Ser Apresentada no Anexo I (Item 1.1 – Subitem VII do TR da FEAM)

A identificação da equipe técnica, com nome completo, formação, áreas sob sua responsabilidade no estudo e nº do registro em conselho de classe é apresentada a seguir nas tabelas 79 (Projetista) e 80 (Samarco).

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 79: Equipe Técnica dos Projetistas Responsável Pelos Projetos de Descaracterização da Barragem Eixo 1

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO - PROJETISTA BVP	
Razão social	BVP Engenharia e Projetos Ltda.
CNPJ	04.723.774/0001-00
Endereço	Rua Tomé de Souza 616 – Savassi Belo Horizonte/MG - CEP 30.140-131
Registro CREA (Empresa)	38070-MG
Responsável Técnico - Projeto	Paulo Roberto Costa Cella
Formação	Mestrado - EESC-USP Mestre em Engenharia - Área de Concentração: Geotecnia. Doutorado - E. Politécnica - USP: Doutor em Engenharia - Área de Concentração: Engenharia Mineral.
Responsabilidade no projeto	(1) Pareceres geológico-geotécnicos utilizados para as análises de estabilidade. Estruturas do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e Eixo 1. (2) Consultoria Geotécnica Barragem do Germano
CREA (Profissional)	06.0.0600697382 – RNP 2613925922
ART Cava e Barragem Germano	(1) 14201900000005153888 (2) MG20242931282

Obs.: As Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos de descaracterização da Barragem Eixo 1 constam na pasta “Anexo I – ARTs_Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

Tabela 80: Equipe Técnica da Samarco Responsável Pelo Acompanhamento dos Projetos de Descaracterização da Barragem Eixo 1

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO - SAMARCO	
Nome	Alexandre Ângelo do Carmo Luiz da Silva
Formação	Engenheiro Ambiental e Mestre em recursos hídricos
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos hidrológicos e hidráulicos.
CREA	MG0000174587/D – RNP 1412886864
Nome	Anelisa Vasconcelos
Formação	Engenheira Civil e Mestre em geotecnia
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos geotécnicos.
CREA	MG0000091141/D – RNP 1400665574
Nome	José Bernardo Vasconcelos Rodrigues Oliveira
Formação	Engenheiro Civil e Mestre em geotecnia
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos geotécnicos.
CREA	MG0000065519/D
Nome	Lucas Samuel Santos Brasil
Formação	Engenheiro Civil e Mestre em recursos hídricos
Participação	Acompanhamento e Consultoria em estudos e projetos hidrológicos e hidráulicos.
CREA	MG0000 85104/D

15.3.3.8 Identificação da Equipe Técnica Responsável pela Execução e/ou Acompanhamento da Obra de Descaracterização (Nome Completo, Formação Acadêmica, Áreas sob Sua Responsabilidade no Estudo, Nº do Registro em Conselho de Classe Válido). A Anotação de Responsabilidade Técnica Deverá Ser Apresentada no Anexo I (Item 1.1 – Subitem VIII do TR da FEAM)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



A identificação da equipe técnica, com nome completo, formação, áreas sob sua responsabilidade no estudo e nº do registro em conselho de classe é apresentada nas tabelas 81 (Samarco), 82 e 83 (Contratadas).

Tabela 81: Responsável Técnico (Samarco) Pelas Obras de Descaracterização da Barragem Eixo 1

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO GERAL PELA EXECUÇÃO - SAMARCO	
Razão social	Samarco Mineração S/A, em Recuperação Judicial
Responsável Técnico - Obra	Eduardo Moreira Rodrigues
Formação	Engenheiro Civil
Cargo	Gerente Geral de Projetos e Retomada (GGPR)
Responsabilidade na Obra	(1) Principal – Exec. de obra / serviços / mineração / pilha de estéril. (2) Complementar – Aditivo de prazo.
CREA	MG04.0.0000072262/D – RNP 1408981297
ART	(7) 14202000000006351149 (8) MG20232390149

Tabela 82: Responsáveis Técnicos (Contratadas) Pelas Obras de Descaracterização da Barragem Eixo 1

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DESCARACTERIZAÇÃO – 1ª FASE (EIXO 1) CONTRATO 4500180873	
Razão social	Salum Construções Ltda.
CNPJ	19.739.564/0006-83
Endereço	Av. Nossa Senhora do Carmo, 673 - Apt. 02 - Vila do Carmo Mariana/MG CEP 35.420-000
Registro CREA (Empresa)	0000043431MG
Responsável Técnico - Obra	Marcus Vinicius Salum
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) 3º TAC – Alteração de prazo-valor das obras do Eixo 1.
CREA	MG0000023135/D – RNP 1404522719
ART	(1) 14202000000006096496
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DESCARACTERIZAÇÃO – 2ª FASE - PREENCHIMENTO EIXO 1 ETAPA 1 - CONTRATO 4300000106	
Razão social	Consórcio MRF
CNPJ	32.909.546/0001-56
Endereço	Rua Nossa Senhora de Lourdes, 262 - SI 01 - Olhos D'Água Belo Horizonte/MG CEP 30.390-530
Registro CREA (Empresa)	49483MG e 81683NAC
Responsável Técnico - Obra	Antônio Carlos Pereira Vieira Júnior
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1. (2) 6º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1. (3) 7º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1. (4) 8º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1.
CREA	0400000087976 – RNP 1400173396
ART	(1) 14202000000006246690, (2) MG20221358028, (3) MG20231818982 e (4) MG20231844108
Responsável Técnico - Concreto	Luiza Borges Dias
Formação	Engenheira Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Materiais de construção civil – dosagem e mistura de concreto para as obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1.
CREA	MG0000217823/D – RNP 1416548645
ART	(1) MG20210811683

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Responsável Técnico - Obra	Marcus Veloso da Silveira Cassini
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1. (2) 6º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1. (3) 7º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1. (4) 7º TAC – Exec. das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1.
CREA	0400000080345 – RNP 1403250111
ART	(1) 1420200000006246637, (2) MG20221357994, (3) MG20231818845 e (4) MG20231844030
Responsável Técnico - Obra	Renã Alcântara Lara
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal - Execução das obras civis do reforço do barramento principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1. (2) Gerenciamento de aspecto ambiental para a implantação da central móvel de concreto de canteiro.
CREA	0400000072142/D – RNP 1403884650
ART	(1) 1420200000006241956 (Principal) e (2) MG20210373739
Responsável Técnico - Obra	William Perdigão Frade
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de estruturas de concreto armado, abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem, obras hidráulicas, diques barragem de terra-enrocamento e canais das obras civis do reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, canal de drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1. (2) TAC - Obras de descaracterização da Barragem do Germano 2ª fase, berma de reforço da barragem principal, preenchimento do eixo 1, extravasor do eixo 1, canal drenagem principal e <i>regrade</i> etapa 1.
CREA	MG0000064857/D – RNP 1409140350
ART	(1) MG20210813361 e (2) MG20231843558
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DESCARACTERIZAÇÃO – 2ª FASE - PREENCIMENTO EIXO 1 ETAPA 1 - CONTRATO 4300000106 (CONCRETO)	
Razão social	Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S/A (Vinculada ao contrato do Consórcio MRF)
CNPJ	02.229.411/0022-03
Endereço	Avenida Percio Perfeito s/n - Quadra 2, Lote 01 a 03 - Distrito Industrial Araguari/MG CEP 38.446-394
Registro CREA (Empresa)	1988MG
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DESCARACTERIZAÇÃO – 2ª FASE - PREENCIMENTO EIXO 1 ETAPA 2 - CONTRATO 4300000595	
Razão social	Consórcio MRF
CNPJ	32.909.546/0001-56
Endereço	Rua Nossa Senhora de Lourdes, 262 - SI 01 - Olhos D'Água Belo Horizonte/MG CEP 30.390-530
Registro CREA (Empresa)	49483MG e 81683NAC
Responsável Técnico - Obra	Anderson Henrique Andrade Rigobello
Formação	Engenheiro de Produção
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de produção (atividades da área de engenharia de produção) gestão da produção para a Descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e Preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000284672/D – RNP 1419976990
ART	(1) MG 20221116308
Responsável Técnico - Obra	Antônio Carlos Pereira Vieira Júnior
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000087976/D – RNP 1400173396
ART	(1) MG 20221105288

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Responsável Técnico - Obra	Leonardo Guimarães Mendes
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de geotecnia e geologia (obras de terra: terraplenagem, compactação, escavação, aterro) e obras de construção civil (materiais para construção civil: aplicação de concreto) para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000058753/D – RNP 1403078645
ART	(1) MG 20221079330
Responsável Técnico - Obra	Marcus Veloso da Silveira Cassini
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) (2) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000080345/D – RNP 1403250111
ART	(1) MG 20221105295 (2) MG20253638617
Responsável Técnico - Obra	Matheus Mata Machado Ferreira de Siqueira
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000195065/D – RNP 1414611790
ART	(1) MG 20221136218
Responsável Técnico - Obra	William Perdigão Frade
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Principal - Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	MG0000006485/D – RNP 1409140350
ART	(1) MG 20221097378
Responsável Técnico - Obra	Diego Fernandes Pontes
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	DF0000014988D/MG – RNP 0704727889
ART	(1) MG20253638523
Responsável Técnico - Obra	Henrique César Rodrigues de Alvarenga
Formação	Engenheiro Civil
Responsabilidade na Obra	(1) Execução de obras de estrutura de concreto armado; obras de geotecnia e geologia (obras de terra: abertura de valas, aterro, compactação, corte, escavação, limpeza de terreno, reaterro, remoção de solo, terraplenagem); obras hidráulicas e recursos hídricos (canais, barragens/diques de enrocamento); sistema de drenagem para obras civis: canal, canaleta, dreno para a descaracterização do Dique Sela Tulipa, do Dique Selinha e preenchimento do Eixo 1 Etapa 2.
CREA	0400000066648MG – RNP 1403171033
ART	(1) MG20253638592
Responsável Técnico - Obra	Lucas Sobrinho Lauro
Formação	Engenheiro de Segurança do Trabalho
Responsabilidade na Obra	(1) Gestão de Segurança do Trabalho para as obras de descaracterização
CREA	MG0000142675D MG – RNP 1409973107
ART	(1) MG20253618999

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tabela 83 : Responsável Técnico pela Revegetação nas Áreas da Barragem Eixo 1

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA / RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REVEGETAÇÃO	
CONTRATO 4300000880	
Razão social	JM Reflorestamentos e Serviços Ltda.
CNPJ	08.011.784/0001-65
Endereço	Rua Joaquim Pacífico, 120 – Centro Santa Barbara/MG CEP 35.960-000
Registro CREA (Empresa)	19252-MG
Responsável Técnico - Obra	César Simões Soares
Formação	Engenheiro Florestal
Responsabilidade na Obra	(1) Gestão ambiental para a revegetação de Sela Tulipa.
CREA	MG0000108032/D – RNP 1406493775
ART	(1) MG20243540839

Obs.: As Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de todos os responsáveis técnicos envolvidos na execução dos projetos de descaracterização da Barragem Eixo 1 constam na pasta “Anexo I – ARTs _Operações_Projetos_Obras” do presente relatório.

15.3.4 Projeto de Descaracterização – Barragem Eixo 1

15.3.4.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao item 1.2, subitens I ao IV do Termo de Referência da FEAM.

15.3.4.2 Descrever Sucintamente a Concepção do Projeto Adotada para Descaracterização da Barragem (Item 1.2 – Subitem I do TR)

Os projetos de descaracterização da Barragem Eixo 1, que integra os projetos de descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha, foram desenvolvidos pela projetista BVP em atendimento à Lei Estadual nº 23.291, publicada em fevereiro de 2019, visando à estabilidade geotécnica da estrutura e à adoção de medidas para reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais e subterrâneas para o Vale do Fundão, no longo prazo.

Considerando a estabilidade geotécnica de longo prazo, os projetos de descaracterização da Barragem Eixo 1 preveem o preenchimento do Vale do Fundão a montante do Eixo 1. A referida barragem foi projetada como estrutura de partida para a descaracterização dos diques Sela Tulipa e Selinha. Como referência, o volume das obras da Barragem Eixo 1 e do preenchimento do Vale do Fundão a montante da referida estrutura é de 3.043.792 m³.

Em relação à passagem de cheias, também visando ao longo prazo, o projeto de descaracterização prevê a implantação de sistema de canais de drenagem profunda e caimentos na superfície final do Vale do Fundão, com a função de conduzir os fluxos captados no próprio vale e na bacia de contribuição situada a montante desta região, reduzindo o processo de infiltração para o interior dos depósitos e eliminando a formação de lago permanente.

Também considera a implantação de um novo canal de drenagem definitivo na região da obreira esquerda da Barragem Eixo 1, para permitir a transição de função do Eixo 1 de barragem para pilha.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- 15.3.4.3 Informar Todas as Alterações de Projetos Ocorridas no Período de Avaliação do Relatório de Acompanhamento, com Respectivas Justificativas (Item 1.2 – Subitem II do TR)

As informações referentes às alterações de projetos ocorridas no período de avaliação são apresentadas no Capítulo 4, Item 4.3 do presente relatório.

- 15.3.4.4 Caso as Obras de Descaracterização Ainda Não Tenham Sido Iniciadas, Informar as Ações e Obras Preparatórias Realizadas no Período, Tais Como: Realização de Estudos, Aquisição de Equipamentos, Construção de Estruturas de Contenção a Jusante, por Exemplo (Item 1.2 – Subitem III)

- *O cronograma atualizado de projeto e início efetivo da descaracterização deverá ser apresentado (Item 1.2 – Subitem III).*

Este item não se aplica (N/A) ao Projeto de Descaracterização da Barragem Eixo 1, uma vez que as obras estão finalizadas.

- 15.3.4.5 Descrever e Informar os Riscos Geológicos Geotécnicos Associados, Especificamente, a Implantação do Projeto de Descaracterização (Item 1.2 – Subitem IV)

As informações referentes aos riscos geológicos e geotécnicos associados, especificamente, à implantação do Projeto de Descaracterização, são apresentadas no Capítulo 4, Item 4.5 do presente relatório.

15.3.5 Obras de Descaracterização – Barragem Eixo 1

15.3.5.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao item 1.3, subitens I ao XIV do Termo de Referência da FEAM.

- 15.3.5.2 Memorial Descritivo das Obras de Descaracterização da Barragem, Contendo os Seguintes Dados e Informações e Representações Gráficas em Escala Adequada (Item 1.3 – Subitem I do TR)

- 15.3.5.2.1 Memorial Descritivo e Desenhos das Estruturas Implantadas, Removidas ou Modificadas, ou Informações Equivalentes, Bem Como Dispositivos de Proteção Ambiental (Item 1.3 – Subitem I-a do TR)

Este item apresenta o descritivo das obras de descaracterização realizadas na Barragem Eixo 1, com foco nas estruturas implantadas, incluído evidências do estágio atual da construção e dos dispositivos de proteção ambiental.

Memorial Descritivo – Eixo 1

O Programa de Descaracterização do Germano previu a implantação da estrutura do barramento, o preenchimento do Vale do Fundão a montante do Eixo 1 e o sistema de drenagem superficial associado. Estas obras podem ser identificadas na figura 237.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Figura 237: Identificação das Obras do Programa Descaracterização (Barragem Eixo 1)



No setor da Barragem Eixo 1, as obras de preenchimento a montante do Eixo 1 (entre as elevações 830,0m e 833,0m), de implantação dos ramais secundários, da conexão e da proteção do colchão drenante, de drenagem superficial e dos canais das ombreiras esquerda/direita encontram-se concluídas.

A figura 238 destaca a região a montante do Eixo 1, com canais de drenagem superficial que coletam contribuições de drenagens naturais na margem esquerda do vale. Foi necessário implantar “sumps” para contenção de sedimentos no trecho inicial desses canais, mitigando o arraste de partículas sólidas para áreas a jusante. O Vale do Fundão, a montante do Eixo 1, foi preenchido e não apresenta acúmulo de água (não há reservatório).

Figura 238: Canais de Drenagem No Vale do Fundão (Porção do Eixo 1) Concluídos



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

15.3.5.3 Memorial Descritivo e Layout das Soluções Geotécnicas Empregadas Durante as Obras, Incluindo a Necessidade de Esgotamento da Água Acumulada no Interior da Barragem e, caso haja, da Infraestrutura de Apoio das Frentes de Obras (Item 1.3 – Subitem I-b do TR)


As soluções geotécnicas empregadas nas obras do Programa Descaracterização do Germano também se aplicam à Barragem Eixo 1.

Essencialmente, a descaracterização do Eixo 1 consiste de elevação do barramento até 825,0m (com implantação do envelopamento do Eixo 1), de forma a permitir a transição de função do Eixo 1 de barragem para pilha; reconformação da superfície final (*regrade*) do vale situado a montante da estrutura, através da implantação de superfícies inclinadas, com caimentos direcionados a canais de drenagem especialmente dimensionados para evitar acúmulo permanente de água no reservatório; e, finalmente, implantação dos respectivos canais de drenagem, incluindo o canal da ombreira esquerda, dimensionados para verter as cheias decorrentes da Precipitação Máxima Provável (PMP).

No Vale do Fundão, o manejo das águas é feito pelo sistema de drenagem superficial que vem sendo implantado desde 2018 para conduzir o fluxo aos canais de drenagem sobre o aterro compactado implantado, e até os canais periféricos do Eixo 1.

A figura 239 ilustra o *layout* do arranjo. As setas azuis representam o fluxo das águas através de canais superficiais e as setas amarelas representam os canais de drenagem principais implantados.

Figura 239: Layout do Manejo das Águas – Vale do Fundão (Porção no Eixo 1)



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Tendo em vista o longo prazo demandado para a implantação das obras de descaracterização da Barragem Eixo 1, e também a necessidade de adoção de ações efetivas que garantiram a segurança da estrutura frente às temporadas chuvosas nos vários anos de obras, a Samarco concebeu um plano de chuvas para aplicação nos períodos chuvosos. A última versão do plano atualizado para o período entre outubro de 2024 e março de 2025 considera o sistema de drenagem superficial da Barragem Eixo 1 finalizado e operável. O memorial descritivo é apresentado no Capítulo 5, subitem 5.2.1.3 do presente relatório e o referido plano é apresentado no Anexo 7.1 — Sistema de Drenagem _ Plano de Chuvas 24_25_AECOM na pasta “Anexo VII — Meio Ambiente”.

Figura 240: Anexo 7.1 - Plano de Chuvas 2024-2025



As obras de descaracterização da Barragem Eixo 1 encontram-se finalizadas. Os preenchimentos a montante do Eixo 1 / Barreira 4 (porção Vale do Fundão da Barragem Eixo 1) foram finalizadas em 10/10/24 (ver atividade 5442A9240). O ramal de drenagem subsuperficial principal foi concluído em 20/10/24 (ver atividade 5442A9510) e os ramais de drenagem subsuperficial secundários, bem como os canais das obreiras esquerda / direita, foram encerrados em 26/11/24 (ver atividades 5442A8990 e 5442A6310). O Eixo 1 foi concluído em 30/12/24 (ver atividade 5442A6260) e os canais de drenagem superficial em pedra argamassada foram finalizados em 31/12/24 (ver atividade 5442A6290). A *Punch List* da drenagem superficial e serviços de proteção vegetal finalizada em 15/02/25.

15.3.5.4 Descrição das Estruturas e Layout dos Sistemas de Controle Ambiental dos Efluentes Líquidos, Emissões Atmosféricas e Resíduos Sólidos Gerados no Canteiro de Obras e Infraestrutura de Apoio das Frentes de Obras (Item 1.3 – Subitem I-c do TR)

A descrição das estruturas e *layout* dos sistemas de controle ambiental dos efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos gerados no canteiro de obras e infraestrutura de apoio das frentes de obras são apresentados no Capítulo 5, subitem 5.2.3 do presente relatório.

15.3.5.5 Descrição das Ações de Movimentação de Terra, Incluindo Localização e Caracterização das Áreas de Empréstimo e Bota-Fora Utilizadas (Item 1.3 – Subitem I-d do TR)

A descrição das ações de movimentação de terra, incluindo localização e caracterização das áreas de empréstimo e bota-fora utilizadas, são apresentadas no Capítulo 5, subitem 5.2.4 do presente relatório.

15.3.5.6 Apresentar Levantamentos Topográficos e Batimétricos, Quando Couber, da Barragem no Estado Atual das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem II do TR)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Levantamentos Topográficos

Os levantamentos do estado atual do empreendimento estão contemplados no Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico Obras Descaracterização Germano na pasta “Anexo IV – Execução” do presente relatório.

Figura 241: Anexo 4.1 – Levantamento Topográfico

Anexo 4.1-Levant. Topografico Obras Descaract. Germano_Jun_25

Levantamentos Batimétricos

Este item não se aplica, pois no Complexo do Germano o curso d'água é superficial (não há reservatórios); assim sendo, não é possível realizar levantamentos batimétricos na Barragem Eixo 1.

15.3.5.7 No Caso de Remoção do Maciço e do Reservatório, Apresentar as Medidas Adotadas Para a Execução Deste Procedimento e Um Quantitativo dos Materiais Retirados (Item 1.3 – Subitem III do TR)

Este item não se aplica, pois o Projeto de Descaracterização não prevê remoção dos maciços das estruturas, nem dos seus respectivos reservatórios.

15.3.5.8 Apresentar as Medidas Adotadas Para a Redução do Nível do Lençol Freático no Reservatório, Quando Couber, Bem Como Informar o Seu Nível no Estágio Atual das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem IV do TR)

As referidas medidas são apresentadas no Capítulo 5, subitem 5.2.7 do presente relatório.

15.3.5.9 Apresentar Análises de Estabilidade nas Condições Drenada e Não-Drenada, e Levando em Consideração as Solicitações Sísmicas Que Possam Atuar Sobre a Estrutura, Avaliando as Resistências de Pico e Residual Para a Geometria da Barragem na Atual Etapa da Obra (Item 1.3 – Subitem V do TR)

Nota: Os Fatores de Segurança mínimos a serem atendidos são de 1,5 para rupturas drenadas; 1,5 para rupturas não-drenadas na situação de pico, e 1,1 na situação residual. Ressalta-se que estes valores poderão ser revisados conforme as diretrizes técnicas emanadas de órgãos regulamentadores competentes.

As análises de estabilidade no período estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G103600-O-2RT073_R00_Abr_25;
- ✓ G103600-O-2RT074_R00_Mai_25;
- ✓ G103600-O-2RT075_R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 4 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Figura 242: Recomendação 4 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

04	Apresentar os relatórios contemplando os estudos de análises de estabilidade relativos à Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), à Barragem do Eixo 1, e à Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios contemplando os estudos de análises de estabilidade referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

- ✓ G103600-O-2RT064_R00_Out_24;
- ✓ G103600-O-2RT065_R00_Nov_24;
- ✓ G103600-O-2RT066_R00_Dez_24;
- ✓ G103600-O-2RT070_R00_Jan_25;
- ✓ G103600-O-2RT071_R00_Fev_25;
- ✓ G103600-O-2RT072_R00_Mar_25.

15.3.5.10 Apresentar o Andamento das Medidas de Estabilização e/ou Reforço Para Atingir no Mínimo os Fatores de Segurança Estabelecidos no item V, Bem Como das Medidas de Contingências Adotadas Caso a Estabilidade da Estrutura Durante as Obras Não Possa Ser Garantida (Item 1.3 – Subitem VI do TR)

Para as medidas de estabilização ou reforço visando a atingir 1,5 para condição drenada; 1,5 para condição não-drenada de pico, e 1,1 para a condição residual, informa-se:

- Todas as estruturas que integram o Programa Descaracterização do Germano possuem declaração de estabilidade. A declaração para a Barragem Eixo 1 é apresentada na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório.
- As obras de descaracterização da Barragem Eixo 1 foram iniciadas em agosto de 2020 com o preenchimento do fundo do vale imediatamente a montante do Eixo 1.
- Atualmente, o escopo descaracterização da Barragem Eixo 1 encontra-se concluído. Os preenchimentos a montante do Eixo 1 / Barreira 4 (porção Vale do Fundão da Barragem Eixo 1) foram finalizadas em 10/10/24 (ver atividade 5442A9240). O ramal de drenagem subsuperficial principal foi concluído em 20/10/24 (ver atividade 5442A9510) e os ramais de drenagem subsuperficial secundários, bem como os canais das obreiras esquerda / direita, foram encerrados em 26/11/24 (ver atividades 5442A8990 e 5442A6310). O Eixo 1 foi concluído em 30/12/24 (ver atividade 5442A6260) e os canais de drenagem superficial em pedra argamassada foram finalizados em 31/12/24 (ver atividade 5442A6290). A *Punch List* da drenagem superficial e serviços de proteção vegetal finalizada em 15/02/25.

15.3.5.11 Apresentar o Andamento das Obras Para (Item 1.3 – Subitem VII):

a) *Remoção das infraestruturas associadas à Barragem, exceto aquelas destinadas à garantia da segurança da estrutura (Item 1.3 – Subitem VII-a)*

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Apresentado no Capítulo 5, subitem 5.2.10 do presente relatório.


b) Reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais e subterrâneas para o reservatório (Item 1.3 – Subitem VII-b)

Apresentado no Capítulo 5, subitens 5.2.7 e 5.2.10 do presente relatório.

Plano de chuvas e dispositivos provisórios

A Samarco utiliza sistemas de drenagem definitivo e/ou provisório para manejo das águas superficiais. O manejo é apresentado nos Anexos 4.2 (Manejo das Águas de acordo com o Plano de Chuvas 2024-2025) e 4.3 (Status de Implantação do Plano de Chuvas 2024-2025 - Final) na pasta “Anexo IV – Execução” do presente relatório. Importante ressaltar que as obras de drenagem definitiva da Barragem Eixo 1 foram concluídas, atendendo às ações previstas para o plano de chuvas.

Figura 243: Anexos 4.2 (Manejo das Águas) e 4.3 (Plano de Ação da Execução do Plano de Chuvas 2024/2025)



c) Garantir a estabilidade física e química de longo prazo das estruturas que permanecerem no local (Item 1.3 – Subitem VII-c)

Situada na porção inferior do Vale do Fundão, imediatamente a jusante do dique Selinha, em região adjacente à do reservatório do Germano, a Barragem Eixo 1 foi implantada com o objetivo de conter os sedimentos remanescentes do rompimento ocorrido nesta área. O Eixo 1 é um barramento do tipo convencional, em terra e enrocamento, dotado de núcleo argiloso, transições e paramentos de montante e jusante em encoramento, compactados.

A região a montante da Barragem Eixo 1 foi tratada e ocupada de acordo com o sequenciamento construtivo previsto em projeto. Foram implantados aterros em rejeitos e estéreis compactados, o que resultou na completa eliminação do seu reservatório, não havendo mais acúmulo de água.

Canais de drenagem superficiais implantados sobre os rejeitos e estéreis compactados conduzem as vazões para o novo canal de drenagem da ombreira direita, e também para o canal de drenagem da ombreira esquerda.

O preenchimento a montante do Eixo 1 com rejeitos arenosos e estéreis compactados totaliza aproximadamente 3.016.400,20m³. Este preenchimento foi fundamental para promover a implantação das bermas de descaracterização de Sela Tulipa (concluída) e Selinha (concluída), através do travamento de toda a superfície de jusante até a Barragem Eixo 1.

As figuras 237 (item 15.3.5.2.1) e 238 (item 15.3.5.3) apresentam o escopo do Eixo 1 concluído.

A Samarco desenvolveu o PRAD do Fundão, projeto que prevê a implantação de uma pilha de rejeitos e estéreis compactados que, ao longo do tempo, promoverá a ocupação de todo o vale até a Barragem Eixo 1.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




A implantação do PRAD do Fundão trará os seguintes benefícios:

- Confinamento dos taludes atualmente expostos na margem direita do talvegue natural adjacente ao canal de drenagem da descaracterização da Barragem do Germano (a jusante da margem direita do dique Selinha);
- Ocupação do talvegue com rejeitos e estéreis compactados, desde os diques Sela Tulipa e Selinha – em sua condição pós-descaracterização – até o Eixo 1, resultando na recuperação desta área ambientalmente impactada;
- Rejeito a ser disposto no PRAD oriundo da planta de filtragem da Samarco – Rejeitos Filtrados a Vácuo – evidenciando o domínio e a aplicação desta tecnologia empregada ao processo Samarco;
- O PRAD do Fundão se traduz em nova área para disposição de rejeitos filtrados em local impactado ambientalmente, evitando a potencial geração de novos impactos ambientais;
- Atualmente existem áreas além dos limites de propriedade da Samarco que contribuem com expressiva carga de sedimentos para o vale do Eixo 1 e, por conseguinte, para o reservatório da nova Barragem Santarém. O PRAD do Fundão atuará diretamente no controle efetivo dos sedimentos gerados nas áreas do seu entorno, garantindo a retenção desses materiais no corpo da própria pilha, através da utilização de dispositivos do tipo bacia de contenção implantados em pontos específicos, resultando na preservação da vida útil da nova Barragem Santarém.

Para melhor entendimento, a figura 244 apresenta o arranjo geral (ano 5), contemplando a Barragem Eixo 1, demais estruturas e os respectivos saldos de serviços remanescentes para conclusão das obras de descaracterização, identificados por região.

Figura 244: Ano 5 Arranjo Geral – Volumes (Estéril, Arenoso e Agregados) Finais por Região



PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Descaracterização da Barragem Eixo 1

O cronograma das obras, considerando a tendência de antecipação para o corrente ano, é apresentado na figura 245.

Figura 245: Cronograma das Obras de Descaracterização da Barragem Eixo 1 (Obras Concluídas)

Activity ID	Activity Name	Schedule % Complete	Performance % Complete	At Completion Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish	BL Project Start	BL Project Finish
5442_22_06_2025	Descaracterização Barragem Germano - 22-06-2025	100%	100%	1793.88d	13/02/2014	31/12/2024	13/02/2014	31/12/2024	13/02/2014	03/06/25
5442_22_06_2025.1	MARCOS DO PROJETO	0%	0%	1793.88d	13/02/2014	31/12/2024	13/02/2014	31/12/2024	13/02/2014	03/06/25
5442_22_06_2025.2	ENGENHARIA	100%	100%	619.10d	20/11/2014	19/05/2023	20/11/2014	19/05/2023	20/11/2014	22/02/23
5442_22_06_2025.2.1	G1024 - BARRAGEM DO GERMANO	100%	100%	619.10d	20/11/2014	19/05/2023	20/11/2014	19/05/2023	20/11/2014	22/02/23
5442_22_06_2025.2.1.1	G1024000 - DIQUES DE SELA - EIXO 1	100%	100%	619.10d	20/11/2014	19/05/2023	20/11/2014	19/05/2023	20/11/2014	22/02/23
5442_22_06_2025.2.1.1.1	PROJETO EXECUTIVO	100%	100%	619.10d	20/11/2014	19/05/2023	20/11/2014	19/05/2023	20/11/2014	22/02/23
5442_22_06_2025.2.1.1.1.1	G1024000-G-110658 DESCARACTERIZAÇÃO DIQUES SELA, TULIPA E SELINI	100%	100%	386.22d	20/11/2014	10/06/2022	20/11/2014	10/06/2022	20/11/2014	10/06/22
5442_22_06_2025.2.1.1.1.2	G1024000-G-110658Z DESCARACTERIZAÇÃO DIQUES SELA, TULIPA E SELINI	100%	100%	271.01d	10/04/2022	19/05/2023	10/04/2022	19/05/2023	10/04/2022	22/02/23
5442_22_06_2025.3	SUPRIMENTOS	100%	100%	548.88d	19/10/2014	20/04/2022	19/10/2014	20/04/2022	19/10/2014	20/04/22
5442_22_06_2025.3.2	MATERIAIS	100%	100%	548.88d	19/10/2014	20/04/2022	19/10/2014	20/04/2022	19/10/2014	20/04/22
5442_22_06_2025.3.2.1	INCOTE G-MO-82C - CONTRATAÇÃO DE AGREGADOS EIXO 1	100%	100%	548.88d	19/10/2014	20/04/2022	19/10/2014	20/04/2022	19/10/2014	20/04/22
5442_22_06_2025.4	CONSTRUÇÃO	100%	100%	1595.75d	19/08/2014	31/12/2024	19/08/2014	31/12/2024	19/08/2014	03/06/25
5442_22_06_2025.4.1	Descaracterização da Barragem do Germano (Reforço Barragem/Extrator)	100%	100%	705.00d	19/08/2014	25/07/2022	19/08/2014	25/07/2022	19/08/2014	19/08/22
5442_22_06_2025.4.1.1	GERAL (MARCOS E MANUTENÇÕES DAS ESTRUTURAS NO PERÍODO CHUVOSO) (SM)	0%	0%	0.00d	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	19/08/22	19/08/22
5442_22_06_2025.4.1.1.1	EXECUÇÃO DAS OBRAS - ANO 1 (2020)	100%	100%	189.88d	19/08/2014	24/02/2021	19/08/2014	24/02/2021	19/08/2014	24/02/21
5442_22_06_2025.4.1.1.1.1	FRENTE 1 - PREENCHIMENTO A MONTANTE E ENVELOPAMENTO DO DIQUE EIXO	100%	100%	189.88d	19/08/2014	24/02/2021	19/08/2014	24/02/2021	19/08/2014	24/02/21
5442_22_06_2025.4.1.1.1.1.1	ÁREA 1 - ENTRE DIQUE EIXO 1 E ENSECADERA PRINCIPAL (Slide 3 e 4)	100%	100%	189.88d	19/08/2014	24/02/2021	19/08/2014	24/02/2021	19/08/2014	24/02/21
5442_22_06_2025.4.1.1.1.1.2	ÁREA 2 - REGIÃO DA ENSECADERA DA VALE (B17-B18)	100%	100%	107.63d	15/09/2014	31/12/2020	15/09/2014	31/12/2020	15/09/2014	31/12/20
5442_22_06_2025.4.1.1.1.1.3	ÁREA 3 - A MONTANTE DA ENSECADERA PRINCIPAL (Ano 1 Etapa 2 Slide 8)	100%	100%	570.00d	01/01/2021	25/07/2022	01/01/2021	25/07/2022	01/01/2021	19/08/22
5442_22_06_2025.4.1.1.1.1.4	FRENTE 2 - PREENCHIMENTO A MONTANTE E ENVELOPAMENTO DO DIQUE EIXO	100%	100%	570.00d	01/01/2021	25/07/2022	01/01/2021	25/07/2022	01/01/2021	19/08/22
5442_22_06_2025.4.1.1.1.1.5	ÁREA 1 - ENTRE DIQUE EIXO 1 E ENSECADERA PRINCIPAL - ATÉ 825 M (CO)	100%	100%	236.66d	04/05/2021	24/01/2022	04/05/2021	24/01/2022	04/05/2021	24/01/22
5442_22_06_2025.4.1.1.1.1.6	ÁREA 2 - REGIÃO DA ENSECADERA DA VALE (B17-B18)	100%	100%	364.44d	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/21
5442_22_06_2025.4.1.1.1.1.7	ÁREA 3 - A MONTANTE DA ENSECADERA PRINCIPAL - ATÉ 823 M (Ano 1 E)	100%	100%	229.06d	10/05/2021	22/01/2022	10/05/2021	22/01/2022	10/05/2021	22/01/22
5442_22_06_2025.4.1.1.1.1.8	ÁREA 4 - A JUSANTE DO EIXO 01	100%	100%	237.63d	10/05/2021	02/02/2022	10/05/2021	02/02/2022	10/05/2021	02/02/22
5442_22_06_2025.4.1.1.1.1.9	PREPARAÇÃO PARA PERÍODO CHUVOSO (Ano 2 Plano de Chuvas Slide 9)	100%	100%	185.00d	27/12/2021	25/07/2022	27/12/2021	25/07/2022	27/12/2021	19/08/22
5442_22_06_2025.4.1.2	EXECUÇÃO DAS OBRAS - ANO 2 (2022)	100%	100%	33.00d	16/11/2021	08/01/2022	16/11/2021	08/01/2022	16/11/2021	08/01/22
5442_22_06_2025.4.1.2.1	FRENTE 1 - PREENCHIMENTO A MONTANTE E ENVELOPAMENTO DO DIQUE EIXO	100%	100%	33.00d	16/11/2021	08/01/2022	16/11/2021	08/01/2022	16/11/2021	08/01/22
5442_22_06_2025.4.1.2.1.1	ÁREA 4 - A JUSANTE DO EIXO 01	100%	100%	33.00d	16/11/2021	08/01/2022	16/11/2021	08/01/2022	16/11/2021	08/01/22
5442_22_06_2025.4.1.2.1.1.1	ESTRUTURA DE CONCRETO DO CANAL DA OBRERA ESQUERDA	100%	100%	33.00d	16/11/2021	08/01/2022	16/11/2021	08/01/2022	16/11/2021	08/01/22
5442_22_06_2025.4.1.2.1.1.1.1	CANAL TRAPEZOIDAL	100%	100%	7.56d	27/12/2021	08/01/2022	27/12/2021	08/01/2022	27/12/2021	08/01/22
5442_22_06_2025.4.1.2.1.1.1.2	EMBOSQUE (INCLUI TRANSIÇÃO)	100%	100%	7.19d	27/12/2021	08/01/2022	27/12/2021	08/01/2022	27/12/2021	08/01/22
5442_22_06_2025.4.1.2.1.1.1.3	BACIA DE DISSIPAÇÃO	100%	100%	32.63d	16/11/2021	08/01/2022	16/11/2021	08/01/2022	16/11/2021	08/01/22
5442_22_06_2025.4.1.2.1.1.1.4	MEDIDOR DE VAZÃO E NÍVEIS	100%	100%	7.19d	27/12/2021	08/01/2022	27/12/2021	08/01/2022	27/12/2021	08/01/22
5442_22_06_2025.4.5	Descaracterização do Dique de Selina, Sela/Tulipa e Preenchimento Eixo 1	100%	100%	1005.75d	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	03/06/25
5442_22_06_2025.4.5.1	GERAL	0%	0%	1005.75d	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	03/06/25
5442_22_06_2025.4.5.1.1	G106000 - MARCOS DO PROJETO	0%	0%	1005.75d	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	03/06/25
5442_22_06_2025.4.5.1.2	ÁREA 5442-36 - EIXO 1	100%	100%	1005.75d	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	03/06/25
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1	SUBÁREA 5442-36-01 - EIXO 1 E REGIÃO A MONTANTE	100%	100%	1005.75d	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	03/06/25
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.1	GERAL	100%	100%	750.38d	01/04/2022	20/04/2024	01/04/2022	20/04/2024	01/04/2022	20/05/25
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.1.1	MONTANTE DO COLCHÃO DRENANTE	100%	100%	360.75d	11/04/2022	26/11/2024	11/04/2022	26/11/2024	11/04/2022	07/02/25
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.1.2	EIXO 1 (DIQUE E REGIÃO DO COLCHÃO DRENANTE)	100%	100%	596.50d	01/08/2023	30/12/2024	01/08/2023	30/12/2024	01/08/2023	13/12/25
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.1.3	DRENAGEM	100%	100%	826.75d	27/09/2022	31/12/2024	27/09/2022	31/12/2024	04/04/2023	03/06/25
5442_22_06_2025.4.5.1.2.1.1.4	CANAL OMBREIRA DIREITA E ESQUERDA	100%	100%	383.78d	08/05/2023	26/11/2024	08/05/2023	26/11/2024	16/05/2023	10/10/25
5442_22_06_2025.4.5.2	DESCARACTERIZAÇÃO DO DIQUE DE SELINA, SELA/TULIPA E PREENCHIMENTO EIXO	0%	0%	0.00d	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	03/06/25	03/06/25

15.3.5.12 Apresentar a Análise dos Resultados das Inspeções Visuais Realizadas na Estrutura no Período Avaliado em Relação às Obras de Descaracterização, Informando a Periodicidade das Inspeções (Item 1.3 – Subitem VIII do TR)

Nota: Deverão ser apresentadas as medidas adotadas para corrigir as anomalias registradas durante as inspeções visuais, inclusive aquelas iniciadas em períodos anteriores ao do relatório apresentado, até sua efetiva conclusão.

As análises dos resultados das inspeções visuais realizadas no período estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G103600-O-2RT073-R00_Abr_25;
- ✓ G103600-O-2RT074-R00_Mai_25;
- ✓ G103600-O-2RT075-R00_Jun_25.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 5 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 246: Recomendação 5 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

05	Apresentar os relatórios de inspeção mensais relativos à Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), à Barragem do Eixo 1, e à Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	---	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios contemplando as inspeções visuais referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

- ✓ G103600-O-2RT064-R00_Out_24;
- ✓ G103600-O-2RT065-R00_Nov_24;
- ✓ G103600-O-2RT066-R00_Dez_24;
- ✓ G103600-O-2RT070-R00_Jan_25;
- ✓ G103600-O-2RT071-R00_Fev_25;
- ✓ G103600-O-2RT072-R00_Mar_25.

15.3.5.13 Apresentar as Leituras da Instrumentação Instalada na Barragem, Informando a Periodicidade Adotada Para as Leituras e a Relação dos Níveis Registrados Pelos Instrumentos Com os Níveis de Controle de Segurança Estabelecidos Para a Estrutura (Item 1.3 – Subitem IX do TR)

As leituras da instrumentação no período instaladas estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G103600-O-2RT073-R00_Abr_25;
- ✓ G103600-O-2RT074-R00_Mai_25;
- ✓ G103600-O-2RT075-R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 6 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 247: Recomendação 6 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

06	Apresentar os relatórios técnicos contendo as leituras da instrumentação instalada na Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), na Barragem do Eixo 1, e na Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios técnicos contemplando as leituras da instrumentação instalada, referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- ✓ G103600-O-2RT064-R00_Out_24;
- ✓ G103600-O-2RT065-R00_Nov_24;
- ✓ G103600-O-2RT066-R00_Dez_24;
- ✓ G103600-O-2RT070-R00_Jan_25;
- ✓ G103600-O-2RT071-R00_Fev_25;
- ✓ G103600-O-2RT072-R00_Mar_25.

15.3.5.14 Apresentar as Leituras e a Avaliação de Desempenho da Instrumentação Empregada Especificamente, Caso Houver, para o Período das Obras de Descaracterização (Item 1.3 – Subitem X)

As leituras e análises de desempenho da instrumentação empregada para o período das obras de descaracterização estão contempladas nos relatórios técnicos, disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente documento, conforme a seguir:

- ✓ G103600-O-2RT073-R00_Abr_25;
- ✓ G103600-O-2RT074-R00_Mai_25;
- ✓ G103600-O-2RT075-R00_Jun_25.

Os itens a seguir têm a finalidade de atender à Recomendação 7 da Nota Técnica da AECOM de 11/04/25.

Figura 248: Recomendação 7 – Nota Técnica da AECOM – 11/04/2025

07	Apresentar os relatórios técnicos contendo as leituras da instrumentação empregada especificamente para o período das obras de descaracterização na Barragem de Germano e suas estruturas associadas (diques Sela/Tulipa e Selinha), na Barragem do Eixo 1, e na Barragem da Cava de Germano, abrangendo o período entre outubro e dezembro de 2024.	2	1	1	4	X	Normal
----	--	---	---	---	---	---	--------

Os relatórios técnicos contemplando as leituras de instrumentação empregada especificamente para o período das obras de descaracterização referentes ao período de outubro a dezembro de 2024 (12º Relatório Trimestral), bem como ao período de janeiro a março de 2025 (13º Relatório Trimestral), estão disponibilizados na pasta “Anexo V – Geotecnia” do presente relatório, conforme a seguir:

- ✓ G103600-O-2RT064-R00_Out_24;
- ✓ G103600-O-2RT065-R00_Nov_24;
- ✓ G103600-O-2RT066-R00_Dez_24;
- ✓ G103600-O-2RT070-R00_Jan_25;
- ✓ G103600-O-2RT071-R00_Fev_25;
- ✓ G103600-O-2RT072-R00_Mar_25.

15.3.5.15 Informar os Períodos de Interrupção dos Trabalhos, Devidamente Justificados (Ex.: Período Chuvoso), se Pertinente (Item 1.3 – Subitem XI)

A quantidade de horas praticáveis para as atividades é apresentada no Capítulo 5, subitem 5.2.14 do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Barragem Eixo 1 – Etapa 2 (Histórico)

As obras foram suspensas nos períodos chuvosos 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, e retomadas nos períodos secos subsequentes (de abril a outubro), conforme previsto no planejamento.

O plano para o período chuvoso 2023-2024 foi implementado e teve o objetivo de manter o sistema de drenagem operacional e os recursos de terraplenagem mobilizados durante a temporada chuvosa. Nas ocorrências de chuvas que inviabilizaram a continuidade das obras da Barragem Eixo 1, os recursos foram direcionados às obras do *Regrade* (plano C da Barragem). Estas ações evitaram a desmobilização / remobilização dos recursos que estão escassos na região.

Atualmente, a implantação das obras previstas no escopo da Barragem Eixo 1 está finalizada. Desta forma, o novo plano de chuvas, concebido para o período chuvoso 2024–2025, considera o sistema de drenagem definitivo operável conforme previsto no projeto de implantação.

15.3.5.16 Apresentar os Protocolos Adotados Para Garantir a Segurança dos Trabalhadores Durante as Obras (Item 1.3 – Subitem XII do TR da FEAM)

Apresentados no Capítulo 11 – Saúde e Segurança do Trabalho do presente relatório. Os protocolos da documentação de referência constam na pasta “Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho” do presente relatório.

Figura 249: Anexo VI – Saúde e Segurança do Trabalho



15.3.5.17 Descrição e Registros Fotográficos de Cada Atividade já Concluída ou Em Andamento Para a Descaracterização da Barragem (Item 1.3 – Subitem XIII do TR da FEAM)

Apresentados no subitem 15.3.13 – Relatório Fotográfico do Andamento das Obras do Eixo 1 do presente apêndice.

15.3.5.18 Apresentar Cronograma Atualizado, Detalhando a Data de Início e Conclusão (ou Previsão) de Cada Atividade Realizada ou a Realizar Para a Descaracterização da Estrutura. Detalhar as Atividades Realizadas no Período, Percentual de Avanço da Descaracterização, Cumprimento das Ações Previstas na Respectiva Etapa do Cronograma (Item 1.3 – Subitem XIV do TR)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




Atendimento a Nota Técnica 17/01/23 – Item 4 Recomendações da AECOM

Figura 250: Item 4 – Recomendações da AECOM – 17/01/23

04	Incluir no relatório o cronograma no formato de diagrama de Gantt, com as atividades previstas no escopo, bem como a indicação do caminho crítico do Programa de Descaracterização em adição e/ou substituição ao cronograma esquemático apresentado no Item 4.3.	3	1	2	6	Alerta
----	---	---	---	---	---	--------

O cronograma detalhado das obras, contemplando todo o escopo necessário à completa execução da descaracterização da Barragem Eixo 1, é apresentado como anexo na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

Figura 251: Anexo 2 – Cronograma das Obras de Descaracterização do Eixo 1



Atividades Realizadas no Período

Não mais aplicável ao Eixo 1, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

Cumprimento das Ações Previstas na Respectiva Etapa do Cronograma

Não mais aplicável ao Eixo 1, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.3.6 Escopo das Obras de Descaracterização – Barragem Eixo 1

15.3.6.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente a Nota Técnica 17/01/23, Item 9 – Recomendações da AECOM.

15.3.6.2 Escopo do Projeto

O plano de execução da Barragem Eixo 1 foi dividido de acordo com as três etapas principais: Engenharia, Suprimentos e Construção.

Engenharia (status: 100% concluída):

- Estudos e Levantamento de Campo – **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Básico – **CONCLUÍDO ✓**;
- Projeto Executivo – **CONCLUÍDO ✓**.

Suprimentos (status: 100% concluída):

- Serviço: Obras Cíveis /Terraplenagem – **CONCLUÍDO ✓**;
- Materiais: Agregados – **CONCLUÍDO ✓**;
- Equipamentos: Instrumentos de Barragem – **CONCLUÍDO ✓**.

Construção (status: 100% concluída):

- Barragem Eixo 1 – Etapa 1 (status: 100% realizado):

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Entre o eixo 1 e ensecadeira principal – **CONCLUÍDO ✓**;
- Montante da ensecadeira principal – **CONCLUÍDO ✓**;
- Preenchimento entre o eixo 1 e ensecadeira principal – **CONCLUÍDO ✓**;
- Base do colchão drenagem – **CONCLUÍDO ✓**;
- Colchão drenante entre o eixo 1 e ensecadeira principal – **CONCLUÍDO ✓**;
- Proteção do colchão drenante – **CONCLUÍDO ✓**;
- Região da ensecadeira da Vale – **CONCLUÍDO ✓**;
- Prolongamento do dreno de fundo de Selinha – **CONCLUÍDO ✓**;
- Base do ramal provisório – **CONCLUÍDO ✓**;
- Dissipação do canal de Canvas – **CONCLUÍDO ✓**;
- Dispositivos de drenagem superficial – **CONCLUÍDO ✓**;
- Prolongamento da drenagem interna do dique 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Enrocamento em agregados a jusante do eixo 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canal ombreira esquerda – terraplenagem e enrocamento – **CONCLUÍDO ✓**;
- Obras do período chuvoso 2020/2021 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Obras do período chuvoso 2021/2022 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Instalação da instrumentação – **CONCLUÍDO ✓**.
- Preenchimento do Eixo 1 - Etapa 2 (status: 100% realizado):
 - Serviços preliminares, limpeza e acessos – etapa 2022 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Serviços preliminares, limpeza e acessos – etapa 2023 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instalação da instrumentação – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Instalação da instrumentação – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais até elevação 825m – etapa 1 (PDER A. Sul) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais até elevação 825m – etapa 2 (PDER A. Sul) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais até elevação 825m – etapa 3 (PDER A. Sul) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais até elevação 825m – etapa 1 (ilha) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais até elevação 825m – etapa 2 (ilha) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais até elevação 825m – etapa 3 (ilha) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais até elevação 825m – etapa 4 (ilha) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais até elevação 825m – etapa 5 (ilha) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Prolongamento do dreno DPIII – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Implantação dos ramais secundários – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Implantação dos ramais secundários – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Implantação dos ramais secundários – etapa 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Implantação dos ramais secundários – etapa 4 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Implantação dos ramais secundários – etapa 5 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Implantação do ramal principal – etapa 1 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Implantação do ramal principal – etapa 2 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais secundários – etapa 1 (pátio pilhas) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais secundários – etapa 2 (pátio pilhas) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais secundários – etapa 3 (pátio pilhas) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Proteção de ramais secundários – etapa 4 (pátio pilhas) – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento elevação 825 a 830m – etapa 1 a 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento elevação 825 a 830m – etapa 4 a 6 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento elevação 825 a 830m – etapa 7 a 9 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento elevação 825 a 830m – etapa 10 a 11 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento elevação 830 a 833m – etapa 1 a 3 – **CONCLUÍDO ✓**;
 - Preenchimento elevação 830 a 833m – etapa 4 a 6 – **CONCLUÍDO ✓**;

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



- Preenchimento elevação 830 a 833m – etapa 7 a 9 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Preenchimento elevação 830 a 833m – etapa 10 a 13 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Proteção prolongamento do colchão drenante região Vale – **CONCLUÍDO ✓**;
- Proteção prolongamento do colchão drenante região ferradura – **CONCLUÍDO ✓**;
- Prolongamento conexão do colchão drenante região ferradura – **CONCLUÍDO ✓**;
- Implantação conexão colchão drenante região Eixo 1 - EL 825m – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canais de drenagem em pedra argamassada - etapa 2022 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canais de drenagem em pedra argamassada - etapa 2023 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canais de drenagem em pedra argamassada - etapa 2024 – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canal da ombreira esquerda – **CONCLUÍDO ✓**;
- Canal da ombreira direita – **CONCLUÍDO ✓**.

15.3.7 Desempenho da Execução – Barragem Eixo 1


15.3.7.1 Objetivo do Capítulo

Atendimento ao item 1.3, subitem XIV do Termo de Referência da FEAM e às recomendações 3 e 4 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/2023.

15.3.7.2 Avanço Físico Acumulado da Barragem Eixo 1 – Previsto x Realizado

Apresentado na EAP na figura 252. A estrutura está dividida em Engenharia, Suprimentos e Construção.

Figura 252: EAP do Projeto de Descaracterização da Barragem Eixo 1

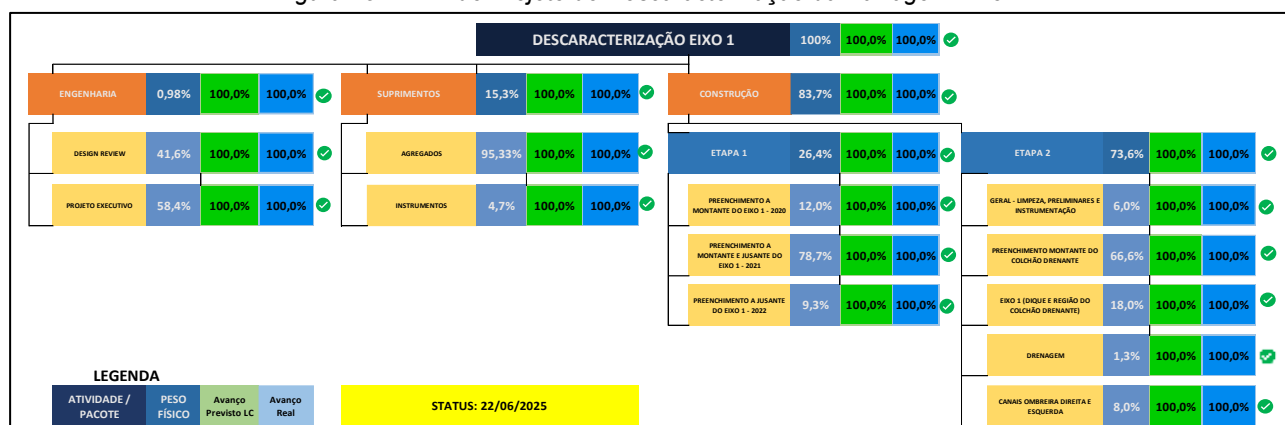

15.3.7.3 Tabela Resumo de Desempenho no Trimestre e Acumulado

Tabela 84: Avanços Previstos, Realizados e Acumulados No Período – Barragem Eixo 1

Programa Descaracterização	Etapa	Peso % (\$) IPR 2021	Peso % (\$) L. Corrente Até Ago/21	2º Trimestre 2025 %			Acumulado Geral %		
				Planejado Corrente	Real	Desvio Corrente	Planejado Corrente	Real	Desvio Corrente
Descaracterização da Barragem Eixo 1	Engenharia	0,99%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Suprimentos	14,72%	14,72%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Construção	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Total	19,26%	19,26%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Nota: Etapa de obras de descaracterização finalizada. Atualmente, a estrutura encontra-se na etapa de monitoramento ativo.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO


RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025




15.3.7.4 Desempenho do Projeto de Descaracterização – Barragem Eixo 1

Curva S Geral da Descaracterização – Barragem Eixo 1

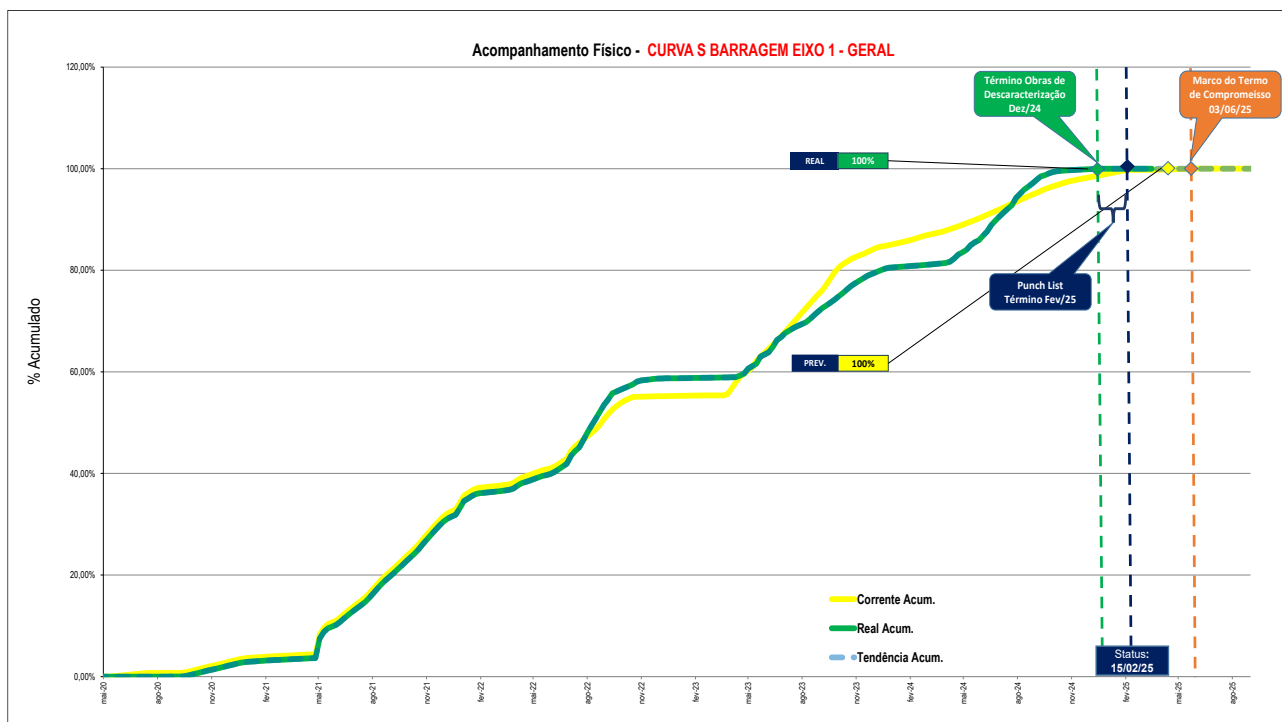

Curva S Geral da Construção – Barragem Eixo 1

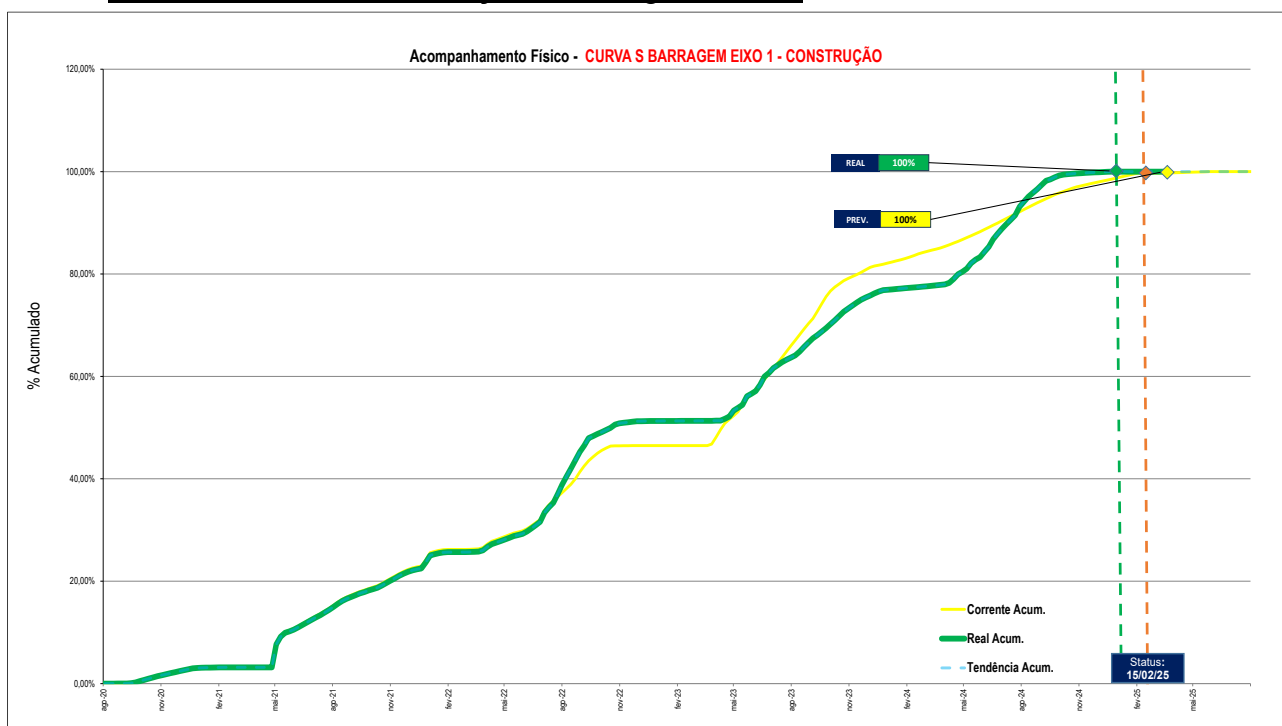


PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14


ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



Curva S Geral de Suprimentos – Barragem Eixo 1

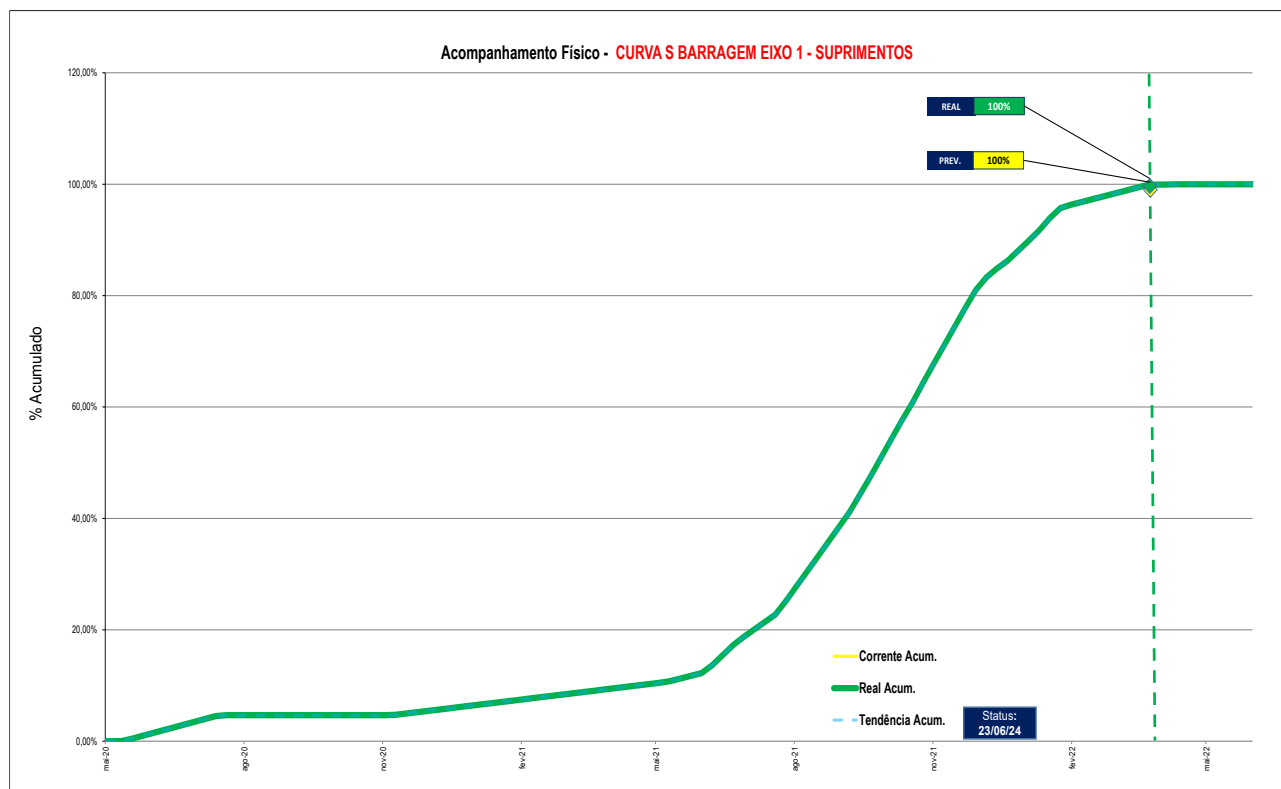

Curva S Geral da Engenharia – Barragem Eixo 1

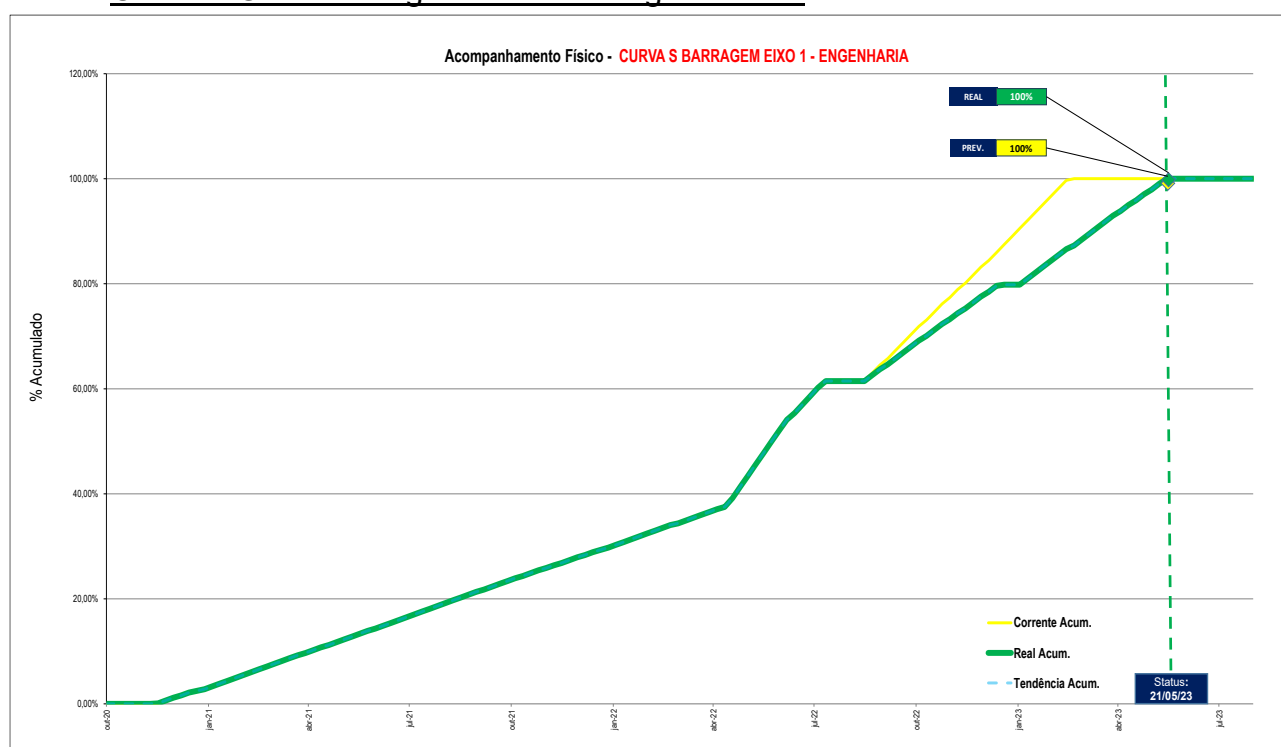

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº 14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.3.7.5 Cronograma Detalhado – Descaracterização da Barragem Eixo 1
Disponibilizado na pasta “Anexo II – Cronogramas” do presente relatório.

Figura 253: Cronogramas da Descaracterização da Barragem Eixo 1

Anexo 2.7-Cronog. Detalhado Barragem Eixo 1_Status_2025_06_22 (final)

15.3.7.6 Caminho Crítico

Não mais aplicável à Barragem Eixo 1, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.3.7.7 Análise do Caminho Crítico – Barragem Eixo 1

Não mais aplicável à Barragem Eixo 1, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.3.8 Desempenho da Construção – Barragem Eixo 1

15.3.8.1 Objetivo do Capítulo

Atender integralmente ao Item 1.3, subitem XIV do Termo de Referência da FEAM e às recomendações 2, 6 e 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23.

15.3.8.2 Análise dos Desvios / Ações dos Pacotes da Construção

Não mais aplicável à Barragem Eixo 1, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.3.8.3 Atividades Principais – Obras Executadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

Descaracterização da Barragem Eixo 1
• Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. • Monitoramento ativo da estrutura pós-obra.

15.3.8.4 Atividades Principais – Obras Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

Descaracterização da Barragem Eixo 1
• Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal. • Monitoramento ativo da estrutura pós-obra.

Nota: O monitoramento ativo entra em sua fase específica de confirmar as premissas de projeto e sazonalidade hidrogeotécnica, uma vez que todas as configurações de obras de descaracterização da Barragem Eixo 1 foram atingidas no ano de 2024.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.3.8.5 Atividades Principais – Obras Previstas para o 2º Trimestre de 2025 no Relatório Anterior x Realizadas

Tabela 85: Avaliação das Atividades da Barragem Eixo 1 Realizadas no Trimestre x Planejadas

ATIVIDADES PREVISTAS NO RT ANTERIOR	STATUS DA ATIVIDADE	COMENTÁRIOS
• Manutenção da drenagem superficial e proteção vegetal.	Rotina	Conforme planejamento.
• Monitoramento ativo da estrutura pós-obra.	Rotina	Conforme planejamento.

15.3.8.6 Quantidades dos Serviços em Andamento

Gráfico 50: Status dos Aterros a Montante do Eixo1 (Concluídos)



15.3.8.7 Histogramas das Obras (Histórico)

As forças de trabalho indireta e direta, bem como os equipamentos, estão inclusos nos histogramas do Contrato 4300000595 – Consórcio MRF, apresentado no Capítulo 8, subitem 8.7.9 do presente relatório.

15.3.9 Desempenho de Suprimentos – Barragem Eixo 1

Os suprimentos junto aos fornecedores do projeto foram concluídos em abril de 2022.

15.3.9.1 Atividades Principais de Suprimentos Executadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.3.9.2 Atividades Principais de Suprimentos Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

Não mais aplicável à Sela Tulipa, uma vez que as obras de descaracterização foram concluídas.

15.3.9.3 Principais Materiais – Fornecimento

Apresentados no Capítulo 9, Item 9.4 do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.3.10 Desempenho da Engenharia – Barragem Eixo 1

Além do atendimento ao Termo de Compromisso, este item também se destina a atender às Recomendações 2, 6, 7 e 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23.

Os itens relacionados à integração entre as engenharias, tramitação de documentação técnica e registros de adequações, são apresentados no Capítulo 10, Itens 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, respectivamente, do presente relatório.

As listas dos projetos revisados e aprovados, para atendimento à Recomendação 9 da Nota Técnica da AECOM de 17/01/23 constam na pasta “Anexo III – Engenharia” do presente relatório.

O desenvolvimento da engenharia do Projeto de Descaracterização da Barragem Eixo 1 foi concluído em maio de 2023.

15.3.10.1 Atividades Principais de Engenharia Realizadas no Trimestre (21/03/25 a 22/06/25)

Descaracterização da Barragem Eixo 1
Acompanhamento do monitoramento ativo da estrutura pós-obras de descaracterização.

15.3.10.2 Atividades Principais de Engenharia Previstas p/ o Próximo Trimestre (23/06/25 a 20/09/25)

Descaracterização da Barragem Eixo 1
Acompanhamento do monitoramento ativo da estrutura pós-obras de descaracterização.

15.3.11 Saúde e Segurança do Trabalho

Tem a finalidade de atender integralmente ao Item 1.3, subitem XII do Termo de Referência da FEAM.

Os assuntos relacionados a Saúde e Segurança do Trabalho são apresentados no Capítulo 11 do presente relatório.

15.3.12 Aspectos Ambientais das Obras de Descaracterização

Para atender integralmente ao Item 1.3, subitens I a V do Termo de Referência da FEAM.

Também serve para informar o andamento das obras do Projeto de Descaracterização da Barragem Eixo 1 no aspecto do controle ambiental, bem como apresentar as ações implementadas e os resultados obtidos na gestão ambiental no período.

Os aspectos ambientais das obras de descaracterização são apresentados no Capítulo 12 do presente relatório.

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.3.13 Relatório Fotográfico do Andamento das Obras – Barragem Eixo 1

15.3.13.1 Região do Colchão Drenante



Foto 19: Proteção da Conexão do Colchão Drenante e Canal da Ombreira Esquerda (Obras Concluídas)

15.3.13.2 Regiões a Jusante do Eixo 1



Foto 20: Região a Jusante do Eixo 1 – Canais de Drenagem OD/OE (Obras Concluídas)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



15.3.13.3 Região a Montante da Barreira 4



Foto 21: Região a Montante da Barreira 4 – Preenchimentos, Drenagens e Proteção Vegetal (Obras Concluídas)

15.3.13.4 Visão Geral da Barragem Eixo 1



Foto 22: Visão Geral da Barragem Eixo 1 (Obras Concluídas)

PROGRAMA DESCARACTERIZAÇÃO DE GERMANO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL Nº14
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025



16. ANEXOS

Anexo I – ARTs Operações Projetos Obras

Anexo II – Cronograma de Descaracterização da Cava e Barragem do Germano

Anexo III – Engenharia

Anexo IV – Execução

Anexo V – Geotecnia

Anexo VI – Meio Ambiente

Anexo VII – Saúde e Segurança do Trabalho
